

REGION DE GAO

Direction Régionale de l'Aménagement
et de l'Equipement Rural

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi



B.P 192 Tél/Fax : (223) 2 820 402 Gao — E.mail : prodeca@timbagga.com.ml

RAPPORT D'ACTIVITES ANNUEL 2003


(Version provisoire)

Décembre 2003

REGION DE GAO

Direction Régionale de l'Aménagement
et de l'Équipement Rural

République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

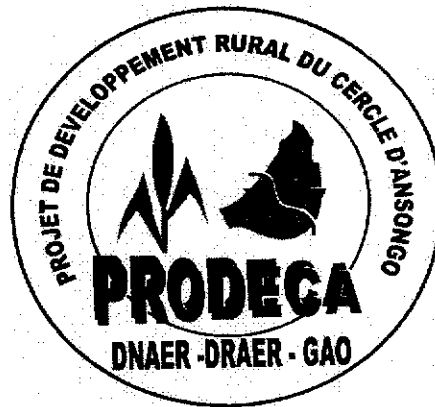

Projet de Développement Rural du Cercle d'Ansongo
PRODECA

B.P 192 Tél/Fax : (223) 2 820 402 Gao
E. mail : prodeca@timbagga.com.ml

RAPPORT D'ACTIVITES ANNUEL
2003

(Rapport provisoire)

Décembre 2003

PRESENTATION DU PRODECA

PAYS : MALI

TITRE DU PROJET : Projet de Développement Rural du Cercle d'Ansongo

PRODECA B.P : 192 Tél./Fax : (223) 2 820 402 GAO

Tél. : (223) 23 20 32 BAMAKO

E.mail : prodeca@timbagga.com.ml

AGENT D'EXECUTION : Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

B.P : 1382 Tél. : 22 38 58 BAMAKO

Données principales

* N° du prêt : F/MAL/ DEV-RUR/00/42

* Agence et Plan de financement

. FAD : 9,44 millions U.C (soit 7 827 232 700 FCFA)

. GRM : 1,35 million U.C (soit 1 122 267 300 FCFA)

OBJECTIFS DU PROJET

- contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire de la 7^{ème} région ;
- augmenter les productions agricoles et animales et les revenus des populations du cercle d'Ansongo.

COMPOSANTES DU PROJET

Financé par le FAD et le Gouvernement du Mali, le PRODECA comprend quatre composantes :

A : Aménagements hydro-agricoles

B : Appui au développement durable de l'économie rurale

C : Alphabétisation et formation

D : Gestion du projet

INTRODUCTION

L'année 2003 a été marquée par la tenue du 2^{ème} Comité de Pilotage le 21 mars 2003, qui a adopté le rapport annuel 2002, le rapport financier 2002, le PETF 2003 et le budget 2003.

Le Projet a vécu des moments difficiles de tensions de trésorerie dues à la délocalisation de la Banque Africaine de Développement (BAD) à Tunis entraînant du coup un retard dans la mise en oeuvre des activités programmées en 2003.

Au cours de l'année, après une suspension de trois mois due à la crue du fleuve, les travaux d'aménagement ont repris le 1^{er} Avril 2003 au niveau des 3 anciens sites (Ouatagouna Nord et Sud, Ankoum) et de 4 nouveaux sites (Karou Nord et Sud, Golingo et Sindi wara) sous le contrôle et la surveillance du Groupement de Bureaux de contrôle CIRA- Sarl/LOUIS BERGER sa.

La DRCN après la restitution des résultats des PCAE en ateliers local et régional, a élaboré le Plan Local d'Actions Environnementales du Cercle d'Ansongo.

Les résultats des études des 10 SAT confiées au Bureau d'études UNIGEO seront finalisés et validés en début d'année 2004, ce qui permettra la mise en œuvre de la composante B.

Le projet a enregistré les visites d'une mission de supervision de la BAD du 22 au 24 janvier 2003 à Gao et Ansongo ; du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sur les sites aménagés à Karou, Ouatagouna et Sindiwara et d'une équipe du Cabinet du MAEP,

Des missions de supervision ont été effectuées par la DNAER, la DNAMR, la Coordination Nationale de Suivi de la campagne agricole, la Coordination régionale de Suivi de la campagne agricole et de la CPS / DNAER et la DRAER de Gao.

Au cours de l'année, le projet en collaboration avec le Slacaer d'Ansongo a poursuivi les missions d'information - sensibilisation auprès des populations bénéficiaires en vue de prendre les dispositions pour la mise en valeur des plaines de submersion contrôlée de Ouatagouna Nord et Sud. Cependant la non signature du protocole d'accord avec la BNDA pour la gestion du crédit agricole n'a pas permis de financer la campagne agricole 2003-2004 (semences, engrais etc...).

Dans le cadre de son appui institutionnel aux services partenaires, le projet a appuyé la DRAER pour le suivi trimestriel régulier des activités du projet et le SLACAER d'Ansongo dans l'organisation de la campagne de vaccination 2003 contre la PPCB, contribuant ainsi à améliorer la couverture vaccinale du cheptel du cercle d'Ansongo.

L'état d'exécution des différentes activités a été relativement satisfaisant au cours de l'année 2003.

ETAT D'EXECUTION TECHNIQUE 2003

Composante A : Aménagements hydro agricoles

- □ Les travaux d'aménagement des plaines de submersion contrôlée et des périmètres irrigués suspendus pour 4 mois (décembre 2002 à mars 2003), ont repris le 1^{er} Avril 2003 sous la supervision du groupement de bureaux de contrôle et de surveillance CIRA-Sarl/LOUIS BERGER. Sa au niveau des sites suivants :

- Périmètres irrigués (2) : Ankoum 117 ha
 Golingo 35 ha
 = 152 ha
- Plaines de submersion contrôlée (5) :
 Ouatagouna Nord 288 ha
 Ouatagouna Sud 130 ha
 Karou Nord 246 ha
 Karou Sud 670 ha
 Sindiwara 256 ha
 = 1590 ha

Avancement des travaux par site

Les travaux réalisés au niveau des différents sites sont récapitulés dans les tableaux n° 1 et 2.

Tableau n° 1 : Réalisation des travaux par site

Sites	Digues	Canaux	Ouvrages
OUATAGOUNA NORD	- Remblai de digue terminé	- Nivellement du drain principal - Déblai rocheux	- Ouvrages fins OA1, OA2 OA3 et OA6
OUATAGOUNA SUD	- Remblai de digue terminé	- Étalage du déblai du drain principal	- Ouvrages fins OA1, OA2 et OA3
SINDIWARA	- Digue en cours d'exécution	- Déblai du drain principal - Talutage du drain principal - Déblai des drains secondaires	
ANKOUM	- Remblai de digues terminé	- Canaux et drains terminés - Fossés de garde terminés	Préfabrication des parois des canaux primaires et exécution d'ouvrage de franchissement
KAROU NORD	- Remblai de la digue terminé - Suivi topo de la digue principale (contrôle des côtes)	- Déblai du drain principal - Suivi topo du drain principal - Déblai des drains secondaires n° 1 et n°2	- Implantation des ouvrages
KAROU SUD	- Remblai de la digue de berge - Décapage de l'emprise de la digue de berge (fin) - Travaux topographiques	- Implantation du drain principal - Nivellement du drain principal - Déblai du drain principal	- Implantation des ouvrages
GOLINGO	- Remblai digue de berge	- Implantation du canal principal	
KAROU GOURMA	- Implantation et nivellement des digues (attente de réception)	- Implantation et nivellement des canaux (attente de réception)	

Tableau 2 : Réalisations actuelles par site

Désignation	DIGUES			CANAUX			OUVRAGES		
	Prévues (m³)	Réalisées (m³)	%	Prévus (m)	Réalisés (m)	%	Prévus	Réalisés	%
SINDIWARA	52 616	46 479,70	94,30%	7 576	4 841,66	63,90%	4	0	0%
OUATAGOUNA NORD	45 508	52 999,95	116,46%	8 471	8 471	100%	6	4	67%
OUATAGOUNA SUD	38 733	52 059,85	134,40%	4 244	4 244	100%	3	3	100%
KAROU NORD	56 919	36 733	64,53%	7 315	6 315	86,33%	8	0	0%
KAROU SUD	128 034	104 700,16	81,77%	15 320	5 48 3,85	35,79%	11	0	0%
GOLINGO	28 981	12 000	41,40%	3 781	0	0%	11	0	0%
ANKOUM	36 635	53 858,08	147,01%	18 024	18 024	100%	33	1	3%

Malgré quelques difficultés, les travaux ont connu des avancées en terme de quantité et de qualité à Ouatagouna Nord, Ouatagouna Sud, Karou Nord, Karou Sud, Ankoum, Golingo et Sindiwara. Après contrôle et vérification, la Mission de Contrôle a établi les pourcentages d'exécution en terme monétaire et le délai global consommé à la date du 31 octobre 2003.

- **Plaines de submersion contrôlée :**

Sindiwara	:	81,41 %	de 749 543 422 FCFA	du marché
Ouatagouna Nord	:	77,90 %	de 255 203 284 FCFA	du marché
Ouatagouna Sud	:	109,41 %	de 155 861 095 FCFA	du marché
Karou Nord	:	73,15 %	de 217 939 497 FCFA	du marché
Karou Sud	:	61,91 %	de 488 804 207 FCFA	du marché
Karou Gourma	:	00,00 %	Non Démarré	
Gounga	:	00,00 %	Non Démarré	
Tobon	:	00,00 %	Non Démarré	

- **Périmètres irrigués :**

Ankoum	:	51,28 %	de 453 621 980 FCFA	du marché
Golingo	:	07,46 %	de 192 393 480 FCFA	du marché
Fafa Gourma	:	00,00 %	Non Démarré	
Herba	:	00,00 %	Non Démarré	

Le délai global consommé est de 61,11%.

En raison de la crue du fleuve, l'Entreprise a demandé et obtenu une suspension des travaux à compter du 1^{er} décembre 2003 jusqu'à la décrue.

- □ Suite aux travaux d'aménagement au niveau des plaines de Karou et de Ankoum, la Direction du projet a saisi le Haut commissaire de région en vue de l'octroi d'une aide alimentaire d'urgence pour les exploitants qui n'ont pas cultivé cette année.
- □ S'agissant de la **mise en valeur des plaines** : les PSC de Ouatagouna Nord et Sud ont été mises en valeur au cours de cette campagne.

Les résultats suivants ont été enregistrés :

Ouatagouna Nord : - superficies emblavées = 240 ha sur 260 ha prévus
 - superficies perdues = 14 ha
 - nombre d'exploitants = 150

Ouatagouna Sud : - superficies emblavées = 97 ha sur 117 ha prévus
 - superficies perdues = 6 ha
 - nombre d'exploitants = 110

soit un total de 337 ha emblavés dont **317 ha réussis** sur une prévision de 377 ha.

Ainsi, la **production moyenne attendue** au niveau de ces deux plaines est estimée à environ **475,5 tonnes de paddy**.

- □ Le **DAO local** pour l'aménagement des **périmètres de Léléhoye et Kounsoum** a été relancé. Il est en examen à la BAD.

- ☐ **Equipements de pompage** : le projet de contrat avec COMECOM est dans le circuit d'approbation à Bamako.
- ☐ **Protocole d'accord FGU/MAEP à signer** : Le protocole d'accord est toujours dans le circuit des signatures au niveau du MAEP.

Composante B : Développement durable de l'économie locale

- ☐ **Protocole d'accord avec la BNDA pour la gestion du crédit à signer**: ce protocole est dans le circuit des signatures. Les négociations se poursuivent toujours entre le MAEP et la BNDA (à travers le MEF).
- ☐ Le bureau d'études **UNIGEO.sarl** chargé de l'étude des **schémas d'aménagement de terroirs** a démarré les études depuis le 10 septembre 2003. Le rapport final de l'étude doit être déposé au mois de Janvier 2004.
- ☐ **Appui aux communes** : le marché pour la **fourniture du mobilier de bureau** des communes a été attribué. Il reste à faire la réception.
Pour les **équipements solaires**, le projet de contrat est dans le circuit des signatures.
Quant au **matériel informatique des communes**, le projet de contrat est en cours d'élaboration
- ☐ **Lutte contre les oiseaux granivores** : les TDR pour le recrutement d'un consultant pour le programme de lutte biologique contre les oiseaux granivores ont été élaborés et envoyés à la BAD pour avis.
- ☐ **Recherche - Développement** : aucune activité n'a encore démarré sur ce volet à cause des problèmes de trésorerie du projet.
- ☐ La direction régionale de la conservation de la nature a élaboré le **plan local d'actions environnementales (PLAE)** du cercle d'Ansongo après l'organisation des ateliers de restitution des résultats à Ansongo (le 11 Septembre 2003) et à Gao (le 09 Octobre 2003).

Les autres activités de la composante B n'ont pas connu de démarrage car liées à la mise en place du crédit agricole et à l'exécution des SAT.

Composante C : Alphabétisation et Formation

- ☐ L'**équipement** des centres d'alphabétisation a été réceptionné.
- ☐ Le dossier de consultation **des matériels didactiques** est en instance à la BAD.
- ☐ Le PV de **recrutement de l'ONG chargée de l'alphabétisation - formation** est dans le circuit d'approbation à la BAD.
- ☐ **11 Sociétés coopératives de PIV et PSC et la FGU** ont obtenu leurs récépissés de reconnaissance au mois d'Avril 2003.

S'agissant de la formation des cadres , agents d'encadrement et élus communaux et les voyages d'études, ils n'ont pas pu être exécutés faute de ressources financières.

Composante D : Unité de direction et de gestion du Projet

- □ Les travaux de **construction des bureaux du projet** attribués à l'Entreprise **MAC - BTP** ont démarré le **24 juillet 2003**. Mais suite à quelques difficultés de l'entreprise et au retard de paiement de l'avance de démarrage, les travaux furent arrêtés le **27 septembre 2003** ; actuellement les travaux sont en cours.
Le Bureau d'ingénierie-conseils **CIETRA.sa** est chargé de la surveillance des travaux.
- □ Pour le **forage des bureaux du Projet**, le projet de contrat est en cours d'élaboration.
- □ Le **PV des équipements d'exhaure et d'adduction d'eau** se trouve au niveau de la BAD pour avis.
- □ Le **marché des équipements informatiques du projet** a été attribué à I&D ; les équipements ont été réceptionnés le **07 Mai 2003** par le projet.
- □ Le **conseiller technique en gestion** a élaboré un manuel de procédures pour la gestion administrative et financière du projet ; le document est actuellement en cours de finalisation.
- □ Le **contrat de marché pour la surveillance et le contrôle des travaux d'aménagement des PIV et des PSC** attribué au groupement CIRA.sarl / Louis Berger.sa a été signé le **10 mars 2003**. La mission de contrôle et de surveillance des travaux a démarré le **15 mars 2003**. Elle a produit 7 rapports de surveillance.
L'entreprise OTER.SA a demandé une suspension des travaux pour cause de la montée des eaux du fleuve Niger à compter du **1er décembre 2003**. Un ordre de service a été établi à cet effet par la DNAER.
- □ Le **DAO local** relatif aux travaux de **11 bâtiments polyvalents** a été lancé. Le **PV de dépouillement** est en instance à la BAD.
- □ Le dossier pour la **surveillance des travaux de trente (30) bâtiments polyvalents** est en cours de lancement à la DAF/MAEP, de même que le DAO pour la consultation en suivi évaluation.
- □ Le dossier de consultation pour l'**élaboration du manuel de procédures du développement local** est à la BAD, pour avis.
- □ Le projet a organisé trois (3) sessions du **Comité Technique de Coordination (CTC)** au cours de l'année.
- □ La **2ème session du Comité de Pilotage** a eu lieu le **21 mars 2003** à Gao sous la présidence du directeur de cabinet du Haut Commissaire de Gao. Les principales recommandations issues du CP sont :

1. la direction du PRODECA est invitée à rentrer en contact avec le MAEP pour accélérer la signature du protocole d'accord MAEP et Fédération des Sociétés Coopératives des PIV et PSC d'Ansongo en vue d'assurer une sécurité foncière et l'exploitation des espaces aménagés ;
2. la direction du PRODECA est invitée à rentrer en contact avec le MAEP, avec l'appui de la DNAER pour accélérer la signature du protocole d'accord avec la BNDA pour la gestion du crédit agricole ;
3. la direction du PRODECA est invitée, avec l'appui de la DNAER à solliciter auprès du MAEP un soutien financier pour la lutte chimique contre les oiseaux granivores ;
4. le comité de pilotage déplore les lourdeurs administratives dans le traitement des dossiers pour la passation des marchés et souhaite par conséquent un allègement des procédures afin d'accélérer l'exécution du programme prévisionnel.

- □ **Du 19 au 25 juin 2003**, la DNAER a effectué une mission de supervision des activités.
 - □ **Du 17 au 26 août 2003**, une mission de supervision du cabinet a eu lieu pour constater l'état d'exécution des activités du projet, suite à la visite du **03 au 05 Août 2003**, du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche au niveau des sites d'aménagement du projet à Ankoun, Ouatagouna et Karou.
 - □ **Du 29 novembre au 05 décembre 2003**, la CPS en compagnie de la DNAER, a organisé une mission de supervision au niveau du projet.
- D'autres missions de supervision ont été effectuées au niveau du projet par la Coordination Nationale de Suivi de la campagne agricole et la DNAMR ; le projet a également reçu la visite du Directeur National de la DNAMR de passage à Gao, le **12 Septembre 2003**.
- □ Plusieurs **missions de suivi, d'information et de sensibilisation** au niveau des différents sites d'aménagement ont été organisées par le projet. La direction du projet a reçu l'appui d'un conseiller national aux collectivités territoriales pour trouver une solution favorable à la réticence des habitants de Kounsoum pour les aménagements hydro agricoles du projet.
 - □ Le projet de contrat de **l'Audit des comptes du Projet exercice 2001 et 2002** est en cours d'élaboration.
 - □ Le dossier de consultation pour **l'Audit des comptes 2003-2004** est envoyé à la BAD pour avis.

A cause de la délocalisation de la BAD, les dispositions pratiques pour la réalisation de l'évaluation mi-parcours du projet n'ont pas pu être prises. Elle sera reprogrammée pour l'année 2004.

ETAT D'EXECUTION FINANCIERE

Source de financement	Montant de la participation	Montant décaissé	Taux décaissement %
Budget National	1 122 550 000	493 381 242	43,95%
Fonds Africain de Développement	7 826 950 000	2 911 607 546	37,20%
TOTAL	8 949 500 000	3 404 988 788	38,05%

CONTRAINTES MAJEURES LIEES A L' EXECUTION DU PROJET

- Retard dans la signature du protocole de gestion du crédit (BNDA)
- lenteur dans la passation des marchés et contrats
- Délocalisation de la BAD
- Réticences des populations du village de Kounsoum (3 sites) à accepter les aménagements hydro agricoles.

SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Prise en charge du déficit du bureau BNDA d'Ansongo dans le cadre du service public ;
- Accélération des procédures de passation des marchés et contrats ;
- Poursuite de l'information/sensibilisation des populations de Kounsoum avec l'appui des autorités administratives et politiques tant au niveau national, régional et local.
