

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de
l'Agriculture

Ministère de
l'Élevage et de la Pêche

Commissariat à la
Sécurité Alimentaire

Cellule de Planification et de Statistique
du Secteur du Développement Rural



Répertoire 2016

des Projets et Programmes
du Secteur du Développement Rural

EDITION 2017



REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

Ministère de
l'Agriculture

Ministère de
l'Élevage et de la Pêche

Commissariat à la
Sécurité Alimentaire

Cellule de Planification et de Statistique
du Secteur du Développement Rural



Répertoire 2016

des Projets et Programmes

du Secteur du Développement Rural

Equipe de conception et de rédaction (UPSE-CPS/SDR)

Malick SY, Kotié DIAKITE, Salif DIARRA, Sidi DAO et Korotoumou TOURE

EDITION 2017

Table des matières

LISTE DES ACRONYMES	5
LES MOTS DU MINISTRE DE AGRICULTURE - MA	7
AVANT-PROPOS	8
UNITE INTERIMAIRE DE CONSOLIDATION ET DE GESTION DES ACQUIS DU PROGRAMME DE COMPETITIVITE ET DE DIVERSIFICATION AGRICOLES (UICG/PCDA)	26
CONSTRUCTION / EQUIPEMENT INSPECTION DE L'AGRICULTURE	28
REHABILITATION ET EQUIPEMENTS BUREAUX DFM/MA	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA REGION DE KOULIKORO (PRESAN-KL)	32
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE PAR LE DEVELOPPEMENT DES CULTURES IRRIGUEES (PRESA/DCI)	34
PROJET D'APPUI A L'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE COTON DANS SA NOUVELLE CONFIGURATION INSTITUTIONNELLE ET A LA PRODUCTIVITE ET DURABILITE DES SYSTEMES D'EXPLOITATION EN ZONE COTONNIERE (PASE 2)	36
CONSTRUCTION VOIE D'ACCES CENTRE SINO-MALIEN	38
PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE (SAPEP)	39
PROGRAMME DE TRANSFORMATION INTEGREE DES ZONES GRENIERS DU MALI (PTI-ZGM)	41
PROGRAMME DE MICROFINANCE RURALE (PMR)	42
PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)	44
PROJET INITIATIVE EAU ET SECURITE ALIMENTAIRE (IESA)	45
PROJET ADAPTATION DE L'AGRICULTURE ET L'ELEVAGE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MALI (ACC)	46
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE AU MALI (PRIA-MALI)	48
APPUI A LA CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE	50
REHABILITATION BUREAU CPS	51
APPUI A L'ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)	52
PROGRAMME DE RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE (RGA)	53
PROGRAMME D'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE AU MALI (PAPAM)	54
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE (PDI-BS)	56
PROGRAMME NATIONAL DES PETITS BARRAGES ET BAS-FONDS (PNPBBF)	58
PROGRAMME D'APPUI A CROISSANCE ECONOMIQUE ET PROMOTION DE L'EMPLOI STIMULEES PAR LE SECTEUR PRIVE (PACEPEP)	60
CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE/PRODUCTEURS (CP-OHVN)	62
PROJET D'AMENAGEMENT DES PISTES DE LIASON DE BAGUINEDA	64
REHABILITATION DU PERIMETRE HYDRO-AGRICOLE DE BAGUINEDA (CONTRAT-PLAN)	66
PROGRAMME D'APPUI AU SOUS-SECTEUR D'IRRIGATION DE PROXIMITE (PASSIP)	67
PROJET IRRIGATION DE PROXIMITE - RENFORCEMENT DE L'AGRICULTURE IRRIGUEE (IPRO-REAGIR) KOULIKORO	69
PROJET D'APPUI A L'IRRIGATION DE PROXIMITE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER (IPRO-DI), EX PROGRAMME MALI NORD	71
PROJET AMELIORER LA CAPACITE D'ADAPTATION ET LA RESILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE DU MALI DU FEM/PNUD/ACDI/DNA	72
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA FERME RIZICOLE DE SABE	74
PROJET D'APPUI AUX ORGANISATIONS PAYSANNES DU PLATEAU DOGON POUR UNE MEILLEURE VALORISATION DE LEURS PRODUCTIONS MARAICHERES (GTFS/MLI/030/ITA)	75
APPUI AU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN	77
PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L'OUEST (PPAAO)	79
WEST AFRICAN AGRICULTURE PRODUCTIVITY PROGRAM (WAAPP)	79
PROGRAMME QUINQUENNAL D'AMENAGEMENTS PASTORAUX (PQAP)	83
PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS-MALI)	85
PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION DE LA PRODUCTION LAITIERE AU MALI (PRODEVALAIT)	87
CONVENTION D'APPUI FINANCIER POUR LA LUTTE CONTRE LE CHARBON BACTERIDIEN (PCB)	89
CENTRE NATIONAL DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE	91
CELLULE DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES TSE-TSE	93
PROJET D'APPUI A LA FILIERE HALIEUTIQUE AU MALI (PAFHA)	95
CONSTRUCTION DU MARCHÉ MODERNE A POISSON	96
PROGRAMME QUINQUENNAL D'AMENAGEMENTS AQUACOLES (PQAA)	98
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES RESSOURCES ANIMALES ET AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)	100
CONTRAT PLAN DU LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE / ETAT (3 ^{EME} CP-LCV 2015-2017)	101
PROJET DE TRANSFORMATION DES SOUS	102
PRODUITS D'ABATTAGE	102
STOCK NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE(SNS)	106
PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DU MARCHÉ CEREALIER (PRMC)	108
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU KAARTA / SEFETO	111
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU DISTRICT DE KITA ET DE SES ENVIRONS, PHASE 2 (PDRIK II)	113
CONTRAT PLAN ETAT – ADRS - PRODUCTEURS	115
PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE YELIMANE PHASE 2 (PADDY II)	117
PROJET D'APPUI A LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION (PASNDI) 3 ^{EME} PHASE DANS LA REGION DE KAYES	119
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES DANS LA ZONE DE KAYES-SUD (PADEPA-KS)	121
CONTRAT PLAN ETAT PRODUCTEUR OPIB 2 ^{EME} (CONTRAT-PLAN)	124
PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME D'IRRIGATION DU PERIMETRE DE BANGUINEDA	126

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ET DE LA PISCICULTURE EN ZONE OHVN	127
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU ZEBU MAURE DANS LE CERCLE DE NARA (PRODEZEM)	129
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION DANS LES CERCLES DE NARA ET NIORO (PLIAM)	131
PROGRAMME D'APPUI AUX FILIERES AGROPASTORALES DE SIKASSO (PAFA)	134
PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DANS LA REGION DE SIKASSO - PAHA	136
IRRIGATION DE PROXIMITE-INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE PAR L'IRRIGATION ET A GESTION APPROPRIEE DES RESSOURCES (IPRO-IRRIGAR) /COMPOSANTE-SIKASSO	138
PROJET DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION DE L'ANACARDE DANS LA REGION DE SIKASSO (PCTARS)	140
PROJET AMELIORATION DURABLE DE LA PRODUCTIVITE DE LA COMPETITIVITE DU RIZ PLUVIAL ET DE BAS-FONDS DANS LA REGION DE SIKASSO AU MALI	142
OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE SELINGUE-CONTRAT PLAN (ODRS-CP)	144
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE POUR LA REDUCTION DE LA PAUVRETE EN ZONE ONDY (PDIRP-ONDY)	146
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AQUACOLE DANS LA REGION DE SIKASSO (PRODEFA-SIKASSO)	148
OFFICE DU MOYEN BANI	151
REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA	153
PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DU CASIER DE MOLODO NORD-PHASE I	154
PROGRAMME D'APPUI AU CONTRAT PLAN DE L'OFFICE DU NIGER (PACOP)	156
PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT PLAN DE L'OFFICE DU NIGER (PAMOCP-ON)	158
PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA ZONE DE L'OFFICE DU NIGER PHASE 2 (PADON 2)	159
PROJET D'APPUI A L'OFFICE DU NIGER (PAON)	161
CONTRAT PLAN ETAT-OFFICE DU NIGER-EXPLOITANTS AGRICOLES	163
ENTRETIEN/ AMENAGEMENT / INFRASTRUCTURES/VULGARISATION	163
OFFICE RIZ SEGOU/ 8EME CONTRAT PLAN (ETAT/ ORS/ PRODUCTEURS)	165
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE SOKE 1 (PADER-S1)	167
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE TIEN- KONOU ET TAMANI (PADER-TKT)	168
RENOVATION ET REHABILITATION DU CENTRE PISCICOLE DE MOLODO	170
OFFICE RIZ MOPTI 7 ^{IE} ME CONTRAT PLAN (ORM-CP)	173
IRRIGATION DE PROXIMITE : PROJET RENFORCEMENT DE L'AGRICULTURE IRRIGUEE (IPRO-REAGIR/MOPTI)	175
COMPOSANTE PAYS DOGON	175
OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'ACQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER	177
PROJET TRAVAUX D'EXTENSION 200HA DE LA PLAINE DE SAOUNE	179
OFFICE POUR LA MISE EN VALEUR DU SYSTEME FAGUIBINE (OMVF)	181
PROJET D'APPUI A LA RESTAURATION DU SYSTEME FAGUIBINE (PARF)	183
PROGRAMME INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES REGION DU NORD (PIDRN)	185
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DANS LA REGION DU LIPTAKO-GOURMA (PDELG)	188
PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION DE KIDAL (PIDRK)	191

Liste des acronymes

AGRA	
BADEA	BANAQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE
BIDC	BANQUE INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
FAO	ORGANISATION DES NATIONS UNIS POUR L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION
OPEP	ORGANISATION DES PAYS PRODUCTEURS DU PETROLE
ABS-D	
ACDI	AGENCE CANADIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
ADR	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
AEDD	AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
APCAM	ASSEMBLE PERMANANT DES CHAMBRES D'AGRICULTURE AU MALI
APD	AVANT PROJET DETAILLE
ARPASO	ASSOCIATION DES RIZICULTEURS DE LA PLAINE AMENAGEE DE SAN OUEST
BSI	BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENT
CDPE	CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE
CED	CENTRE D'ALPHABETISATION
CMDT	COMPAGNIE MALIENNE DE DEVELOPEMENT TEXTILE
CNLCP	CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÉLERIN
CNOP	COORDINATION NATIONALE DES ORGANISATIONS PAYSANNES
CNRA	CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE
CORAF	
CPS/SDR	CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE SECTEUR DÉVELOPPEMENT RURAL
CR	CONSEIL REGIONAL
CRA	CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
CREDD	CADRE STRATÉGIQUE POUR LA RELANCE ECONOMIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
CRRA	CENTRE RÉGIONAL DE RECHERCHE AGRICOLE
CSCOM	CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE
CSCPC	CONFEDERATION DES SOCIETES COOPERATIVES DES PRODUCTEURS DE COTON
CT	COLLECTIVITES TERRITORIALES
DAO	DOSSIER D'APPEL D'OFFRE
DDC	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET LA COOPERATION
DLCA	DELEGATION LOCALE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
DNA	DIRECTIONALE DE L'AGRICULTURE
DNGR	DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL
DNP	DIRECTION NATIONALE DE LA PÊCHE
DNPIA	DIRECTION NATIONALE DES PRODUCTIONS ET INDUSTRIES ANIMALES
DNSV	DIRECTION NATIONALE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES
DRA	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
DRPIA	DIRECTION RÉGIONALE DES PRODUCTIONS ET INDUSTRIES ANIMALES
EES	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
EPA	PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF
FCC	FONDS COMMUN DE CONTRE PARTIE
FR SCPC	FEDERATION REGIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DES PRODUCTEURS DE COTON
FSA	Fonds de Sécurité Alimentaire
GIE	GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
GIFS	GESTION INTEGREE DE LA FERTILITE DES SOLS
GIPD	GESTION INTÉGRÉE DES PRODUCTIONS ET DES DÉPRÉDATEURS
GPS	GLOBAL POSITION SYSTEM
GRM	GOVERNEMENT
HIMO	HAUTE INTENSITE DE MAINS D'ŒUVRE
IER	ISTITUT D'ECONOMIE RURAL
IMF	INSTITUTION DE MICRO FINANCE
LUXDEV	AGENCE LUXEMBOURGEOISE POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
MDR	MINISTERE DE DEVELOPPEMENT RURAL
OHADA	ORGANISATION POUR L'HARMINISATION DES DROITS DES AFFAIRES EN AFRIQUE
OHVN	OFFICE DE LA HAUTE VALLÉE DU NIGER
OMA	OBSERVATOIRE DU MARCHE AGRICOLE
OMD	OBJECTIF DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ON	OFFICE DU NIGER
ONG	ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
ONG	ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
OP	ORGANISATIONS PAYSANNES
OPA	ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES
OPAM	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI
OPF	ORGANISATIONS PAYSANNES FEMININES
OPIB	OFFICE DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE BAGUINÉDA
OPJR	ORGANISATION PAYSANNE DES JEUNES RURAUX
OPV	OFFICE DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ORM	OFFICE RIZ MOPTI
ORS	OFFICE RIZ SÉGOU

PAFAM	PROJET D'APPUI À LA FILIÈRE ANACARDE AU MALI
PASAOP	PROJET D'APPUI AU SERVICE AGRICOLE ET A L'ORGANISATION PAYSANNE
PDDAA	PROGRAMME DÉTAILLÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE
PIB	PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
PM	PERIMETRE MARAICHER
PNIP	PROGRAMME NATIONAL D'IRRIGATION DE PROXIMITÉ
PNISA	PLAN NATIONAL D'INVESTISSEMENTS DU SECTEUR AGRICOLE
PPCB	PERI PNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE
PPCB	PÉRI PNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE
PPIV	PETIT PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ VILLAGEOIS
PPR	
PPTÉ	PAYS PAUVRES TRÈS ENDETTÉS
RGA	RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE
SAP	SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE
SCPC	SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DES PRODUCTEURS DE COTON
SDDZON	SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE OFFICE DU NIGER
SFD	SERVICE FINANCIER DÉCENTRALISÉ
SG	SECÉTARIAT GÉNÉRAL
SNS	STOCK NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE
SPAI	
STD	SERVICES TECHNIQUES DÉCENTRÉS
SVN	ORGANISATION INTERNATIONALE NEERLANDAISE
UCG	UNITE DE COORDINATION ET DE GESTION
UNCDF	
VTMS	



La Cellule de Planification et de Statistique du Secteur du Développement Rural (CPS/SDR) a pour mission de fournir régulièrement, aux Départements du Développement Rural, aux partenaires techniques et financiers et autres acteurs du Secteur Rural, une description globale du portefeuille de Projets et Programmes (P/P), en préparation ou en cours d'exécution sur le territoire national.

Cette édition 2016 du répertoire des Projets et Programmes s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions publiées en 2002, 2008, 2009, 2010 et 2011. Il vise à décrire l'état d'exécution des Projets et Programmes du Secteur Développement Rural au 31 décembre de l'année écoulée et à offrir aux différents acteurs du développement rural des éléments d'appréciation et d'orientation sur cette situation des P/P.

Le répertoire est un des produits issus du Dispositif National de Suivi Evaluation Externe mis en place par la CPS depuis 2007 et validé en mai 2008. Sur le plan

méthodologique, toutes les informations ont été recueillies directement auprès des projets lors des visites de terrain effectuées en mars et avril 2017 par la CPS, mais également en exploitant les documents de projets contenus dans la banque de données documentaire de la CPS.

Depuis l'édition 2008, les douze indicateurs de la Déclaration de Paris (DP) ont été pris en compte pour accompagner la mise en œuvre progressive dans les P/P.

Dans le cadre du passage à l'approche sectorielle, une présentation du Programme National d'Investissement pour le Secteur Agricole (PNISA) permet de mieux mesurer le chemin à parcourir sur la voie de l'amélioration de l'efficacité de l'aide.

Cette année, des données de synthèse sur les P/P portés par d'autres tutelles que celles des Départements du Secteur Développement Rural sont également incluses dans la première partie du répertoire. Ces informations sont issues de banques de données de la CPS SEEUH et de la DNPD (en lien avec les Ministères et Secrétariats d'Etat concernés), Elles permettent avec les données des P/P du SDR de réaliser une première approche sur l'état global des financements en faveur de l'Agriculture et du développement Agricole, et sur leur

*répartition par composante principale, dans le cadre du
PNISA.*

Le Directeur de la CPS/SDR

Moussa CAMARA

A. LE CONTEXTE GENERAL

A.1. Le rôle et les missions de la CPS du SDR

La loi n°07-020 du 27 Février 2007, portant création des Cellules de Planification et de Statistique, leur confère les sept missions suivantes:

1. Coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l'analyse des politiques et stratégies.
2. Suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller à leur cohérence intra sectorielle et spatiale.
3. Elaborer les prévisions et suivre l'environnement et la conjoncture.
4. Suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique.
5. Coordonner en rapport avec les services chargés des ressources humaines le programme de formation en matière de planification et de statistique.
6. Coordonner la production d'informations statistiques et la réalisation d'études de base ainsi que la diffusion de leurs résultats.
7. Mettre en place et gérer la base de données du secteur.

La Cellule de Planification et de Statistique assure, en rapport avec les services techniques concernés, la mission de planification et d'information statistique dans ses domaines couverts.

Ainsi, le Décret n° 07-166/P-RM du 28 Mai 2007 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des CPS a confié à l'Unité Programmation et Suivi-Evaluation, les cinq missions suivantes:

1. Appuyer l'identification, la préparation, le suivi et l'évaluation des programmes et projets du secteur.
2. Participer à la préparation technique et administrative des négociations des accords et conventions de financement des programmes et projets du secteur.
3. Participer à l'étude et au traitement des requêtes relatives au financement de programmes/projets du secteur.
4. Elaborer, en rapport avec les services centraux sectoriels et de planification, les Programmes et Budgets d'Investissements Publics.
5. Elaborer un rapport annuel d'exécution des programmes/projets du secteur.

Aux termes du Décret n° 07-166/P-RM du 28 Mai 2007 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des CPS, le secteur défini comme un champ de compétence dédié à une CPS, établi celui de la CPS SD comme constitué des Ministères chargés de l'Agriculture, l'Elevage et la pêche et le commissariat à la sécurité alimentaire.

A.2. Le suivi évaluation à la CPS/SDR

La mission première de l'Unité Programmation Suivi Evaluation de la CPS du SEEUDE consiste donc à appuyer le suivi et l'évaluation des projets et des programmes du secteur. Il s'agit essentiellement d'une mission externe, dont la mise en œuvre se fait suivant trois (3) démarches complémentaires :

- (i) Le **suivi annuel** et **intégral** de tous les projets et programmes du portefeuille du SEEUDE portant sur les réalisations de l'année écoulé (N-1), réalisé en début de chaque année dans le cadre de la revue sectorielle.
- (ii) L'**évaluation continue** d'un nombre limité de projets et programme au cours de l'année pour apprécier leur performance de mise en œuvre.
- (iii) Les **autres évaluations ponctuelles** (évaluations d'impact, missions d'accompagnement des PTF, conventions avec certains projets ou structures) réalisées en cours d'année à la demande des partenaires concernés.

Ces trois approches utilisent des outils spécifiques et conduisent à l'élaboration des documents suivants :

- (i) La Rapport de la **revue sectorielle** et le **Répertoire** des P/P.
- (ii) Tout au long de l'année : les **Rapports d'évaluation de la performance** des projets et programmes évalués.
- (iii) Ponctuellement : des **Rapports d'évaluations** correspondant aux termes de référence spécifiques à chaque mission.

Ces éléments préfigurent le dispositif de suivi-évaluation en préparation. Ce dispositif de suivi-évaluation contribuera certainement à améliorer la visibilité globale des performances des Projets et Programmes du secteur et favoriser la création d'un espace commun de réflexion et d'analyse autour des résultats obtenus.


B. LA SITUATION DU PORTEFEUILLE DES P/P DU SRD AU 31/12/2016

C.1. La répartition des P/P et des volumes de financement au sein du SDR


Le portefeuille du SDR comporte **97** projets et programmes dont **86** en exécution et **11** en préparation. 73 projets et programmes sont inscrits au Répertoire National des Projets (RNP) ; 24 P/P attendent d'être inscrits.

Le financement total acquis (intérieur et extérieur) du portefeuille des projets et programmes du SDR au 31 décembre 2016 est de **820,925** milliards de FCFA, contre **921 milliards** au 31 décembre 2015, soit un taux de baisse de 11 %.

Il apparaît alors une baisse du nombre de projets est **15%** et de celui du financement cumulé de **11%**. On note en résumé que le volume des financements du Secteur après de longue année de progression presque continue avec presque un doublement du portefeuille, est passé de **517 milliards** FCFA environ en 2007 à plus de **920 milliards** de FCFA en 2015. L'année 2016 a connu une baisse significative d'environ **11%**, cependant le portefeuille reste assez dynamique malgré la baisse. L'âge moyen des projets est de **5 ans**, ce qui dénote en partie le vieillissement du portefeuille et les difficultés dans l'exécution des projets.

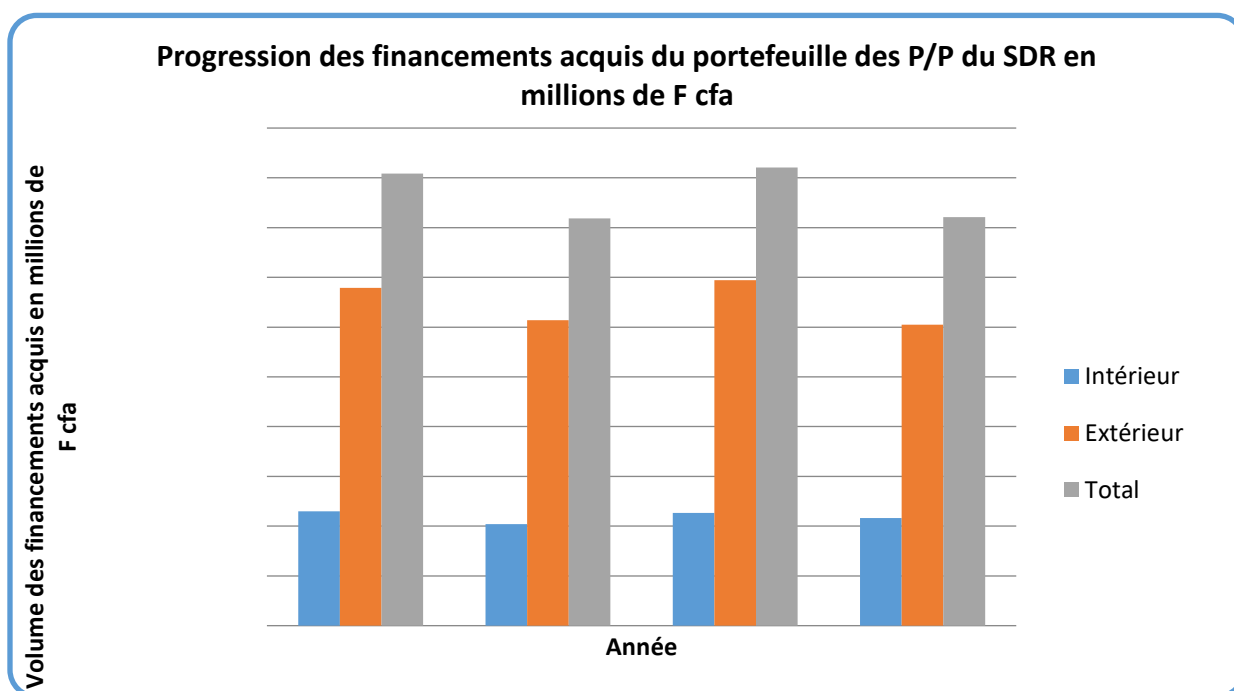

Il convient cependant de souligner que la répartition par tutelle ne signifie pas nécessairement une répartition des financements par activité. En effet, des projets sous tutelle du Ministère de l'Agriculture peuvent développer d'importantes activités en matière d'élevage tout comme des projets du Ministère de l'Élevage et de la Pêche peuvent avoir des activités spécifiquement agricoles. Enfin, tous ces projets contribuent à l'atteinte de la sécurité alimentaire du pays.

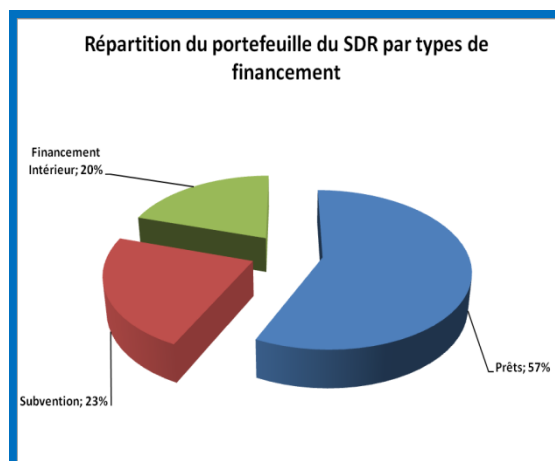

C.2. La répartition des sources de financement des P/P

⇒ Evolution des types de financement du portefeuille :

Le volume total de financement acquis cumulé des projets et programmes en cours d'exécution et en préparation s'élève à **820,925** milliards de FCFA au 31/12/2016. Les sources de financement (Figure 2) se répartissent entre le financement intérieur et le financement extérieur, lui-même composé de prêts et de subventions (dons):

- Les 80% du portefeuille des projets et programmes sont assurés sur financement extérieur (prêts 57% et subventions 23%).
- L'engagement de l'Etat à travers le BSI est de 20% du volume total.

Type de financement	MA	MEP	CSA	SDR
Prêt	301 211	62 007	0	321 908
Subvention	128 275	19 628	10 352	149 455
Financement intérieur	101 923	20 159	32 962	216 171
Mixte	117 057	0	27 351	133 391
Total	648 466	101 794	70 665	820 925

⇒ Suivant le nombre de P/P par tutelle

Au 31 décembre 2016, les projets et programmes du SDR sont répartis entre les structures de tutelle comme indiqué dans le tableau N° 7 ci-dessous :

Tableau 1: Répartition des projets et programmes par structure du département

Type de financement	MA	MEP	CSA	SDR
Prêt	10	5	0	15
Subvention	21	7	1	29
Financement intérieur	30	13	3	46
Mixte	5	0	2	7
Total	66	25	6	97

Sur les 97 projets répertoriés, 66 sont rattachés au MA, 25 au MEP et 6 au CSA.

⇒ Suivant la tutelle des financements acquis P/P

Au plan des financements acquis, le portefeuille des projets et programmes est réparti selon le tableau 8 ci-dessous :

Tableau 2 : Répartition par tutelle des financements acquis des projets et programmes

Financement acquis cumulés 31/12/2010	MA	MEP	CSA	SDR
Millions FCFA	648 466	101 794	70665	820 925
%	79%	12%	9%	100,0%

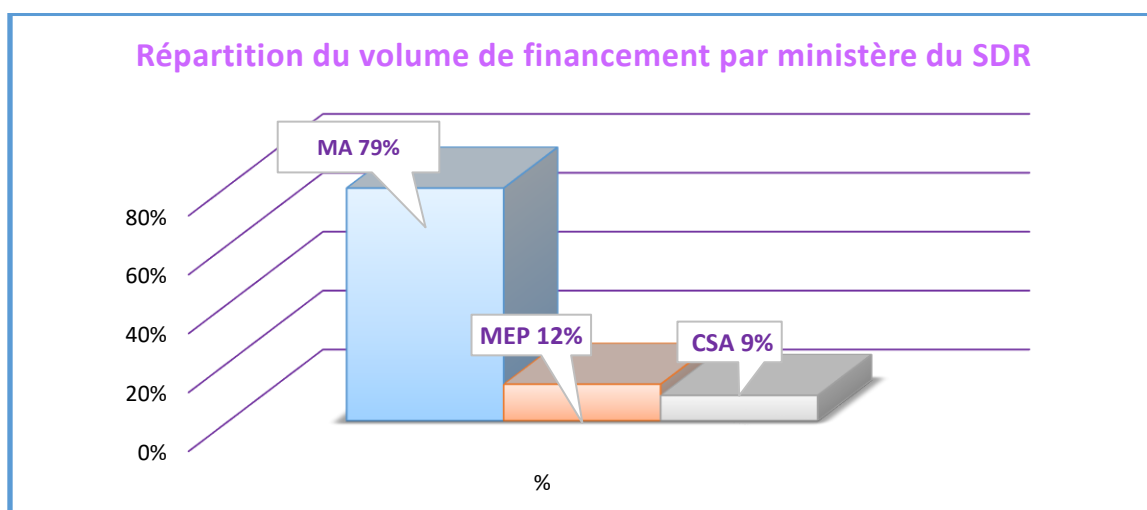


Figure 1: Répartition des volumes de financement extérieur des projets et programmes du SDR par structure.

C.3. L'évolution des volumes des financements et des taux de décaissement

⇒ Evolution des types de financement du portefeuille :

Tableau 3 : évolution de la répartition du portefeuille par type de financement

Type de financement	SDR 2014	SDR 2015	SDR 2016
Prêt	487445	487617	321908
Subvention	165303	180586	149455
Prêt / Subvention	25937	25937	133391
Financement intérieur	229584	226639	216171
Total	908269	920779	820925

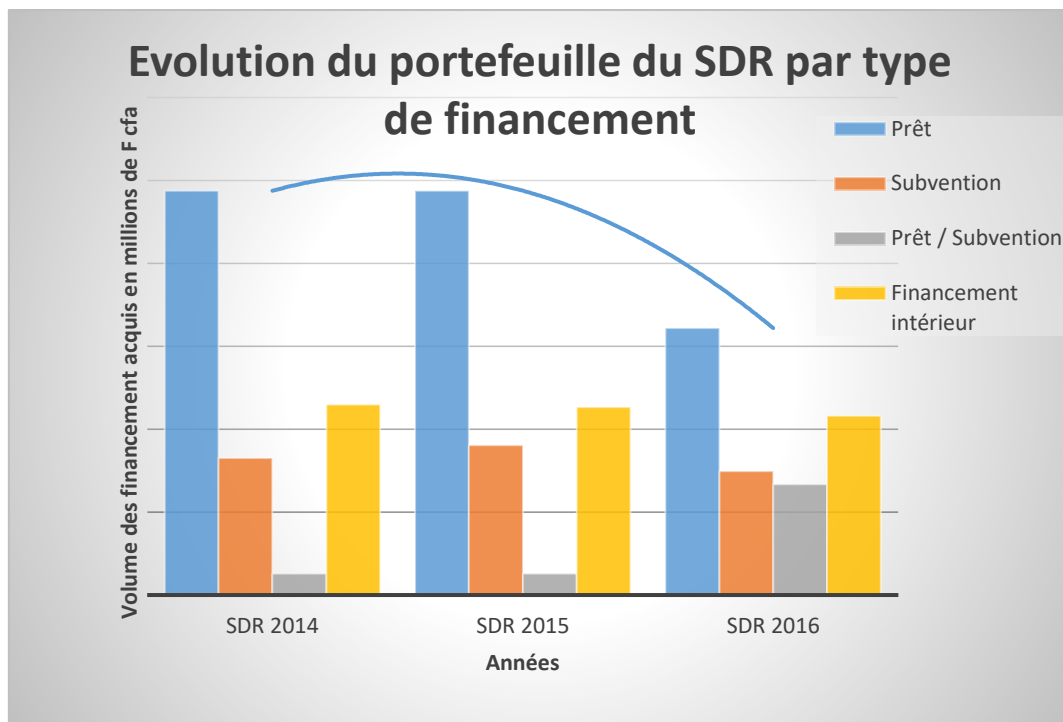


Figure 2 : évolution de la répartition du portefeuille par type de financement entre 2014 et 2016

⇒ Evolution des financements acquis par tutelle de 2012 à 2016:

Tableau 4 : évolution des financements acquis cumulés de 2012 à 2016

Fin acquis cumulé	MA	MEP	CSA	SDR
31/12/12	689 760	113 515	42 067	845 342
31/12/13	657 275	115 673	45 501	818 449
31/12/14	716 052	131 484	60 736	908 272
31/12/15	740 725	112 606	67 448	920 779
31/12/16	648 466	101 794	70 665	820 925

⇒ Évolution des volumes de décaissement cumulé entre 2014 et 2016

Le décaissement a été calculé pour les financements intérieurs et extérieurs. Cela permet de situer, en rapport avec l'âge et les taux de réalisation physique, la bonne évolution des projets. Pour y parvenir, la CPS a d'abord exploité les informations recueillies auprès des projets eux-mêmes au cours de visites de terrain.

Sur la base de ces informations, le montant total décaissé se chiffre à **429,577** milliards de FCFA. Le taux de décaissement global est de **52,33%** contre **68,65 %** pour la 16ème revue.

Tableau 5 : Évolution des volumes de décaissement cumulé entre 2014 et 2016

Année	Intérieur	Extérieur	Total	PROGRESSION
2014	125007	267066	392073	-
2015	121620	289955	411575	41,4%

2016	126628	302949	429577	4,4%
------	--------	--------	--------	------


MA				
Année	Intérieur	Extérieur	Total	PROGRESSION
2014	62 672	240 674	303 346	-
2015	72 803	205 394	278 197	-8,3%
2016	70 129	252 325	322 454	15,9%
MEP				
Année	Intérieur	Extérieur	Total	PROGRESSION
2014	38 598	37 922	76 520	-
2015	38 518	23 409	61 927	-19,1%
2016	27 702	24 609	52 311	-15,5%
CSA				
Année	Intérieur	Extérieur	Total	PROGRESSION
2014	13 606	23 750	37 356	-
2015	20 430	25 872	46 302	23,9%
2016	28 797	26 015	54 812	18,4%

C. 4. La vitalité du portefeuille et l'âge des P/P

La moyenne d'âge des P/P en exécution est d'environ 5 ans ; ceci dénote non seulement la vieillesse des projets et programmes mais aussi la faible vitalité du secteur. Pour le MA, l'âge moyen est de 4,15 contre 6,36 et 5,66 respectivement pour le MEP et le CSA.

Cette situation est assez préoccupante comparativement à la durée moyenne d'un projet de l'ordre de 3 à 5 ans.

Age des P/P	SDR	MA	MEP	CSA
0 à 1 an	21	13	7	1
2 ans	11	10	1	0
3 à 5 ans	23	18	2	3
6 à 10 ans	34	22	11	1
plus de 10 ans	8	3	4	1
Nombre total de P/P	97	66	25	6
Age moyen des P/P	4,81	4,15	6,36	5,66

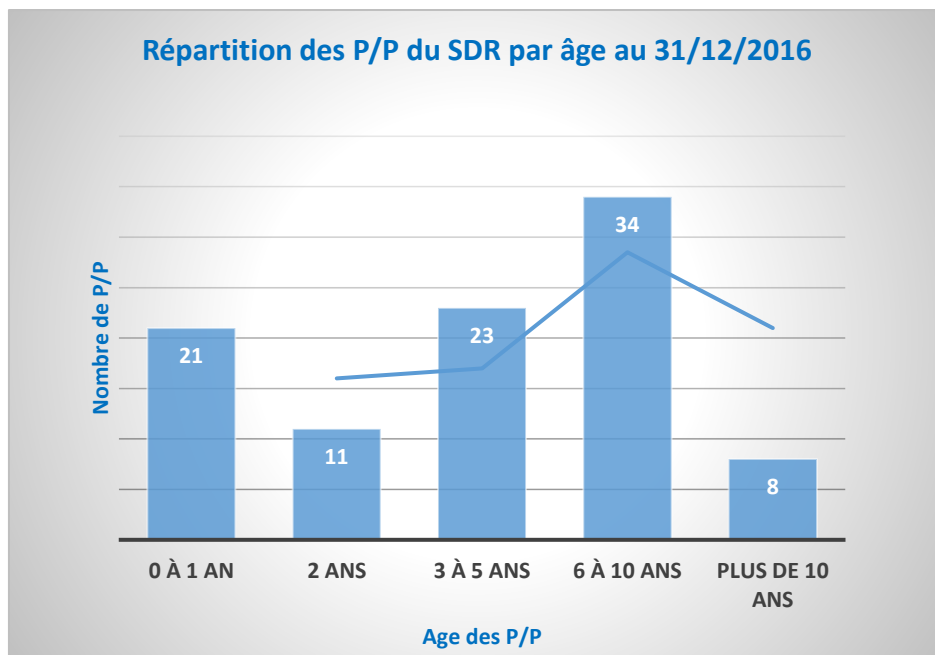

C. 5. La répartition géographique des p/p et des volumes des financements

La présente analyse permet d'apprécier la répartition des P/P et leur financement suivant leur localisation géographique.

Toutefois, elle nécessite une certaine prudence pour ne pas tirer des conclusions hâtives. En effet, on constate dans le tableau que la région de Gao ne dispose pas exclusivement de P/P. L'analyse montre que 29 P/P (avec un financement acquis cumulé de 271,943 milliards de F CFA) de types, soit multirégional (qui interviennent dans plusieurs régions) ou national (qui interviennent au niveau de tout le territoire) intéresse la région. Cette explication est valable pour Kidal, Mopti, et Tombouctou.

Tableau 6 : répartition géographique des P/P

Localisation	Nombre de P/P	Volume de financement	%
Kayes	6	32 235	3,9%
Koulikoro	9	71 473	8,7%
Sikasso	10	27 446	3,3%
Ségou	11	131 807	16,1%
Mopti	5	11 720	1,4%
Tombouctou	3	9 645	1,2%
Gao	0	-	0,0%
Kidal	1	11 133	1,4%
District Bamako	7	8 824	1,1%
Multirégionaux	20	268 934	32,8%
National	25	247708	30,2%
Total		820 925	

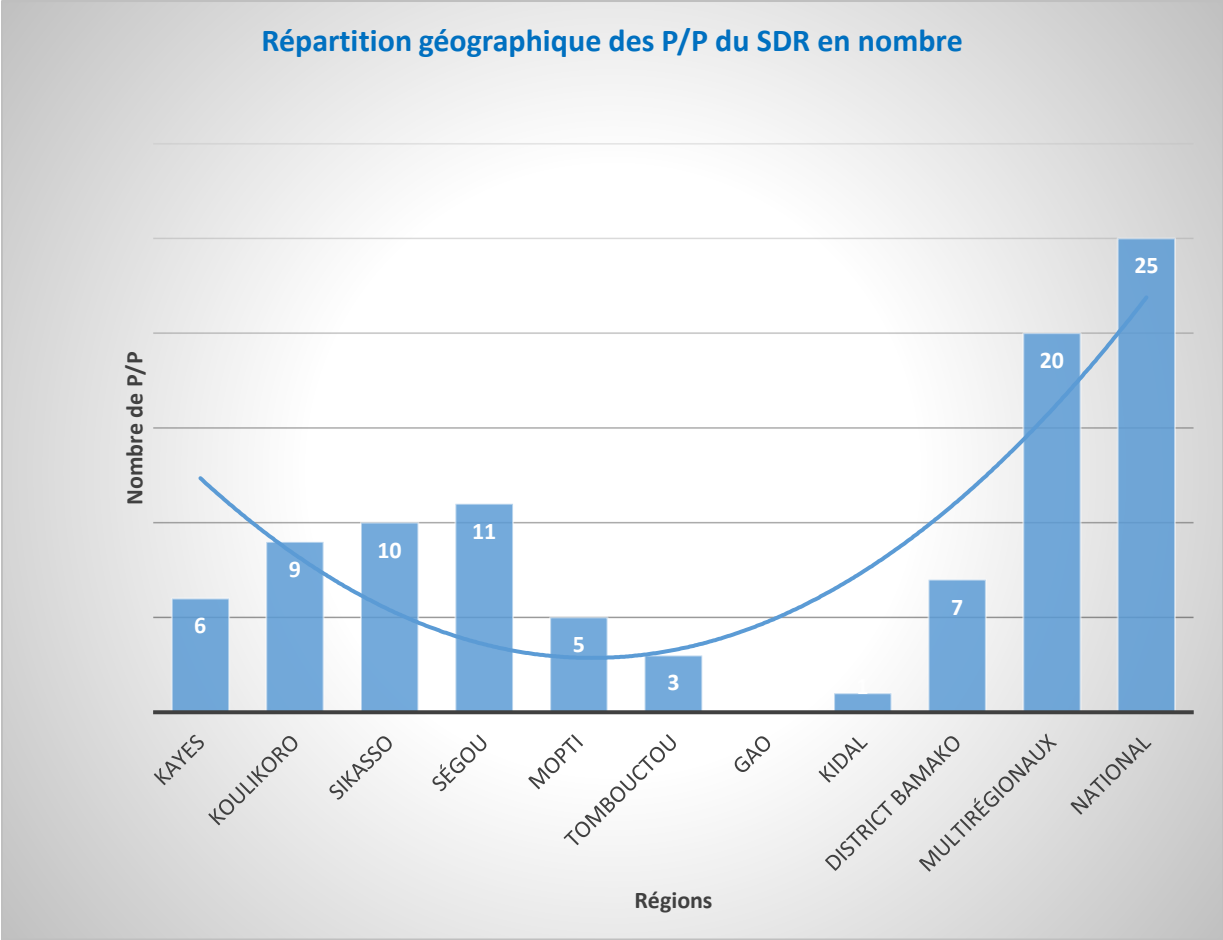


Figure 3 : répartition géographique des P/P

C. 6. La répartition des financements extérieurs par PTF

⇒ *Suivant le Partenaire Technique et Financier - PTF (répartition du financement extérieur)*

Le secteur développement rural est financé par vingt-cinq (25) partenaires techniques et financiers pour un montant total acquis extérieur de **604, 754 milliards** de FCFA. La Banque Africaine de Développement à travers ces différents guichets arrive en tête des partenaires financiers du secteur avec **124,131 milliards** de F CFA, soit un peu plus du quart des financements total acquis du secteur au 31/12/2016 ; elle est suivie de la Banque mondiale et de la Banque islamique.

Le Canada est le premier partenaire bilatéral qui assure le plus de financement du secteur, suivi de la Belgique et de l'Allemagne.

Tableau 7 : Répartition des financements extérieurs acquis au 31/12/2010 par PTF

PTF	Montants Financements	Proportion %	Rang	Type de financement
BAD/FAD/FAT/FEM	124 131	20,5%	1 ^{er}	P+S
IDA/BM/GF	88 500	14,6%	2 ^{ème}	P+S
BID	83 160	13,8%	3 ^{ème}	P
CANADA	53 042	8,8%	4 ^{ème}	S
FIDA	48 147	8,0%	5 ^{ème}	P+S
BOAD	41 177	6,8%	6 ^{ème}	P
UE	33 050	5,5%	7 ^{ème}	S
Belgique (et FBS)	23 695	3,9%	8 ^{ème}	S
Allemagne / KfW / GTZ/BMZ	21 918	3,6%	9 ^{ème}	S
Exim B Corée du Sud	10 400	1,7%	10 ^{ème}	P
France (AFD)	9 839	1,6%	11 ^{ème}	S
DANEMARK	8 559	1,4%	12 ^{ème}	S
NORVEGE	7 647	1,3%	13 ^{ème}	S
FKDEA	7 200	1,2%	15 ^{ème}	P
FSA	7 200	1,2%	15 ^{ème}	P
BIDC-UEMOA	6 925	1,1%	16 ^{ème}	P
BADEA	6 410	1,1%	17 ^{ème}	P
Espagne	6 290	1,0%	18 ^{ème}	S
OPEP	4 900	0,8%	19 ^{ème}	P
INDE	4 500	0,7%	20 ^{ème}	S
PAYS BAS	3 159	0,5%	21 ^{ème}	S
FAO	2 503	0,4%	22 ^{ème}	S
AGRA	442	0,1%	23 ^{ème}	S
SUISSE	380	0,1%	24 ^{ème}	S
SUEDE	483	0,1%	25 ^{ème}	S
Non ventilé	1 097	0,2%		
	604754	100,0%		

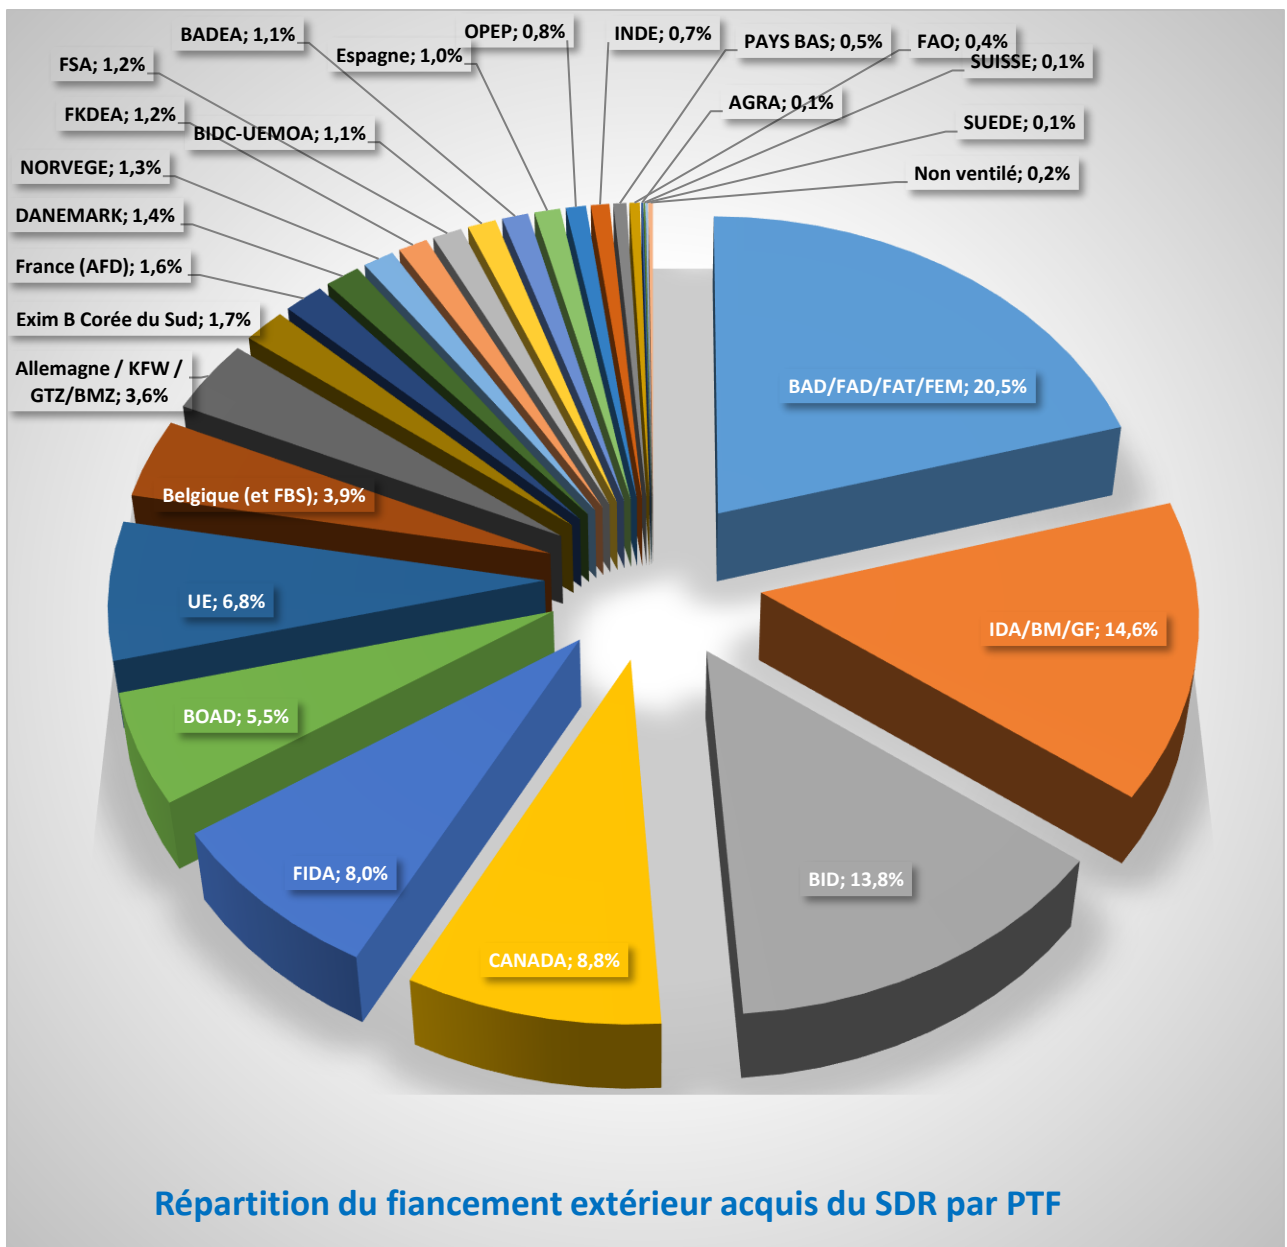


Figure 4: Répartition des financements extérieurs acquis au 31/12/2010 par PTF.

D. PRESENTATION DES PROJETS ET PROGRAMMES



MINISTERE DE L'AGRICULTURE



LISTE DES P/P DU MA

NOM DU PROJET	TUTELLE
PROJETS EN EXECUTION	
<i>Ministère de l'Agriculture</i>	
Initiative Eau et Sécurité Alimentaire (IESA)	MA
Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali (GCP/MLI/033/LDF)	MA
3ème 'Contrat plan Etat-ODRS	MA
4ème 'Contrat plan Etat-ODRS	MA
Adaptation de l'Agriculture et l'Elevage aux changements climatiques au Mali	MA
Amélioration durable de la productivité et de la compétitivité du riz pluvial et de bas-fonds dans la région de Sikasso (CRRA), au Mali	MA
Améliorer la Capacité d'Adaptation et la Résilience face aux Changements Climatiques dans le Secteur Agricole du Mali (GCP/MLI 033/LDF)	MA
Appui à la CPS/SDR	MA
Appui à l'Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)	MA
Appui au programme de Lutte contre le Criquet Pèlerin (APLCP)	MA
Construction/Equipement Inspection de l'Agriculture	MA
Contrat Plan Etat/Office/Producteurs (CP-OHVN)	MA
Contrat Plan Etat-ADRS-Producteurs	MA
Contrat-Plan Etat OPIB	MA
Création de richesse et souveraineté alimentaire dans la région de Sikasso à travers le développement des marchés locaux pour la transformation locale de l'anacarde (CTARS)	MA
Emploi Jeune en milieu rural	MA
Entretien, aménagement infrastructures et vulgarisation ON (Contrat Plan)	MA
Initiative pour le Renforcement de la Résilience par l'Irrigation et la gestion des ressources (IRRIGAR) Koulikoro	MA
Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-IRRIGAR) Composante Sikasso.	MA
Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Composante Koulikoro.	MA
Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Composante Pays Dogon.	MA
Office Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)	MA
Office Riz Mopti (7e Contrat-Plan Etat-ORM)	MA
Office Riz-Ségou (8 ^{ème} Contrat plan)	MA
Progr national des petits barrages et bas-fonds (PNPBBF)	MA
Programme Compétitivité/Diversification Agricole (PCDA)/ Unité Intérimaire de Consolidation des Acquis	MA
Programme d'Appui à la croissance économique et promotion de l'emploi par le secteur privé (PACEPEP)	MA
Programme d'Appui à la Mise en Oeuvre du Contrat Plan office du Niger (PAMOCP-ON)	MA
Programme d'Appui au Contrat Plan Office du Niger (PACOP)	MA
Programme d'Appui aux Filières Agro-Pastorales de la Région de Sikasso (PAFA)	MA
Programme de Développement de l'Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS)	MA
Programme de développement des filieres porteuses	MA
Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) ou (WAAPP Phase II)	MA
Programme de Recensement Général Agricole (RGA)	MA
Programme de transformation Intégrée des zones greniers du Mali/zone Grenier pilote de Sikasso (PIGM/PZPS)	MA
Programme Microfinance Rurale (PMR)	MA
Projet d'Appui à l'Office du Niger (PAON)	MA

Projet Aménagement Hydro Agricole Région de Sikasso (Direction Régionale du Budget)	MA
Projet d'aménagement hydro-agricole du casier de Molodo Nord Phase I (y compris Extension)	MA
Projet d'Appui au Développement de l'Office du Niger (PADON II)	MA
Projet d'Appui au Développement Rural de Tien- Konou-Tamani (PADER-TKT)	MA
Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole des petits Exploitants pour l'Afrique subsaharienne (SAPEP)	MA
Projet d'Appui à la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)	MA
Projet d'Appui à la Restauration du Système Faguibine (PARF)	MA
Projet d'Appui à la Stratégie Nationale de Développement de l'Irrigation (PASNDI) Phase III	MA
Projet d'appui à l'irrigation de proximité dans le delta intérieur du Niger (IPRODI) / Programme Mali-Nord	MA
Projet d'Appui au Développement Durable de Yélimané (PADDY II)	MA
Projet d'Appui au Développement Rural de Soké 1 (PADER-S1)	MA
Projet d'Appui au Sous-Secteur de l'Irrigation de Proximité (PASSIP)	MA
Projet d'Appui aux Organisations Paysannes du Plateau Dogon pour une meilleure valorisation de leurs productions maraîchères	MA
Projet de Développement de la Ferme rizicole de SABE	MA
Projet de Développement Rural Intégré du District de Kita et de ses environs, phase 2 (PDRIK II)	MA
Projet de Renforcement de la Résilience contre l'Insécurité Alimentaire au Mali (PRIA-Mali)	MA
Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de la Région de Koulikoro (PRESAN-KL)	MA
Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des Cultures Irriguées (PRESA-DCI)	MA
Projet de renforcement de résilience au sahel (P2RS)	MA
Projet Renforcement de la gouvernance de la filière Coton dans le cadre de la réforme institutionnelle et d'amélioration de la productivité de la durabilité et d'exploitation en zone cotonnière (PASE II)	MA
Projet Renforcement moyen protection végétaux/ denrées stockées dans la région du Liptako Gourma (PRMPV-LG)	MA
Réhabilitation bureaux CPS/SDR	MA
Réhabilitation du Barrage de Markala	MA
Réhabilitation Equipements Bureaux DAF/MA	MA
Travaux d'Extension de 200 ha de la plaine de Saouné	MA
PROJETS EN DEMARRAGE	
<i>Ministère de l'Agriculture</i>	
Projet de développement rural du Kaarta/Sefeto (PDRK/S)	MA
Construction Voie d'accès Centre Sino malienne	MA
Office du Moyen Bani	MA
Projet d'amélioration du système d'irrigation du périmètre irrigué de Baguineda	MA

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

UNITE INTERIMAIRE DE CONSOLIDATION ET DE GESTION DES ACQUIS DU PROGRAMME DE COMPETITIVITE ET DE DIVERSIFICATION AGRICOLES (UICG/PCDA)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1977

- 1.1. Adresse du projet :** 03 BP 228 Bamako 03 ; Tél : (223) 20 22 11 25/20 22 11 46
Email : pcda@pcda-mali.org Site: www.pcda-mali.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako.
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/agriculture et élevage
- 1.4. Coût total :** 4 348 millions de F CFA
- 1.5. Bailleurs :** GRM
- 1.6. Nature du financement :** Budget national,
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Projet:** 02 ans (du 01/10/2015 au 31/12/2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** la mission de l'unité intérimaire est d'assurer la consolidation des résultats du PCDA ; l'appui à la formulation d'une nouvelle opération (PACAM) et la gestion fiduciaire de la préparation du PRAPS (Programme régional d'appui au pastoralisme au sahel).
Spécifiquement et durant 2016, l'unité intérimaire est chargée de :
- Finaliser la mise en place des systèmes de gestion efficace de l'exploitation des infrastructures à travers des contrats d'affermage ;
 - Renforcer les capacités techniques et de gestion des promoteurs de sous projets ;
 - Assurer le transfert des acquis du PCDA aux différentes structures techniques de l'Etat en vue de leur pérennisation ;
 - Assurer la gestion financière pendant la période de grâce suite à la clôture du projet ;
 - Mettre en œuvre les sous projets financés durant les trois derniers mois d'avant la clôture du projet et ceux en attente de financement ;
 - Contribuer à la préparation d'une nouvelle opération et assurer la gestion fiduciaire de la préparation du PRAPS.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement national :** Procédures nationales.
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion parallèle à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :

- Date de signature de l'accord de prêt N°0000616 : 02 septembre 2015
- Date d'entrée en vigueur : 1^{er} Octobre 2016
- Date 1^{er} décaissement : 1^{er} septembre 2016

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Centres de démonstration, de diffusion et de prestation (CDDP) opérationnels (volet irrigation+ volet transformation)	Nombre	1	3
Référentiels technico-économiques disponibles	Nombre	24	26
Sous-projets (micro entreprises et PME) financés	Nombre	550	664
Pourcentage cumulé de femmes bénéficiaires du FI	Pourcentage	50	40
Producteurs et de transformateurs ayant adoptés les innovations	Nombre	1100	1271
Structures interprofessionnelles créés	Nombre	6	5
Filières appuyées	Nombre	6	6
Accroissement des volumes et valeurs des productions commercialisées /exportés des filières sélectionnées	Taux	10 (Annuel)	40
Bulletins d'informations de marchés disséminés	Nombre	39	22
Fonds de garantie créés et opérationnel	Nombre	1	1
Crédits octroyés aux opérateurs des filières sélectionnées	Millions de F CFA	1100	986
Projets d'investissement privés important générés dans les filières sélectionnées	Nombre	4	4
Infrastructures commerciales réalisées et équipées	Nombre	18	15
Délégation de gestion	Nombre	10	8
Pistes réhabilitées	Km	1101	1101

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PCDA

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2015	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :	4 348	3 308	76,1
Total financement intérieur	4 348	3 308	76,1
Total des financements	4 348	3 308	76,1


2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le PCDA contribue à la réduction de la pauvreté par l'accroissement de la productivité des exploitations agricoles et des unités de transformation. Il facilite l'accès aux marchés des produits agricoles des filières sélectionnées.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

CONSTRUCTION / EQUIPEMENT INSPECTION DE L'AGRICULTURE

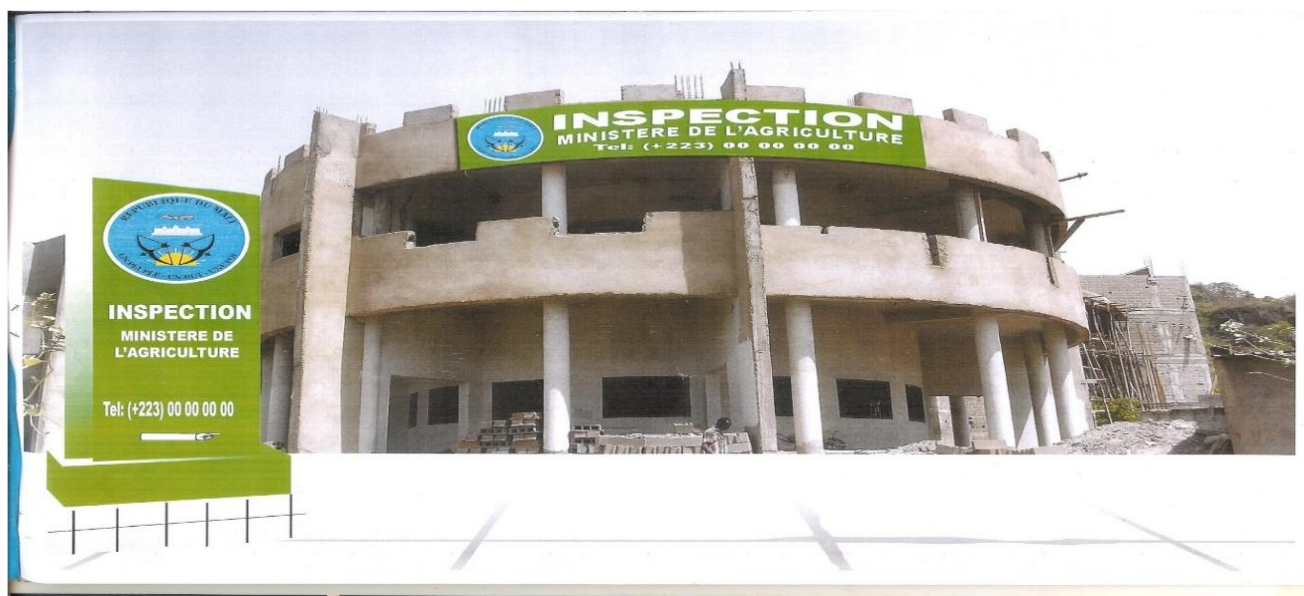

I. DESCRIPTION DU PROJET : RNP 2560

- | | |
|--|---|
| 1.1. Adresse du projet : | Rue : 42 Porte : Magnambougou Faso kanu Tél : 20 20 01 04 |
| 1.2. Zones d'intervention : | Territoire national |
| 1.3. Secteur et Sous-secteur : | Economie rurale/agriculture |
| 1.4. Bailleurs : | GRM |
| 1.5. Coût du projet : | 1 076 millions |
| 1.6. Nature du financement : | Subvention et Budget national |
| 1.7. Modalité d'appui : | Aide projet |
| 1.8. Durée du Projet/Programme : | 8 ans (2011 – 2018) |
| 1.9. Logique d'intervention du projet : | Aide projet |

Le service de l'inspection de l'agriculture est un service central d'envergure nationale qui a pour mission de contrôler le fonctionnement et l'action des services et organisme relevant du département de l'agriculture ; veiller au respect et à l'application des dispositions législatives et réglementaires notamment celles relatives à la gestion administrative, financière et matérielle par les services et organismes de l'Agriculture ; assister les services et le personnel par des conseils de gestion ou d'aide à l'organisation ou par la mise en œuvre des programmes d'information et de formation pouvant contribuer au renforcement de leur capacité et à une gestion saine des services et des deniers publics.

A ce titre, l'inspection de l'Agriculture veille à l'opérationnalisation de la stratégie nationale du contrôle interne et de l'assainissement de la gestion saine des finances publiques à travers les missions de vérification financière, d'audit de performance ou de gestion ou de conformité auprès des services et organismes du département.

1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international : non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : intégré à l'inspection

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Mise en vigueur : juillet 2010
Premier décaissement : janvier 2011

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Construction du siège de l'Inspection agriculture	Unité	1	80%
Equiperment des nouveaux bureaux	Unité	1	

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source : Coordination projet.

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	876	526	60%
Total financement intérieur	876	526	60%
Total des financements	876	526	60%

Commentaires : les travaux tirent vers la fin et l'inscription budgétaire de 2018 destinée à payer la suite des travaux et l'équipement des bureaux clôt définitivement ce projet.

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

En veillant au strict respect des dispositions, en appuyant les services et le personnel par des conseils de gestion ou d'aide à l'organisation ou par la mise en œuvre des programmes d'information et de formation dans le domaine de la gestion administrative, financière et matérielle, l'inspection participe à l'utilisation efficiente des ressources pour les besoins prioritaires des populations contribuant du coup à amplifier l'incidence des projets sur l'amélioration de leur conditions de vie tout en leur préservant des risques liés à la pauvreté.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

REHABILITATION ET EQUIPEMENTS BUREAUX DFM/MA



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2481

- 1.1. Adresse du projet :** Darsalam
Tél : (223) 20 23 33 34 / 20 23 21 57/ BP : 61
- 1.2. Zones d'intervention:** District de Bamako.
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Agriculture
- 1.4. Coût total :** 1 000 000 000 F CFA
- 1.5. Bailleurs :** GRM
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Subvention
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
L'objectif global est de contribuer à la remise en état de certains bâtiments et locaux de la DFM. Cet objectif sera atteint en :
- Renforçant les capacités des agents ;
 - Equipant les bureaux des agents.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédure nationale

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans la Région de Koulikoro (PRESAN-KL)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2807

- 1.1. Adresse du projet :** 97, Rue 186 Cité Unicef Niamakoro Bamako
Tél/fax : 20 20 05 72
Email : presan@presan.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Koulikoro,
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GAFSP, FAD, FSN, et GRM
- 1.5. Coût du projet (CP) :** 27,77 milliards de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** **Extérieur et** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2015-2019)

1.9. Logique d'intervention du projet : il vise à contribuer : (i) à l'allègement de la pauvreté ; (ii) au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro et (iii) à l'accroissement, sur une base durable, de la production des filières rizicoles et horticoles ainsi que des revenus des populations cibles par la maîtrise de l'eau et la valorisation des produits.

Il s'exécutera à travers les trois composantes suivantes:

- (i) le développement des infrastructures,
- (ii) le développement des chaînes de valeur et,
- (iii) la gestion du projet.

Le projet sera exécuté sur six (6) sites répartis dans trois (3) cercles (Kangaba, Kati et Koulikoro) de la région de Koulikoro et à travers six (6) communes. Les 6 communes concernées sont: Kaniogo, Karan, Maramandougou, Mandé, Nyamina et Baguinéda camp. Les sites concernés par les activités du PRESAN-KL sont **Balanzan, Faragué, Figuiratomo, Séguéla, Koursalé et Baguinéda**. Ces différents sites sont situés aussi dans les zones d'encadrement de l'Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) et de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB).

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré par une cellule de Coordination Nationale

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : -de signature : 23 janvier 2014 -de mise en vigueur : 06/10/2014 -du 1^{er} décaissement : 24/04/2015

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 20/03/2017 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Revêtement du canal principal de Baguinéda dans sa partie aval (km)	Km	8,7	8,7
Planage de parcelles à problèmes (ha)	ha	100	100
Réhabilitation des prises des canaux secondaires (nombre)	nbre	52	52
Réhabilitation des évacuateurs de crue (nombre)	nbre	8	8
Réhabilitation des échelles de la prise de Sotuba (nombre)	nbre	1	1
Réhabilitation de la digue route (km)	km	35	35
Remise en état des pièges à jacinthe (nombre)	nbbre	2	2
La réhabilitation de la digue route adjacente au canal primaire	km	35	35

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source CNP.

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	2 423	1 075	44,4%
-PPTE :			
B. Autofinancement :			
C. Autres :(Populations/Collectivités)	67	0	0,0%
Total financement intérieur	2 423	1 075	44,4%
Financement extérieur :			
FAD (prêt)	25 535	5 949	23,3%
FAD (don)	1 617	128	7,9%
Total financement extérieur	27 152	6 077	22,4%
Total des financements	29 575	7152	24,2%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté étant l'objectif supérieur du PRESA/DCI. Il est difficile à cet stade d'apprécier la contribution du PRESA/DCI à la réduction de la pauvreté.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des Cultures Irriguées (PRESA/DCI)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2807

- 1.1. Adresse du projet :** 97, Rue 186 Cité Unicef Niamakoro Bamako
Tél/fax : 20 20 05 72
Email : presa@presan.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Koulikoro, Sikasso et Ségou
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** BAD et GRM
- 1.5. Coût du projet (CP) :** 29,64 milliards de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Extérieur et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2015-2019)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global du projet est de :

Contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté.

Augmenter durablement la production agricole et le revenu des producteurs.

Le PRESA/DCI vise l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base et aux technologies. Les réalisations porteront sur : i) la réhabilitation de 274 ha irrigués par pompage à Farabana et 4.476 ha gravitaires dont 1050 ha à Sélingué et 3426 ha à Molodo, (ii) la création de 176 ha de périmètres irrigués dont 50 ha d'extension à Sélingué et 126 ha par pompage à Kotouba, (iii) curage et calibrage de 223 km de canaux de drainage; (iv) la construction de 20,5 km de digues de protection et 59 km de pistes de desserte, (v) l'entretien et revêtement partiel de 285 km de canaux d'irrigation, (vi) construction et équipement de 2 stations de pompage et 3 stations d'exhaure, et (vii) réalisation d'études complémentaires et d'exécution détaillées et services de contrôle des travaux.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré par une cellule de Coordination Nationale

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Date de signature du projet: 23/01/2014
Date du premier décaissement : 24/04/2015

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 20/03/2017 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Le développement des infrastructures de production de Farabana	ha	274	–
études techniques détaillées des sites de l'ORDS	ff	1	1
Travaux de réhabilitation du Périmètre de Molodo central sur 3426ha	ha	3426	930
Réhabilitation des drains de KIO et de Bounou Boua sur 54,6 km	Km	56,4	30
Le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du périmètre de Molodo et des drains collecteurs de KIO et de Bounou Boua.	ff	1	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source OPIB.

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	2 423	1 075	44,4%
-PPTE :			
B. Autofinancement :			
C. Autres :(Populations/Collectivités)	67	0	0,0%
Total financement intérieur	2 423	1 075	44,4%
Financement extérieur :			
FAD (prêt)	25 535	5 949	23,3%
FAD (don)	1 617	128	7,9%
Total financement extérieur	27 152	6 077	22,4%
Total des financements	29 575	7152	24,2%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté étant l'objectif supérieur du PRESA/DCI. Il est difficile à cet stade d'apprécier la contribution du PRESA/DCI à la réduction de la pauvreté.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

Projet d'Appui à l'Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton dans sa Nouvelle Configuration Institutionnelle et à la Productivité et Durabilité des Systèmes d'Exploitation en Zone Cotonnière (PASE 2)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP : SN

- 1.1. Adresse du projet :** BP : 3299 , Bamako Tél : 20 2108 02 Fax : 20 21 87 37
Email : hama.douare@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Kayes (Kita), Région de Sikasso, Région de Ségou (San, Bla, Baraouli), Koulikoro (Dioïla, Koulikoro, Kati, Kolokani, Kangaba)
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** Agence Française de Développement (AFD), UE et Contribution des bénéficiaires : CMDT/ producteurs, IER/ CIRAD
- 1.5. Coût du projet :** **8, 150 milliards** 14 077millions de FCFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Appui/programme
- 1.8. Durée du projet:** (2012-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
L'objectif global du projet est de contribuer à la pérennisation d'une filière coton organisée et compétitive. Les objectifs spécifiques sont : (i) le renforcement des capacités des producteurs pour les amener à adopter un raisonnement économique dans la conduite de leurs exploitations, (ii) le renforcement des capacités des coopératives afin qu'elles deviennent des partenaires reconnues pour la gestion de la filière, (iii) le renforcement des capacités de l'interprofession coton en vue de rendre opérationnelle la cogestion de la filière.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement extérieur : Procédure du Bailleurs (AFD)**
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion parallèle à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de la convention :	10/04/2009
	Date de mise en vigueur :	16/12/2011
	Date de premier décaissement :	juillet 2013

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Prestataires contractuels (GIE)	Nbre	4	4
Conseillers (GIE)	Nbre	16	19
Producteurs adhérents au CEF	Nbre	2500	2525
Test innovations : chaux, PNT, écimage (nbre sites)	Nbre	6	6
Cultures fourragères (mucuna)	Ha	0	40
Enregistrement conformément à l'acte OHADA			
Confédération des Sociétés coopératives des producteurs de coton (CSCPC)	Nbre	1	1
Fédération Régionale des Sociétés coopératives des producteurs de coton (FR SCPC)	Nbre	4	3
Sociétés coopératives des producteurs de coton (SCPC)	Nbre	1465	7170
Formation des élus et techniciens sur le plan d'affaire des SCPC	Nbre	255	255
Formation des néo	Nbre	720	5479

Commentaires et observations: les innovations techniques et la conduite du CEF ont permis d'améliorer de façon substantielle les performances des exploitations bénéficiaires. L'enregistrement des SCPC conformément à l'acte Uniforme N°9 de l'OHADA se poursuit. Les sessions d'alphabétisation se sont poursuivies malgré la fin de financement EU

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source FODESA

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement PPTE :	5 914	1 396	23,61
Total financement intérieur	5 914	1 396	23,61
Financement extérieur :	8 150	5 439	66,73%
Total financement extérieur	8 150	5 439	66,73%
TOTAL DES FINANCEMENTS	14 064	6 835	48,60%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet contribue à la réduction de la pauvreté à travers la démonstration des innovations techniques, la formation et la conduite des activités CEF auprès des producteurs et productrices, qui améliorent leur productivité et leur capacité décisionnelle à mieux gérer en adoptant un raisonnement économique leurs exploitations.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

CONSTRUCTION VOIE D'ACCES CENTRE SINO-MALIEN

I. DESCRIPTION DU PROJET: 2959

- 1.1. Adresse du projet :** Rue Mohamed V, BP : 258 Bko Tél : 20 22 26 06 / 20 23 19 05
Fax : 20 22 37 75 Email : direction@ier.gouv.ml
- 1.2. Zone d'intervention :** Koulikoro / Kati / Commune de Baguineda
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 400 millions
- 1.6. Nature du financement :** BSI
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du projet:** 2 ans (2017-2018)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
Le projet a pour objectif d'améliorer l'accessibilité au centre de recherche ; le but du centre est de contribuer à l'augmentation de la production céréalière et le niveau de sécurité alimentaire au Mali à travers des démonstrations, la vulgarisation des technologies avancées et la formation du personnel.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international: N/A**
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion intégrée à l'IER

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1. Dates :** Date de signature de l'accord : juillet 2016
Date de mise en vigueur : janvier 2017
Date de premier décaissement : 2017

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Piste d'accès	km	3,1	0

Commentaires et observations: Le dossier d'appel d'offres pour le recrutement du bureau de contrôle est en cours.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 :source IER

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Montant des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement PPTTE :	400	0	0
Total financement intérieur	400	0	0
TOTAL DES FINANCEMENTS	400	0	0

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Augmenter les revenus des producteurs par la création de variétés à haut rendement et résistantes aux ravageurs. La culture et la transformation du coton et du jute vont créer des emplois pour les agriculteurs et les travailleurs locaux.

Ministère de l'Agriculture

SECRETARIAT GENERAL

PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE (SAPEP)



I. DESCRIPTION DU PROJET : RNP 2765

- 1.1. Adresse du projet :** Niamakoro, cité Unicef, Rue : 107, Porte : 65, Tel. 00 223 20 20 10 80 / 00 223 20 20 11 14 / Email : sapepmali@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention :** Régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / agriculture
- 1.4. Bailleurs :** BID et GRM
- 1.5. Coût total :** 7 870 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Prêt
- 1.7. Modalité d'appui :** Procédures du bailleur
- 1.8. Durée du Projet :** 5 ans (2013 - 2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

Augmenter la productivité des systèmes de production agricole pluviale et irriguée des petits exploitants.

Les objectifs spécifiques permettent d'améliorer la productivité des systèmes de production agricole pluviale et irriguée des petits exploitants à travers :

- L'amélioration de la fertilité des sols et la gestion des cultures ;
- L'accessibilité et la disponibilité des intrants (semences, engrais) ;
- La facilitation de l'accès des petits producteurs au marché et au financement.

Les groupes cibles du projet sont les familles paysannes (80 000), les chercheurs, agents de vulgarisation, les transformateurs, agro dealers et consommateurs.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de la signature :	29/08/2012
	Date de mise en vigueur :	27/02/2013
	Date de décaissement :	04/08/2013

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

SPECIFICATION/DESIGNATION	Unité	Niveau cible du projet	Réalisations Cumul au 31/12/2016
Essai de fertilisation aux champs	Nbre	5	4
Matériels d'impression, affiches, posters	Nbre	4	-
Création d'une base de données sur les engrais	Nbre	2	-
Démonstration au Champs de GIFS	Nbre	2	3
Semoirs à traction animale	Nbre	2	2
Aménagement des terres	Nbre	2	
3. Equipement et Construction laboratoire SEP			
Création de nouvelles variétés	Nbre	5	3
Criblage de HYV et d'OPVs	Nbre	4	3
Développement d'un cadre de biosécurité pour les semences	Nbre	1	1
Production de semences certifiées	Nbre	2	3

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source SAPEP

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement :	600	265	44,23
Total financement intérieur	600	265	44,23
Financement extérieur :			
	7 270	2 041	28,07
Total financement extérieur	7 270	2 041	28,07
TOTAL DES FINANCEMENTS	7 870	2 306	29,31

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le SAPEP est un projet qui vise à améliorer les conditions de vies des petits producteurs (vulnérables) en ciblant les principales cultures céréalières (mil, riz, sorgho et maïs).

Outre l'amélioration des rendements des cultures et la satisfaction des besoins alimentaires des populations, les actions combinées de la micro-dose, des aménagements, de l'utilisation des semences et des engrais de qualités couplées aux formations contribueront à la préservation de l'environnement.

L'accès au marché pour les petits producteurs à travers le warrantage, l'octroi de crédit et la formation des producteurs doivent contribuer à l'amélioration de la production et de la productivité agricoles. Ce faisant, le SAPEP contribue effectivement à l'amélioration du PIBA, à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté qui sont des objectifs majeurs du Gouvernement malien.

Ministère de l'Agriculture

SECRETARIAT GENERAL

PROGRAMME DE TRANSFORMATION INTEGREE DES ZONES GRENIERS DU MALI (PTI-ZGM)

I. DESCRIPTION DU PROJET : RNP 2685

- 1.1. Adresse du projet :** Faladié sema, avenue de l'OUA
Email : aseymaiga@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention :** Région de Sikasso
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ agriculture
- 1.4. Bailleur :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 292 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget d'état
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI
- 1.8. Durée du Projet :** 9 ans (2011-2020)

1.9. Logique d'intervention du projet :

La stratégie d'intervention du programme repose sur le développement de l'offre et le support à la demande centré sur un contrat entre le Programme-Etat-Banque Partenaire; l'identification des agrégateurs, la contractualisation et l'appui de l'Etat; la triangulation Banque-Agrégateurs-Agriculteurs-Agriculteurs avec l'intermédiation des agrégateurs; la mise en place d'un fonds de garantie céréales (Fonds National de Garantie, Fonds complémentaire pour le programme); l'offre de produits de financement standards adaptés à des taux réduits (entre 6% et 12%).

Au titre des investissements le projet facilitera l'acquisition de magasins de stockage, d'équipements agricoles de production et de récolte, d'équipement/Unités de transformation, des moyen de distribution/logistique; Le projet appuiera en outre le volet crédits à court terme (intrants, stockage), le renforcement du réseau de distribution bancaire (information, communication) notamment à travers les Centres de services intégrés.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l'Administration.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : source Unité de gestion de projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	umul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement	383	361	94
Total financement intérieur	383	361	94
TOTAL DES FINANCEMENTS	383	361	94

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le programme prévoit de contribuer à aider les petits agriculteurs à augmenter significativement et de façon durable la productivité agricole au Mali. Le programme a pour ambition d'augmenter la production céréalière de plus de 60% soit de 1 million de tonne à 1,65 millions de tonnes.

Ministère de l'Agriculture

SECRETARIAT GENERAL

PROGRAMME DE MICROFINANCE RURALE (PMR)



I. DESCRIPTION DU PROJET : RNP 2606

- 1.1. Adresse du projet :** Magnambougou, Faso kanu, Rue : 30, Porte : 76, Tel. 00 223 20 20 73 91/
Fax : 00 223 20 20 73 94/ Email : ucg.pmr@afribonemali.net
- 1.2. Zones d'intervention :** Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** FIDA, CANADA et GRM
- 1.5. Coût total :** 18 737 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Prêt/Don
- 1.7. Modalité d'appui :** Procédures du bailleur
- 1.8. Durée du Projet :** 8 ans (2010 - 2018)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
Contribuer à l'accès durable des ruraux pauvres à des services financiers répondant à leurs besoins de développement socio-économiques à travers les renforcements de capacités des groupes démunis de femmes et de jeunes, l'éducation financières, etc. par des ONG et la facilitation de leur accès aux crédits par la mise en contact avec les SFD restructurés. Il s'agit pour le PMR de promouvoir des mécanismes et de produits financiers adaptés et de renforcer la capacité d'intervention durable des SFD à travers (1) la facilitation de l'accès des ruraux aux services financiers et (2) l'appui à la viabilité des SFD
La stratégie de mise en œuvre est basé au niveau macro sur (1) un ancrage constant aux orientations des politiques publiques de microfinance (stratégie et politique nationale)
Au niveau méso par (1) une implication soutenue et une recherche permanente de la cohérence de ses interventions avec celles de la faitière nationale des SFD
Au niveau micro, promouvoir le faire-faire par une Unité légère de Gestion du Projet à effectif léger et un mécanisme de coordination, de supervision, de suivi de proximité porté par des Cabinets privés et une exécution de l'accompagnement des groupes démunis portés par des ONG nationales
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Procédures du bailleur
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de coordination et de gestion (UCG)

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de la signature :	25/03/2009
	Date de mise en vigueur :	21/07/2010
	Date de décaissement :	03/2011

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

SPECIFICATION/DESIGNATION	Unité	Niveau cible du projet	Cumul Réalisations au 31/12/2016
Personnes ayant bénéficié des services du projet	Nbre	315 000 (126 000H 189 000F)	1 378 437
Ménages ayant bénéficié des services du projet	Nbre	31 500 (3 500H 830F)	137 843
Groupes d'épargne et de crédit créés/consolidés	Nbre	3 500	7 135
Membres des groupes d'épargne et de crédit créés/consolidés	Nbre	105 000 (57 750 H / 47 250F)	214 050
Groupes d'épargne et de crédit comptant des femmes dans leurs instances de direction	Nbre	1 750 (H / F)	3 924
Épargnants volontaires	Nbre	189 000 (75 600H / 113 400F)	827 062
Valeur de l'épargne volontaire	USD	5 000 000	25 766 530
Emprunteurs actifs	Nbre	315 000 (126 000H /189 000F)	964 906
Valeur brute du portefeuille de prêts	USD	19 646 365	82 620 711

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : source UGP/PMR

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement	415	211	51
Total financement intérieur	415	211	51
Financement extérieur :	18 322	10 883	59
Total financement extérieur	18 322	10 883	59
TOTAL DES FINANCEMENTS	18 737	11 094	59

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Par rapport à la contribution du Programme au financement de l'économie agricole et rurale, les appuis conjugués du Programme et de ses 15 SFD partenaires à l'échelle de la zone d'intervention ont permis d'atteindre un encours de crédit de l'ordre de 44 350 660 307 FCFA au 31 décembre 20156 dont plus de 9 milliards pour les SFD de première génération (CVECA-ON-Ségou, FANTANJIGIFA-SO, CAECE-JIGISEME et NYETA MUSOW). Ce volume d'encours de plus 9 milliards de FCFA représente plus de 200% de l'encours attendu à la fin du cycle du Programme (4 milliards) au titre des 4 SFD de première génération de partenariat (CVECA-ON-Ségou, FANTANJIGIFASO NYETA MUSOW, CAECE-JIGISEME). Cette performance de ces SFD de première génération, est essentiellement due au FCIP (Fonds de Crédit Institutionnel Partagé) dont l'effet de levier a produit près de 4 milliards d'encours.

Ministère de l'Agriculture

SECRETARIAT GENERAL

PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2917

- 1.1. Adresse du projet :** Magnambougou Faso kanu, Rue 67 Porte 96, BP 2878
Tél : 00 223 20 20 03 88- Email : dmaiga1955@gmail.com
- 1.2. Zones d'intervention:** Régions de Kayes, Koulikoro et Ségou
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/agriculture
- 1.4. Bailleurs :** BAD, GRM et bénéficiaires
- 1.5. Coût du projet :** 31 940 millions de F CFA, signé le 12/12/2014
- 1.6. Nature des financements:** Prêts et Don (mis en vigueur Don le 12/12/2014, Prêt 1/04/2015)
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2015 - 2019), premier décaissement 23/10/2015
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** le P2RS a pour objectif global de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel ainsi qu'à une croissance inclusive en vue de l'élargissement des opportunités économiques pour les femmes et les jeunes. Son objectif spécifique est d'accroître sur une base durable, la productivité, les productions agro-sylvo- pastorales et halieutiques au Sahel.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Procédures des bailleurs
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Cellule d'Exécution du projet
- 2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 2016 (en millions de F CFA) :** source P2RS

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :	4 140	200	4,83
C. Autres :(Populations/Collectivités)	650	0	0
Total financement intérieur	4 790	200	4,18
Financement extérieur :			
-Bailleur n°1 : BAD**	27 154	638	2,35
Total financement extérieur	27 154	638	2,35
Total des financements	31 944	838	2,62

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Les actions du P2RS contribueront à améliorer la productivité et le revenu des producteurs.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

PROJET INITIATIVE EAU ET SECURITE ALIMENTAIRE (IESA)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2457

- 1.1. Adresse du projet :** FAO Bamako, BP 1820; Tél: 20 22 37 13; Fax: 20 22 36 46
Email : FAO-MLI@field.fao.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Régions de Kayes, Koulikoro, Mopti et Gao.
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/agriculture.
- 1.4. Bailleurs** Venezuela, Royaume d'Espagne et GRM.
- 1.5. Coût total :** 3 916 millions de F CFA.
- 1.6. Nature du financement :** Subvention et Budget national.
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme.
- 1.8. Durée du Projet:** 7 ans (2007-2014). ;
- 1.9. Logique d'intervention :**

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Sécurité alimentaire et faisant partie intégrante du Programme Nationale de Sécurité alimentaire (PNSA), ce programme vise à améliorer la sécurité alimentaire des populations dans les communes les plus vulnérables des régions de Kayes, Koulikoro, Mopti et Gao. Il s'appuie pour sa mise en œuvre sur la participation active des producteurs, l'appui technique des services déconcentrés de la DNGR et de la DNA.

- 1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international:** Procédures de la FAO.
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion parallèle à l'administration.
- 2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016:** source Coordination projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	142	92	65
Total financement intérieur	142	92	65
Financement extérieur :			
- ESPAGNE	462	329	71
Total financement extérieur	462	329	71
TOTAL DES FINANCEMENTS	604	421	68

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet contribue à la réduction de la pauvreté à travers la disponibilité d'une alimentation diversifiée et une amélioration de la résilience des ménages aux périodes de pénurie alimentaire grâce à l'augmentation des revenus les conditions de vie des populations bénéficiaires.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

PROJET ADAPTATION DE L'AGRICULTURE ET L'ELEVAGE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MALI (ACC)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2709

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Adresse du projet : | Hamdallaye ACI 2000, derrière le monument l'Obélisque |
| 1.2. Zones d'intervention: | Régions de Koulikoro, Ségou, Mopti Tombouctou et Kidal |
| 1.3. Secteur et Sous-secteur : | Economie rurale / agriculture et élevage |
| 1.4. Bailleurs : | NORAGRI |
| 1.5. Coût total : | 5 194 millions de F CFA |
| 1.6. Nature du financement : | Subvention |
| 1.7. Modalité d'appui : | Procédures du bailleur |
| 1.8. Durée du Projet: | 7 ans (2011 - 2017) |

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le projet adaptation de l'Agriculture et l'Elevage au Changement Climatique au Mali (ACC) vise les objectifs suivants : développer des systèmes d'agriculture adaptés au changement climatique ; développer des systèmes agro-pastoraux de production basés sur le dromadaire contribuant au développement économique et social du Nord ; développer des systèmes durables de culture de décrue pour une sécurité alimentaire dans les régions du Nord du Mali ; développer de techniques durables de fixation de berges des canaux désensablés dans le système Faguibine; renforcer la capacité des producteurs, des agents de vulgarisation et des chercheurs aux techniques d'adaptation au changement climatique; établir des centres régionaux de recherche agronomique pour Kidal et Tombouctou (zone du lac Faguibine); améliorer les connaissances sur l'adaptation de l'agriculture et l'élevage au changement climatique; Assurer la formation des chercheurs (doctorat et DEA).

Les composante sont : (i) le développement d'options techniques pour l'adaptation au changement climatique ; (ii) le développement de la filière lait du dromadaire dans la région de Kidal, (iii) la production durable des cultures en systèmes de décrue pour une sécurité alimentaire dans les régions nord du Mali, (iv) la fixation des berges des canaux désensablés dans le système Faguibine (Tombouctou) et (v) gestion et suivi-évaluation

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur et du Mali

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion autonome

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Signature :	décembre 2010 ;
	Mise en vigueur :	18 novembre 2011;
	1 ^{er} décaissement :	18 avril 2011

2.2. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source ACC

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	1 500	156	10
Total financement intérieur	1 500	156	10
Financement extérieur : NORAGRI	3 694	2 873	78
Total financement extérieur	3 694	2 873	78
Total des financements	5 194	3 029	58

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet contribue à la sécurisation de la base de production de l'économie locale en favorisant sont adaptation au contexte actuel de changement climatique.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE AU MALI (PRIA-MALI)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN

- | | |
|---|---|
| 1.1. Adresse du projet : | Hamdallaye ACI 2000, derrière le monument l'Obélisque |
| 1.2. Zones d'intervention: | Régions de Sikasso, Ségou Mopti Tombouctou, Taoudéni, Gao, Ménaka, et Kidal |
| 1.3. Secteur et Sous-secteur : | Economie rurale / agriculture et élevage |
| 1.4. Bailleurs : | BID, ITFC, GRM |
| 1.5. Coût total : | 24 945 millions de F CFA |
| 1.6. Nature du financement : | Prêt |
| 1.7. Modalité d'appui : | Procédures du bailleur |
| 1.8. Durée du Projet: | 5 ans (2015 - 2019) |
| 1.9. Logique d'intervention du projet : | |

L'objectif sectoriel du PRIA-MALI, s'inscrit dans les objectifs prioritaires du Gouvernement malien et vise à renforcer la résilience des agriculteurs, pasteurs, pêcheurs face au changement climatique afin de contribuer à la réduction significative de la pauvreté en réalisant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones arides et semi arides du Mali.

Le Projet vise à minimiser les impacts des sécheresses et de la famine qui dévastent les populations et qui entravent les progrès économiques et sociaux émanant d'une décennie de croissance économique positive. Plus particulièrement, il contribuera à (i) assier les bases d'un mécanisme de financement durable pour le règlement des déficits alimentaires et fourragers ; (ii) protéger les moyens de subsistance des ménages les plus vulnérables, et renforcer la résilience des pasteurs, agriculteurs, agropasteurs et pêcheurs ; (iii) développer les infrastructures et équipements de post récolte, de stockage et de collecte des eaux de pluies ; (iv) renforcer le mécanisme régional de prévision, de gestion et de prévention des crises alimentaires et nutritionnelles et enfin (v) contribuer à la mise en place d'une stratégie régionale à travers le développement d'infrastructures de stockage et de conservation.

- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur et du Mali

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion autonome

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Signature :	30 mai 2013 ;
	Mise en vigueur :	10 juillet 2014 ;
	1 ^{er} décaissement :	19 février 2015

1.11. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PRIA

Spécification/Désignation	Unité	Niveau cible du projet	Réalisations Cumul au 31/12/2016
1-Acquisition de 26 000 tonnes de riz	Tonne	26 000	
2- Acquisition de 9 500 tonnes d'aliment bétail	Tonne	9 500	26 366
3. Achat de 5 000 petits ruminants	Tête	5 000	10 000
4. Achat de 900 chameaux	Tête	900	0
5. Achat de 3 million d'alevins	Alevins	3 000 000	0
6. Achat de produits vétérinaires	FF		1 000 000
10. Construction d'1 magasin de stockage de 500T	U	01	
11. construction de (40) banques d'aliment bétail	U	40	
12. Aménagement de(40) mares	U	40	
13. Aménagement de 1000 ha de Bas-fonds	ha	1 000	
14. aménagement de 50 ha de périmètre maraicher	ha	50	

2.2. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PRIA

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	1 815	151	8
Total financement intérieur	1 815	151	8
Financement extérieur :			
IDA	23 130	10 461	45
Total financement extérieur	23 130	10 461	45
Total des financements	24 945	10 612	43

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet a permis la reconstitution du cheptel (395 ménages vulnérables, soit environ 2 765 bénéficiaires directs, ont reçu 10 têtes de caprins chacun, dans les régions de Tombouctou et Gao et de Kidal ; 90 ménages vulnérables, soit 630 bénéficiaires directs, ont reçu 05 têtes de camélins chacun, dans la région de Kidal) le renforcement du potentiel piscicole à travers des opérations d'empoissonnement (environ 9 035 personnes ont bénéficié en 2016 de l'opération d'empoissonnement de 33 sites (80 hectares) avec un (01) million d'alevins dans les villages vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou et Gao) et l'accès des population aux semences (environ 65 526 personnes ont bénéficié en 2016 de la distribution de semences composées de diverses variétés pour ensemercer 920 hectares de superficies dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal) toutes choses de nature à améliorer la sécurité alimentaire et réduire l'impact de la pauvreté.

Ministère de l'Agriculture

Cellule de Planification et de Statistique

APPUI A LA CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE

CELLULE DE PLANIFICATION
ET DE STATISTIQUE DU
SECTEUR DEVELOPPEMENT
RURAL



- MINISTERE DE L'AGRICULTURE
- MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
- COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1427 / 2380 APPUI CPS

- 1.1. Adresse du projet :** BP 2357, Bamako
Tél : 20 21 44 99 / 20 21 72 20 ; Fax : 221 59 20
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût total :** 952 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.6. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.7. Durée du Projet:** 21 ans (1996-2017)
- 1.8. Logique d'intervention du projet :**

Cet appui a pour objectif de contribuer au renforcement de ses missions, (i) de suivi et d'évaluation des projets et programmes du secteur, (ii) de programmation budgétaire pour la réalisation des investissements publics (iii) de planification et d'évaluation des plans, programmes et projets de développement, tout en veillant à leur cohérence intra sectorielle et spatiale.

1.9. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.10. Type d'unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par la structure)

1.11. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source CPS/SDR

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur : Budget national : - Equipement – investissement PPTE :	953	793	83
Total financement intérieur	953	793	83

1.12. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'appui CPS n'est pas un projet structurant. Il s'inscrit dans l'accompagnement de la CPS dans l'exécution de ses missions et dans le cadre global du suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté. Les réalisations ont porté sur le renforcement des capacités des unités de la CPS/SDR, des services du développement rural, achats de matériels et équipements.

Ministère de l'Agriculture

Cellule de Planification et de Statistique

REHABILITATION BUREAU CPS



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2753

- 1.1. Adresse du projet :** BP 2357, Bko Tél : 20 21 44 99 / 20 21 72 20 ; Fax : 221 59 20
- 1.2. Zones d'intervention:** territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût total :** 925 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.6. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.7. Durée du Projet:** 3 ans (2014-2016)

1.8. Logique d'intervention du projet :

Cet appui a pour objectif de contribuer à améliorer le cadre de travail du personnel de la CPS en mettant à leur disposition un espace adapté offrant les commodités nécessaire pour la performance dans la réalisation de sa mission.

Il s'agit de la construction d'un nouveau bâtiment R+4 dans la cour de la CPS.

1.9. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.10. Type d'unité de gestion de projet : Non applicable

1.11. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source CPS/SDR

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	925	606	65,5%
Total financement intérieur	925	605,9	65,5%
Total des financements	925	605,9	65,5%

1.12. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'appui CPS n'est pas un projet structurant. Il s'inscrit dans l'accompagnement de la CPS dans l'exécution de ses missions et dans le cadre global du suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté.

Ministère de l'Agriculture

Cellule de Planification et de Statistique

Appui à l'Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)

CELLULE DE PLANIFICATION
ET DE STATISTIQUE DU
SECTEUR DEVELOPPEMENT
RURAL



- MINISTERE DE L'AGRICULTURE
- MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
- COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2571 APPUI CPS

- 1.1. Adresse du projet :** BP 2357, Bamako
Tél : 20 21 44 99 / 20 21 72 20 ; Fax : 221 59 20
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût total :** 2480 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.6. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.7. Durée du Projet:** 8 ans (2011-2017)
- 1.8. Logique d'intervention du projet :**

Cet appui a pour objectif de contribuer au fonctionnement de la CPS du Secteur du Développement rural. Plus spécifiquement il vise au renforcement de ses missions (i) de suivi statistique, en assurant la disponibilité de l'information statistique au niveau du secteur.

1.9. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.10. Type d'unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par la structure)

1.11. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source CPS/SDR

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur : Budget national : - Equipement – investissement PPTE :	2 480	1 595	64,3%
Total financement intérieur	2 480	1 595	64,3%

1.12. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'appui CPS n'est pas un projet structurant. Il s'inscrit dans l'accompagnement de la CPS dans l'exécution de ses missions et dans le cadre global du suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté. Les réalisations ont porté sur le renforcement des capacités des unités de la CPS/SDR, des services du développement rural, achats de matériels et équipements.

Ministère de l'Agriculture

Cellule de Planification et de Statistique

PROGRAMME DE RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE (RGA)

CELLULE DE PLANIFICATION
ET DE STATISTIQUE DU
SECTEUR DEVELOPPEMENT
RURAL



- MINISTERE DE L'AGRICULTURE
- MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
- COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2849 RGA

- 1.1. Adresse du projet :** BP 2357, Bamako
Tél : 20 21 44 99 / 20 21 72 20 ; Fax : 221 59 20
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM/Bailleur
- 1.5. Coût total :** 10 500 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2015-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

Cet appui a pour objectif de contribuer au fonctionnement de la CPS du Secteur du Développement rural. Plus spécifiquement il vise au renforcement de ses missions (i) de suivi statistique, en assurant la disponibilité de l'information statistique au niveau du secteur.

1.9. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.10. Type d'unité de gestion de projet : Non applicable (projet géré directement par la structure)

1.11. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source CPS/SDR

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	1 496	995	67
Total financement intérieur	1 496	995	67
Total des financements	1 496	995	67

1.12. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'appui CPS n'est pas un projet structurant. Il s'inscrit dans l'accompagnement de la CPS dans l'exécution de ses missions et dans le cadre global du suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté. Les réalisations ont porté sur la conception des outils méthodologiques pour la servir de support aux opérations de collecte, de traitement et d'analyse des données, l'achat de matériels et équipements.

Ministère de l'Agriculture

Cellule de Planification et de Statistique

PROGRAMME D'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE AU MALI (PAPAM)



I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP

- 1.1. Adresse du projet :** BP 2357, Bko Tél : 20 21 44 99/20 21 72 20 ; Fax : 20 21 48 07
- 1.2. Zones d'intervention:** Bassins (4) de production dans tout le pays
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** IDA, FEM, FIDA et GRM
- 1.5. Coût total :** 60 000 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Prêt et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 8 ans (2011-2018)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif de développement du projet (PDO) est d'accroître la productivité des petits producteurs et des producteurs en agrobusiness dans les systèmes et zones de production cibles du projet. L'objectif environnemental global (GEO) est d'accroître l'utilisation des pratiques de gestion durable de la terre et de l'eau (GDTE) dans les systèmes et zones de production cible du projet.

Les composantes du projet sont :

- A. Transfer de technologies et prestation de services aux producteurs agricoles
- Modernisation des systèmes de production et des filières ;
 - Renforcement des capacités des organisations de producteurs et des prestataires de services ;
 - Facilitation du crédit rural ;
 - Génération de transfert de technologie-renforcement des liens entre la recherche la vulgarisation et les producteurs.
 - Infrastructures d'irrigation : petite irrigation et irrigation à grande échelle.
- B. Approche programmatique, compréhensive et suivi sectoriel
- Activités régaliennes des services techniques ;
 - Coordination et suivi/évaluation du projet.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature du crédit IDA :	19/06/2010
	Date de mise en vigueur du crédit IDA :	17/12/2010
	Date de premier décaissement :	Mars 2011

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016:

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Financement des sous projets	Nbre	NC	47
Acquisition de semences fourragères	Tonne	NC	33
Formation des élus sur les outils d'analyse de sous proje	Nbre	NC	172
Aménagements du périmètre de Sabalibougou	Ha	NC	1 674
Construction des habitations et infrastructures sociales	Nbre	NC	NC
Mise en place de comité consultatif de réinstallation	Nbre	NC	NC
Réalisation Enquête Agricole de Conjoncture	Nbre	NC	NC
Extension superficielle rizicole en zone Office du Niger	Ha	NC	NC

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PAPAM

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
Equipement-Investissement	11 850	0	0
Total financement intérieur	11 850	0	0
B. Financement extérieur :			
IDA, FIDA, FEM	60 100	37 748	64
Total financement extérieur	60 100	37 748	64
TOTAL DES FINANCEMENTS	77 000	37 748	64

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le projet PAPAM contribue à la réduction de la pauvreté par : (i) l'aménagement et l'extension des superficies rizicoles en zone Office du Niger (1 674 Ha) ; (ii) la diffusion de techniques améliorées de production du niébé, du riz et de l'insémination artificielle ; (iii) la diffusion de techniques améliorées sur la gestion durable des terres ; (iv) la réalisation d'infrastructures sociales et sanitaires au profit des populations déplacées.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE (PDI-BS)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2480

- 1.1. Adresse du projet :** BP 271, Bamako, Niamakoro cité Unicef
Tél : 20 20 04 86 : 20 20 04 87 Fax : 20 20 04 85
Email : pdi-bs@pdi-bs.org / www.pdi-bs.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Régions de Koulikoro, de Ségou et Mopti
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/agriculture
- 1.4. Bailleurs :** BAD, BADEA, BID, BIDC, Eximbank Corée du Sud, FSD, FKDEA, Fonds de l'OPEP et GRM
- 1.5. Coût du projet :** 115 068 millions de F CFA
- 1.6. Nature des financements:** Prêts/ Istisna'a et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 10 ans (2010 - 2020)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le PDI-BS couvre trois zones : le bassin du Sankarani à Sélingué (encadrée par l'ODRS), le bassin du Bani à Bla et la zone de Djenné (encadrée par l'ORM). Dans chaque zone il y a une unité de coordination et de gestion qui travaille en étroite collaboration avec les structures locales du Développement Rural à travers les conventions. La Coordination nationale est basée à Bamako sous la tutelle de la DNGR. Le Projet a pour objectif sectoriel de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Son objectif spécifique est de contribuer de façon durable à l'augmentation de la production rizicole et des productions agro- sylvo- pastorales et piscicoles.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures des bailleurs

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de coordination

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Date de mise en vigueur du financement BAD : 18/11/2009

2.2. Principales réalisations physiques :

SPECIFICATION/DESIGNATION	Unité	Niveau cible du projet	Réalizations Cumul au 31/12/2016
COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION			
Construction du seuil de Djenné (Génie civil, Pont route, Equipements Hydromécanique)	%	100	0
Aménagement du casier de Djenné	Ha	5670	5670
Aménagement périmètre à maîtrise totale de Sarantomo	ha	984	700
Travaux du seuil de Kourouba	%	100	13%
Travaux de consolidation du périmètre de Maninkoura	ha	915	0
Travaux de consolidation des pistes de Maninkoura	km	68	0
Travaux d'extension des plaines du Moyen Bani			
Equipements des groupements de riziculteurs	u	40	15
Acquisition et installation de cages flottantes pour les jeunes	u	6	06
Aménagement de mares piscicoles	u	460	0
Réinstallation des populations	u	1	1
Batteuses	u	15	0

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PDI-BS

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :	11 938	7 712	65
A. Budget National :			
- Equipement -investissement			
Total financement intérieur	11 938	7 712	65
Financement extérieur :			47
BAD,	33 600	16 262	
- Bailleur n°2 BID Ordinaire	5 430	3 859	
- Bailleur n°3 BID Istisna'a	14 490	9 698	
- Bailleur n°4 BADEA	4 910	4 938	
- Bailleur n°5 FKDEA	7 200	7 198	
- Bailleur n°6 F/OPEP	4 900	0	
- Bailleur n°7 FSD	7 200	0	
- Bailleur n°8 B IDC	5 000	2 191	
- Bailleur n°9 BOAD	10 000	0	
Bailleur n°10 Eximbank Corée	10 400	4 471	
Total financement extérieur	103 130	48 617	47
Total des financements	115 068	56 329	49

Commentaires et observations : sur l'ensemble des bailleurs, il n'y a pas eu de décaissement au niveau de trois bailleurs (FSD, F/OPEP, BOAD) pour lesquels les processus d'acquisition ne sont pas achevés.

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le programme contribue à la réduction de la pauvreté par la création d'emplois au niveau des différents chantiers (825 à Djenné et 739 à Kourouba). Aussi, les entreprises locales ont bénéficié de marchés d'un montant total de 284 423 961 F CFA. Le projet participe à l'amélioration de la sécurité alimentaire avec une incidence sur la production de poisson et l'amélioration du revenu des pisciculteurs. Le programme à travers l'extension de la superficie exploitée améliore la production, la productivité et le revenu des producteurs.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

PROGRAMME NATIONAL DES PETITS BARRAGES ET BAS-FONDS (PNPBBF)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1983

- 1.1. Adresse du projet :** BP 155 et 275 Bamako-Sogoniko (Cité des coopérants)
Tél : (00223) 20 20 97 49
Email : minta_mama@yahoo.fr ; dngr@afribonemali.net
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM et Don Japon (KRII)
- 1.5. Coût du projet :** 10 949 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Don et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** financement national et don
- 1.8. Durée du Projet/Programme:** 13 ans (2004-2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le programme s'inscrit dans la dynamique de la maîtrise de l'eau pour la sécurisation de la production agricole et la diversification des revenus des populations rurales.

Plus spécifiquement, il vise la valorisation des ressources en eau pérenne ou non à travers la réalisation de petits barrages, d'ouvrages de submersion, des plaines de périmètres maraîchers pour le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'arboriculture et de l'approvisionnement en eau potable.

- 1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international :** Procédures nationales
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion autonome

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Obtention des dons :	i) 8 mars 2005 ; ii) 14 mars 2006, iii) 31 juillet 2008
	Mise en vigueur :	07 septembre 2004
	Premier décaissement :	8 mars 2005.

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2013 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Bas-fond (petits barrages)	ha	7 750	7 650
plaine	ha	900	700
Périmètres maraîchers, et arboriculture dans la zone des barrages	ha	250	220
Périmètres maraîchers pour femmes	ha	100	80
Groupes motopompes pour PIV	nombre	22	22
Mares sur creusées	nombre	10	5

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source : Coordination projet.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	8 091	7 871	97
- Equipement- Investissement			
Total financement intérieur	8 091	7 871	97
Financement extérieur :	2 858	2 858	100
- KRII			
Total financement extérieur	2 858	2 858	100
TOTAL DES FINANCEMENTS	10 949	10 729	98

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le programme contribue de façon efficace à la sécurité alimentaire par la maîtrise de l'eau contribuant ainsi :

- au développement de la riziculture à travers l'aménagement de plus 5000 ha de bas-fonds et plaines inondables avec des productions annuelles d'environ 11400 tonnes de riz paddy et 20400 tonnes de produits maraîchers de bananes de papayes etc.
- à la réalisation possible de plus de 25 périmètres maraichers pour les femmes, dans les zones d'influence des ouvrages,
- à l'amélioration de l'abreuvement de plusieurs milliers de têtes de bétail en toutes saisons, un meilleur approvisionnement des marchés de bétails et des centres de collecte de lait,
- à l'augmentation de la production halieutique dans les retenues profondes, à la lutte contre la pauvreté et l'exode rural à travers la création de plus de 5000 emplois ruraux (manœuvres sur les chantiers, exploitations des périmètres, emplois des bureaux et entreprises etc).

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

PROGRAMME D'APPUI A CROISSANCE ECONOMIQUE ET PROMOTION DE L'EMPLOI STIMULEES PAR LE SECTEUR PRIVE (PACEPEP)



I. DESCRIPTION DU PROJET : RNP 2728

- 1.1. Adresse du projet :** Cité des assistants Faladié socoro, avenue de l'OUA
Email : composante2@pacepep.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Sikasso, Segou, Mopti et Bamako
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ agriculture
- 1.4. Bailleur :** DANIDA (Danemark) et GRM
- 1.5. Coût du projet :** 9 059 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Budget National et procédures du bailleur
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2014-2018)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Augmenter la production et faciliter l'accès aux marchés sur quatre filières : Viande-bétail-lait, fruits-légumes, mais-aviculture et artisanat à travers des infrastructures économiques dont la gestion est déléguée aux privés dans le cadre du Partenariat Public Privé (PPP).

Le projet s'attèle à développer les infrastructures économiques au profit du secteur privé ; ainsi deux résultats (extrants) sont attendus à savoir la réalisation de deux (2) blocs d'infrastructure et leur transfert aux collectivités territoriales et la mise en place des mesures de sauvegarde et le renforcement des capacités des opérateurs privés et/ou publics en charge de l'entretien sont renforcées (transfert effectif des réalisations, appui à la valorisation économiques des investissements, la mise en œuvre des plans d'appui/conseil aux bénéficiaires privés gestionnaires des infrastructures, la formation en gestion de tous les gestionnaires délégués et exploitants -usagers)

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion du projet intégrée dans l'Administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Date :	Date d'inscription au BSI :	13/12/2013
	Date de démarrage du projet :	01/01 2014
	Date du premier décaissement :	04/12/2014

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Piste rurale	Nbre	2	2
Magasin de stockage	Nbre	3	3
Aire d'abattage	Nbre	3	2
Périmètres maraichers	Nbre	7	5
Périmètre	Nbre	1	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : source Unité de gestion de projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement	500	122	24
Total financement intérieur	500	122	24
Financement extérieur :	8 559	7 971	93
Total financement extérieur	8 559	7 971	93
TOTAL DES FINANCEMENTS	9 059	8 093	89

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le PACEPEP contribue à la réduction de la pauvreté à travers la réalisation d'infrastructures économiques en gestion déléguée aux organisations paysannes dans le cadre du Partenariat Public/Privé (PPP).

Ministère de l'Agriculture

Office de la Haute Vallée du Niger

CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE/PRODUCTEURS (CP-OHVN)

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2250

- 1.1. Adresse du projet :** BP : 178 Bamako Tél : 20 22 40 64- Tél/fax : 20 23 03 80
Email : ohvnagro@hotmail.com
- 1.2. Zone d'intervention:** Région de Koulikoro
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale / agriculture
- 1.4. Coût total :** 2 810 millions de F CFA
- 1.5. Bailleurs :** GRM
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2014-2016)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

L'objectif global est l'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans la zone d'intervention de l'office. Les objectifs spécifiques sont :

- i. l'amélioration des revenus des producteurs ;
- ii. la sécurité alimentaire ;
- iii. la protection de l'environnement ;
- iv. le développement des filières agricoles et animales ;
- v. le renforcement des capacités des organisations paysannes et
- vi. le désenclavement de la zone d'intervention.

Le Contrat Plan Etat/OHVN comporte les composantes ci-après :

- A. Renforcement des capacités des producteurs ;
- B. Réalisation d'infrastructures rurales et
- C. Promotion des filières.

10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

11. Type d'unité de gestion de projet : Non applicable

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Date de signature du contrat plan: 2014

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016:

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Renforcement des capacités des producteurs :			
- Thèmes de formation des paysans	Nbre	56	10
Réalisation d'infrastructures rurales :			
- Etudes	Nbre	96	7
- Constructions (petits barrages, bas-fond, périmètres maraîchers, logements des chefs secteurs de base)	Nbre	29	8
Promotion des filières agricoles :			
- Centre de traitement pour le Sésame Biologique ;	Nbre	1	1
- Centre de production de beurre de karité biologique	Nbre	1	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source OHVN

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement PPTE :	1 168	884	75,7%
Total financement intérieur	1 168	884	75,7%
TOTAL DES FINANCEMENTS	1 168	884	75,7%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

La promotion des filières et le renforcement des capacités des producteurs contribuent à améliorer leurs revenus. Le revenu brut par habitant de la zone de projet a atteint 186 670 F CFA en 2011, 192 613 F CFA en 2012 et 373 165 F CFA en 2013. La contribution attendue de l'OHVN dans la production nationale de l'année 2014 est d'environ 2,8 %.

Ministère de l'Agriculture

Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda

PROJET D'AMENAGEMENT DES PISTES DE LIASON DE BAGUINEDA



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2604

- 1.1. Adresse du projet :** BP 06, Baguinéda, Tél/fax : 20 22 71 92 / 20 23 29 56
Email : opib@opib.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Koulikoro, cercle de Kati
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 1 500 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 4 ans (2011-2014)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
L'objectif sectoriel est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire.
L'objectif spécifique à assurer le désenclavement des villages déplacés.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Non applicable.
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion intégrée dans l'Office

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1. Dates :**
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| Date d'inscription au BSI National : | 01/01/2011 |
| Date de premier décaissement : | 01/01/2011 |

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Pistes de liaison	Km	50	12

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source OPIB

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Montant des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement :	1770	1508	85%
B. Autofinancement :			
C. Autres (populations/collectivités)			
Total financement intérieur	1770	1508	85%
Financement extérieur :	0	0	0
Total financement extérieur	0	0	0
TOTAL DES FINANCEMENTS	1770	1508	85%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet aménagement des pistes de liaison de Baguinéda contribue à la réduction de la pauvreté des populations cibles par le :

- (i) la réduction des coûts de transport des denrées et des récoltes ;
- (ii) l'assainissement de l'environnement ;
- (iii) la réduction du temps de travail ;
- (iv) la création d'emplois saisonniers.

Ministère de l'Agriculture

Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda

REHABILITATION DU PERIMETRE HYDRO-AGRICOLE DE BAGUINEDA (Contrat-Plan)

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2856

- 1.1. Adresse du projet :** BP 06, Baguinéda, Tél/fax : 20 22 71 92 / 20 23 29 56,
Email : opib@opib.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Koulikoro, cercle de Kati
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet (CP) :** 2 111 millions de F CFA (signé le 17/02/2012)
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2015-2017)

1.9. Logique d'intervention du projet : l'objectif global de ce contrat plan est d'augmenter et de sécuriser la production de riz du périmètre irrigué de Baguinéda et de lutter contre l'exode rural saisonnier. Les activités suivantes sont réalisées par l'Office : (i) le curage des canaux d'irrigation et le faucardage des herbes ; (ii) le nettoyage de la cunette du bief amont et aval ; (iii) le terrassement et la réhabilitation des abreuvoirs ; (iv) l'enlèvement des plantes aquatiques ; (v) l'entretien de la route fermière et (vi) la construction d'un bâtiment à usage de bureau.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré directement par la structure

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Curage du canal principal	Km	18	5
Faucardage des herbes du canal principal	Km	87	19
Nettoyage du canal principal	Km	37	22
Entretien de la digue route	Km	-	2
Faucardage du canal de Tanima	Km	15	6
Faucardage du canal de Sienkoro	Km	15	6
Entretien des drains principaux	Km	81	24

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source OPIB.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
Budget national :	2 111	1 823	86
Total financement intérieur	2 111	1 823	86
TOTAL DES FINANCEMENTS	2 111	1 823	86

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet a permis d'assurer la production de 31 648 tonnes de riz en période d'hivernage, 1 550 tonnes de riz en contre saison, 4 923 tonnes d'oignons et 6 109 tonnes de tomate. De plus, les aménagements ont permis la production de 298 tonnes de maïs de contre saison et de 2 411 tonnes de gombos. En outre, les travaux d'entretiens des canaux, drains et bâtiments ont généré des emplois à des jeunes ruraux

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

PROGRAMME D'APPUI AU SOUS-SECTEUR D'IRRIGATION DE PROXIMITE (PASSIP)

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP PASSIP

- 1.1. Adresse du projet :** BP 271, Bamako Tél : 20 22 58 50 : 20 22 59 73 Fax : 20 22 11 34
Email : dngr@afribonemali.net
- 1.2. Zones d'intervention:** Envergure nationale
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** Allemagne / KFW
- 1.5. Coût Total :** 18 088 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Projet:** 15 ans (2008-2023)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

Pour répondre au souhait du Gouvernement du Mali, la République Fédérale d'Allemagne a accepté de prêter assistance à la Direction Nationale du Génie Rural pour l'élaboration et la mise en application d'un Programme National d'Irrigation de Proximité (PNIP). Pour ce faire les deux parties ont mis en place le « Programme d'appui au sous-secteur d'irrigation de proximité » (PASSIP) Ce programme devra définir en base des inventaires des aménagements existants et d'un inventaire du potentiel aménageable un schéma d'aménagement prioritaire adopté par les parties concernées. Sa contribution est axée sur plusieurs composantes à travers des prestations d'appui conseil au Ministère de l'Agriculture et le renforcement des capacités organisationnelles, économiques et de gestion des systèmes d'irrigation. Dans le même temps, des mesures d'accompagnement seront préparées dans d'autres domaines tels que la mécanisation, l'accès aux services financiers ruraux, la transformation et la commercialisation ainsi que l'amélioration de la gestion de l'irrigation afin d'assurer la réussite du PNIP et de compenser les effets néfastes sur les écosystèmes.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de coordination intégrée dans l'administration

1.12. Principales réalisations physiques prévues :

Un inventaire géo référencé du potentiel d'aménagements hydro-agricoles de proximité est mis progressivement en cohérence avec les stratégies et politiques nationales. La base de données ainsi constituée sera intégrée à un Système d'Information Géographique (SIG) qui permettra au gouvernement de la République du Mali de disposer d'un outil d'aide à la décision, de planification et de suivi des réalisations. Le PASSIP vise à restaurer ces conditions. 103 000 hectares seront aménagés à l'horizon 2012. Le coût des travaux est estimé à environ 50 milliards de F CFA. Près de la moitié des fonds sont endossés par l'Allemagne.

Les Types d'aménagements inclus sont (i) les Petits Périmètres Irrigués Villageois (PPIV), (ii) les bas-fonds et plaines inondables aménagés, (iii) les Systèmes de cultures de décrue dans les lacs et mares de la zone lacustre, (iv) les Petits périmètres maraîchers et (v) les Ouvrages d'épandage d'eau et de rétention d'eau dans les oueds et les oasis.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Date prévue de mise en vigueur : 01/06/2008

2.2. Principales réalisations physiques prévues :

Le PASSIP est un programme spécifique opérationnalisé à travers les différents projets mis en œuvre dans le sous-secteur de l'irrigation spécifiquement dans le domaine de l'irrigation de proximité. Ainsi, il convient de comprendre que les projets comme lpro-irrigar participent à la mise en œuvre du PASSIP. Concrètement, le PASSIP assure l'identification, la préparation et l'assistance à la mise en œuvre de ces projets qui ensemble réalisent en retour les objectifs du PASSIP. C'est bien dans ce schéma qu'il faut comprendre d'intervention de ce programme.

Commentaires et observations :

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2010: source PASSIP

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur - Bailleur : GTZ	11 599	4 104	35,4%
Total financement extérieur	11 599	4 104	35,4%
TOTAL DES FINANCEMENTS	11 599	4 104	35,4%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

A travers la disponibilité des aménagements pour assurer la production dans des conditions favorables, le projet contribue à assoir une base durable pour la production et l'amélioration de la productivité et des revenus des producteurs.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

Projet Irrigation de Proximité - Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Koulikoro



I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: RNP/SN

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Adresse du projet : | Rue 21, porte 212 – Badalabougou Est – Bamako ; Tél : 20 23 09 |
| 1.2. Zones d'intervention: | Régions de Mopti et de Tombouctou |
| 1.3. Secteur et Sous-secteur : | Economie rurale/ agriculture |
| 1.4. Bailleurs : | AM CANADA, KfW |
| 1.5. Coût Total : | 26 800 millions F CFA |
| 1.6. Nature du financement : | Subvention |
| 1.7. Modalité d'appui : | Aide programme |
| 1.8. Durée du Projet: | 7 ans (2015-2019) |

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le projet IPRO-DI contribue à la mise en œuvre du Programme National d'Irrigation de Proximité (PNIP). Il vise une meilleure utilisation du potentiel agricole par l'irrigation de proximité pour accroître les revenus des producteurs et des productrices dans le Delta Intérieur du fleuve Niger au niveau des régions de Mopti et de Tombouctou afin d'améliorer les conditions de vie des populations cibles.

L'essentiel des activités du projet est focalisé sur la réalisation de nouveaux aménagements, la réhabilitation d'aménagements existants, la réalisation des micro-barrages, des pistes d'accès villageois et les magasins de stockage des céréales pour améliorer surtout la gestion post-récolte.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de coordination intégrée dans l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de l'accord de prêt/don :	26/11/ 2014
	Date de mise en vigueur :	03/03/2015
	Date 1 ^{er} décaissement :	17/06/2015

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalizations cumulées
Nouvel aménagement hydroagricole	Nbre	36	12
Réhabilitation aménagement hydroagricole	Nbre	16	2
Réhabilitation des pistes	Km	130	50
Appui à l'exploitation des infrastructures (diffusion, intrants, plan d'exploitation, appui/conseils, reboisement, DRS/CES, sensibilisation VIH IST)	Nbre		

Commentaires et observations : Les réalisations n'ont pas évoluées depuis 2010 suite à la clôture du financement extérieur au 31/12/2010. Le financement intérieur sert à maintenir les acquis du projet.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source : IPRO REAGIR

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :	26 800	1 596	6
Total financement extérieur	26 800	1 596	6
TOTAL DES FINANCEMENTS	26 800	1 596	6

Commentaires et observations: le niveau de décaissement est faible car il s'agit d'un projet d'investissement qui généralement met énormément de temps dans les études.

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Ce projet vise à améliorer la productivité des petites exploitations et principalement des femmes rizicultrices. Compte tenu du fait que la riziculture contribue pour 36 % des revenus des femmes, toute amélioration devra avoir un effet certain sur le rehaussement de leurs revenus et la réduction de la pauvreté de cette couche sensible.

Ministère du Développement Rural

Direction Nationale du Génie Rural

Projet d'Appui à l'Irrigation de Proximité dans le Delta Intérieur du Niger (IPRO-DI), Ex Programme Mali Nord

I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: RNP/SN

- 1.1. Adresse du projet :** Rue 21, porte 212 – Badalabougou Est – Bamako ; Tél : 20 23 09 71 Fax : 20 23 28 95 ; email : malinord@afribonemali.net
Site web : www.delta-mali-nord.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Régions de Mopti et de Tombouctou
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ agriculture
- 1.4. Bailleurs :** Allemagne / KfW ; Canada /AMC
- 1.5. Coût Total :** 12 593 millions F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2015-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
Le projet IPRO-DI contribue à la mise en œuvre du Programme National d'Irrigation de Proximité (PNIP). Il vise une meilleure utilisation du potentiel agricole par l'irrigation de proximité pour accroître les revenus des producteurs et des productrices dans le Delta Intérieur du fleuve Niger au niveau des régions de Mopti et de Tombouctou afin d'améliorer les conditions de vie des populations cibles.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédures des bailleurs
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Consortium AHT/CES/BETICO

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1. Dates :** Date de signature de l'accord de prêt/on : 11/02/2015 et 11/04/2016
- 2.2. Situation d'exécution financière au 31/12/2016:**

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Montant des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Autofinancement :	393	294	75%
B. Autres (populations/collectivités)			
Total financement intérieur	393	294	75%
Financement extérieur :			
- Bailleur : Allemagne / KfW	5 247,6	2 544	48%
- Bailleur : Canada / AMC	6 942,4	3 947	57%
Total financement extérieur	12 190	6 491	53%
TOTAL DES FINANCEMENTS	12 593	6 785	54%

2. 3. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le Programme Irrigation de Proximité dans le Delta Intérieur (IPRO-DI) contribue à la réduction de la pauvreté par : l'aménagement de bas-fonds de proximité, notamment pour les femmes, l'appui à l'aménagement et à l'exploitation de PIV, des périmètres maraichers (PPM), l'appui au système de cultures de décrue dans les lacs et mares en zone lacustre, la réalisation d'ouvrage d'épandage et de rétention de l'eau dans les oueds et les oasis.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale de l'Agriculture

PROJET AMELIORER LA CAPACITE D'ADAPTATION ET LA RESILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE DU MALI DU FEM/PNUD/ACDI/DNA



I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP

- 1.1. Adresse du projet :** BP : 1098 DNA, Faladiè SEMA sise projet IPE Mali, à côté de l'Ecole « Cendrillon »- Bko, Tel : 20 21 01 14, Cell : 76 07 66 11:
Email : mineyitou@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Kayes (Commune de Sandaré), Koulikoro (commune de Massantola) Sikasso (commune M'pèssoba), Ségou (commune de Cinzana) Mopti (commune de Mondoro), Gao (commune de Taboye)
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale / Agriculture.
- 1.4. Bailleurs :** FEM, PNUD, ACDI et GRM.
- 1.5. Coût total du Projet :** 1 470 millions de F CFA.
- 1.6. Nature du financement :** Subvention et Budget national.
- 1.7. Modalité d'appui :** Appui Projet.
- 1.8. Durée du Projet:** 7 ans (2010-2016).
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** l'objectif global du projet est de contribuer à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire du pays. L'objectif spécifique du projet est d'améliorer la capacité d'adaptation des populations rurales vulnérables aux risques supplémentaires posés par les changements climatiques pour la production agricole et la sécurité alimentaire du Mali.
Les composantes du projet sont : (a) Renforcer les capacités d'adaptation des individus et des institutions au niveau local pour prévenir et gérer les impacts des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire ; (b) Mise en œuvre d'activités concrètes de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques dans les communes vulnérables et (c) Capitalisation et dissémination des résultats et des leçons apprises du projet.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédures du Bailleur.
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion parallèle à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de la convention :	28/03/2010
	Date de mise en vigueur :	08/07/2010
	Date du premier décaissement :	19/01/2011

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016:

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Dotation de villages en pluviomètres	Nbre	157	157
Mise en place des pratiques et technologies agropastorales résilientes	Ha	ND	400
Etudes techniques de trois micros barrages	Nbre	03	03
Implantation de puits maraichers modernes	Nbre	20	20
Réalisation de périmètres maraîchers	Nbre	12	10
Réalisation de plateformes solaires	Nbre	04	04
Réalisation de trois micros barrages	Nbre	03	02
Réalisation de centres multifonctionnels féminins	Nbre	04	04
Réalisation de puits citernes	Nbre	0	03
Réalisation de banques de céréales	Nbre	04	04

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source coordination du projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur : FEM, PNUD, ACDI	1 503	1 503	100
Total financement extérieur	1 503	1 503	100
TOTAL DES FINANCEMENTS	1 503	1 503	100

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le projet contribue à la réduction de la pauvreté par : (i) le renforcement de la capacité d'adaptation des populations rurales vulnérables aux risques supplémentaires posés par les changements climatiques ; (ii) l'introduction de l'innovation en matière d'adaptation aux changements climatiques pour la sécurisation de la production ; (iii) la diffusion des pratiques optimales générées par le programme ; (iv) la mise en place de parcelles de démonstration ; (v) dotation des villages en outils de collecte de données et d'utilisation des informations agro météorologiques (pluviomètres paysans, prévisions saisonnières, guide de semis), (vi) dotation des populations cibles en intrants agricoles (engrais et en semences adaptées) ; (vii) installation de périmètres maraichers et de plateformes solaires pour les femmes ; (viii) formation des paysans observateurs à la collecte et diffusion des informations.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale de l'Agriculture

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA FERME RIZICOLE DE SABE

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP / SN

- 1.1. Adresse du projet :** Sévaré - Antenne à Bamako Korofina Nord
Tél : 66 54 47 69 / 78 80 25 44
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Mopti
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** INDE/GRM
- 1.5. Coût total :** 5 940 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Financement extérieur - Budget national
- 1.6. Modalité d'appui :** Prêt
- 1.7. Durée du Projet:** 5 ans (2011 -2016)
- 1.8. Logique d'intervention du projet :**

Le Projet de Développement de la Ferme Rizicole de Sabé a pour mission de proposer et d'exécuter les programmes et projets concourant à la promotion de la filière riz à travers les actions visant le développement de la chaîne de valeurs au niveau de la Ferme.

- 1.9. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur de fonds**
- 1.10. Type d'unité de gestion de projet : Une Direction**
- 1.11. Situation d'exécution financière au 31/12/2016:**

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :	1 440		
Budget national :		0	0
Total financement intérieur	1 440	0	0
Financement extérieur			
- Bailleur : INDE	4 500	4 275	95
Total financement extérieur	4 500	4 275	95
TOTAL DES FINANCEMENTS	5 940	4 275	95

1.12. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet contribue directement à la réduction de la pauvreté à travers l'augmentation de la production et de la productivité des producteurs, l'amélioration du revenu des couches vulnérables. Il permet aussi d'atténuer l'exode rural par le développement durable du périmètre rizicole.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale de l'Agriculture

Projet d'Appui aux Organisations Paysannes du Plateau Dogon pour une Meilleure Valorisation de leurs Productions Maraîchères (GTFS/MLI/030/ITA)



I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP (GTFS/MLI/030/ITA)

- 1.1. Adresse du projet :** Direction Régionale Agriculture Mopti
Tél / Fax : 21 44 21 02 Email : mariko_diallo@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Mopti ; cercle de Bandiagara
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** Gouvernement de l'Italie et GRM
- 1.5. Coût du projet :** 403 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet :** 9 ans (2008 – 2016)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** contribuer à la réduction de la pauvreté dans les communes les plus vulnérables du Mali et notamment dans une centaine de villages de onze communes du Plateau Dogon. Les objectifs spécifiques visent à : (i) renforcer les capacités des producteurs (OP), des femmes et d'autres structures d'appui non étatiques dans la gestion de filières horticoles ; (ii) diversifier et sécuriser la production des filières horticoles en favorisant l'accès aux ressources et aux moyens de production ; (iii) accroître la valeur des productions horticoles et les revenus des groupes cibles vulnérables par la mise en place d'un centre de conditionnement, de transformation et l'accès au marché, à la compétitivité et à la modernisation.
- Les activités du projet se regroupent autour de quatre composantes principales suivantes : (A) Le renforcement des capacités des organisations paysannes dans la gestion de la filière; (B) La diversification et la valorisation des productions horticoles locales par un meilleur accès aux facteurs de production ; (C) La mise en place de conditions de stockage et de transformation adéquates aux volumes et aux caractéristiques des productions ; (D) La mise en place d'un centre de conditionnement des produits maraîchers pour accroître leur compétitivité sur le marché.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Non applicable
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion intégrée dans l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature :	28 Mars 2008
	Date de mise en vigueur :	28 Mars 2008
	Date de premier décaissement :	1 ^{er} Avril 2008

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Source (GTFS/MLI/030/ITA)

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Construction de magasins villageois	Nbre	32	22
Construction de magasins de zone	Nbre	6	0
Construction d'unité de transformation de l'échalote	Nbre	7	7
Réhabilitation de barrages	Nbre	6	6
Construction d'un centre de conditionnement des Echalotes fraîches et transformées	Nbre	1	1
Formation des producteurs en GIPD	Nbre	3000	1683
Réhabilitation de barrages	Nbre	6	6
Installation de kits d'arrosage Goutte à Goutte	Nbre	300	10
Formation en technique de compostage	Nbre	2936	2936
Formation en techniques de production (gombo, sésame et oseille d'hivernage)	Nbre	8983	109 539
Construction de fosses fumières	Nbre	300	505
Semence de pomme de terre	Tonne	-	90
Semence d'échalote	Tonne	-	95
Approvisionnement en semences (gombo, sésame, oseille)	Kg	1000	1000
Equipements :			
- Découpeuses manuelles	Nbre	29	30
- Découpeuses motorisées	Nbre	19	19
- Broyeuses motorisées	Nbre	19	19
- Séchoirs semi-industriels	Nbre	22	22
- Claies de séchages	Nbre	2500	2500

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 :

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement(en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :	403	381	94,5
Total financement intérieur	403	381	94,5
Total des financements	403	381	94,5

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : La création d'emplois par la mise en place d'un centre de conditionnement contribue à l'augmentation des revenus des producteurs et la diminution de l'exode rural. Cela est une source d'accroissement de la valeur ajoutée.

Ministère de l'Agriculture

Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin

APPUI AU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELELIN



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2686

- 1.1. Adresse du projet :** BPE : 4281 Bamako
Tél : (223) 20 22 01 93 / 20 22 01 82 Fax : (223) 20 22 01 83
Email : www.cnlcp.gouv.ml
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût Total :** 400 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 4 ans (2013-2016)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le projet vise à réduire la vulnérabilité du pays aux infestations de la crise acridienne et aux futures infestations en appuyant les stratégies améliorées de prévention, alerte précoce, réaction et réduction des risques. Les objectifs spécifiques sont :

- (i) Consentir des investissements favorables aux renforcements de la prévention des invasions ;
- (ii) Consentir des investissements favorables au retour de la sécurité alimentaire et participer au développement rural en général dans les localités régulièrement exposées aux attaques acridiennes ;
- (iii) Contribuer à la mise en œuvre des mesures prenant en charge l'atténuation de l'effet des traitements sur l'environnement.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Budget National ;

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de l'accord de prêt :	Juillet 2012
	Date de mise en vigueur :	Juillet 2012
	Date de premier décaissement :	Janvier 2013

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalizations cumulées
Achat de véhicules 4X4	Nbre	15	9
Achat de Motos Djakarta	Nbre	25	25
Pneus	Nbre	100	100
Equipement Informatique	Nbre	35	35
Photocopieuse	Nbre	1	1
Mobilier De Bureau	Nbre	62	62

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source : CNLCP

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur : A. Budget National :	383	361	94,3
Total financement intérieur	383	361	94,3
Total des financements	383	361	94,3

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'Appui au programme de lutte contre le Criquet Pèlerin a permis de restaurer les capacités d'intervention et le dispositif de surveillance du CNLCP en le dotant de véhicules adaptés à la lutte antiacridienne.

Ministère de l'Agriculture

Comité National de la Recherche Agricole (CNRA)

PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L'OUEST (PPAAO) WEST AFRICAN AGRICULTURE PRODUCTIVITY PROGRAM (WAAPP)

I. DESCRIPTION DU PROJET: SN RNP/SN

- 1.1. Adresse du projet :** BP E 1911 CNRA-Bamako, Tél/ Fax: 20 22 71 65/ 20 22 711 65
Email : cnramailto@cnra-mali.org;
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire National.
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/ Agriculture.
- 1.4. Bailleurs :** Banque Mondiale et GRM.
- 1.5. Coût total :** 43 500 millions de F CFA.
- 1.6. Nature du financement :** Prêt et Budget national (salaires et fonctionnement)
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Projet:** 4 ans (2014-2018)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le programme est sous régional (Ghana, Mali, Sénégal,). Il vise (i) l'établissement d'un cadre de mécanismes pour les échanges de technologies, (ii) la mise en place des centres de spécialisation dont celui du riz au Mali. Les trois composantes du programme sont :

- A. Développement et dissémination des technologies améliorées à travers le financement sur la base compétitive des projets de recherche et de vulgarisation agricole.
- B. Financement à la demande du Développement et de l'adoption des technologies.
- C. Coordination, gestion, suivi et évaluation du projet.

Le projet sous régional concerne le Ghana, le Mali et le Sénégal. Il existe une coordination sous régionale (CORAF), une coordination nationale (PASAOP) et un service d'exécution (CNRA).

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur.

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l'administration

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1. Dates :**
- | | |
|--|-----------------|
| Date de signature de l'accord de financement : | 21/06/2007 |
| Date de mise en vigueur : | 21 mars 2008 |
| Date de premier décaissement : | 29 juillet 2008 |

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulé
Construction d'un centre multimédia	Nombre	1	En cours
Réalisation de laboratoires	Nombre	2	2
Amélioration et diffusion de variétés de riz à haut rendement	Nombre	1	1
Aménagement de parcelles d'expérimentation	Nombre	3	3
Diffusion de technologie (ensilage)	Nombre	2	2

Atelier de formation (conservation de tomates)	Nombre	1	1
--	--------	---	---

Commentaires et observations : Le projet connaît un retard d'exécution. De ce fait, il a été prorogé jusqu'au 31/12/2014.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source CNRA

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	2 500	289	12
Total financement intérieur	2500	289	12
Financement extérieur :			
IDA	31 000	24 500	79
Total financement extérieur	31 000	24 500	79
Total des financements	33 500	24 789	74

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Les actions du projet visent au renforcement de la dynamique organisationnelle, à plus de professionnalisation des OPs et surtout à l'amélioration des revenus de leurs membres à travers une juste rémunération de leurs produits. D'où sa pertinence dans le cadre de la réduction de la pauvreté.



MINISTRE DE L'ELAVAGE ET DE LA PECHE



Bénéficiaire de noyau de caprins dans la commune de Niamana



LISTE DES P/P DU MEP

NOM DU PROJET	TUTELLE
PROJETS EN EXECUTION	
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-Mali)	MEP
Projet Intégré de Développement des Ressources Animales au Mali (PDIRAM)	MEP
Construction marché central poisson Bamako	MEP
Contrat Plan Etat - LCV	MEP
Convention d'Appui Financier pour la Lutte contre le Charbon Bactérien (PCB)	MEP
Programme de développement de la Pêche et de la Pisciculture zone OHVN (PDPP-OHVN)	MEP
Programme Développement Intégré Réduction Pauvreté Zone ONDY (PDIRP)/CCMD/BRE de Madina DIASSA	MEP
Programme Panafricain contrôle épizooties (PACE) / CNASA	MEP
Programme quinquennal Aménagements Pastoraux (PQAP)	MEP
Programme Quinquennal d'Aménagements Aquacoles (PQAA)	MEP
Projet Appui au Développement Elevage Zone Kayes Sud (PADEPA-KS)	MEP
Projet d'Appui au Développement de l'Elevage du Zébu Maure dans le cercle de Nara (PRODEZEM)	MEP
Projet d'Appui au Développement de la Filière Aquacole dans la région de Sikasso (PRODEFA)	MEP
Projet d'Appui institutionnel au SEP (PAI SEP)	MEP
Projet développement Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG)	MEP
Projet développement et valorisation production laitière au Mali (PRODEVALAIT)	MEP
Projet Gestion Durable Bétail Ruminant Endémique (PROGEBE)	MEP
Réhabilitation Centre Piscicole Molodo	MEP
Transformation des Sous-Produits d'Abattage (PTSPA)	MEP
PROJETS EN DEMARRAGE	
Cellule de coordination de la lutte contre les mouches Tse-Tse	MEP
Centre national d'insémination artificielle animale	MEP
Etude de Faisabilité de la Valorisation des Sous-Produits d'Abattage à l'échelle nationale	MEP
Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger (ODPADIN)	MEP
Programme quinquennal d'aménagements aquacoles	MEP
projet d'Appui à la Filière Halieutique au Mali (PAFHa)	MEP

Ministère de l'Élevage et de la Pêche

Direction Nationale des Industries et Productions Animales

PROGRAMME QUINQUENNAL D'AMÉNAGEMENTS PASTORAUX (PQAP)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2321

- 1.1. Adresse du projet :** S/C DNPIA ; Tél : 20 22 20 22 / 20 23 12 17 ; Fax : 20 22 12 17
Email : dnpia@dnpia.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Elevage
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du programme :** 22 631 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 9 ans (2008-2016)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global est de mettre en place des aménagements pastoraux appropriés afin de promouvoir un développement durable de l'élevage et en vue de réguler les systèmes de production pastoraux, tout en assurant leur intégration harmonieuse dans l'espace rural. Il vise ainsi à réduire les risques de tension entre pasteurs et agriculteurs. Ce Programme quinquennal est basé sur les grands axes stratégiques de développement du sous-secteur de l'élevage et s'articule autour de quatre composantes :

- (A) l'hydraulique pastorale,
- (B) la préservation de la mobilité du cheptel,
- (C) la protection du disponible fourrager et
- (D) l'amélioration des ressources naturelles en vue de leur durabilité.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable.

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré directement par la DNPIA.

Ministère de l'Elevage et de Pêche

Secrétariat Général

Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-Mali)



I. DESCRIPTION DU PROJET : RNP : 2799

- | | |
|---|--|
| 1.1. Adresse du projet : | Hamdallaye ACI 2000, Tel : 66 71 37 19
Email : wahabd06@yahoo.fr |
| 1.2. Zones d'intervention : | Territoire national |
| 1.3. Secteur et Sous-secteur : | Economie rurale/ Elevage/pêche |
| 1.4. Bailleurs : | GRM/ IDA |
| 1.5. Coût du projet : | 24 105 millions de F CFA |
| 1.6. Nature du financement : | Subvention et Budget national |
| 1.7. Modalité d'appui : | Aide projet |
| 1.8. Durée du Projet/Programme : | 6 ans (2016-2021) |

1.9. Logique d'intervention du projet :

Améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans les zones transfrontalières sélectionnées et le long des axes de transhumance dans les six pays du sahel et d'améliorer la capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de crise pastorales ou d'urgences.

Les objectifs spécifiques sont :(1) organiser et rendre plus opérationnels les services vétérinaires (SVN) pour améliorer la situation sanitaire du cheptel ; (2) renforcer la gestion durable des ressources naturelles par les communautés pastorales et agropastorales et sécuriser leur accès à ces ressources ; («3) améliorer l'accès des organisations OP aux marchés nationaux et régionaux à travers le développement des infrastructures et des systèmes d'information des marchés, et le renforcement des organisations pastorales et interprofessionnelles de facilitation du commerce et (4) améliorer la préparation des crises, par le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des crises (SAP) et par une approche préventive de soutien à la diversification des revenus et moyens d'existence en milieu pastoral.

1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international : Procédure IDA

1.11. Type d'unité de gestion de projet : l'unité de coordination du projet

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :

Date de signature :	19 juin 2015
Date de mise en vigueur :	03 novembre 2015
Date du 1 ^{er} décaissement :	1 ^{er} avril 2016.

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
	1	1	1
L'acquisition d'équipements et de matériels de santé animale en appui aux services vétérinaires et au déploiement des Mandataires dans les Zones Pastorales: 88 congélateurs/ réfrigérateurs, 54 centenaires, 33 réfrigérateurs solaires, 64 glacières, 18 trousse, 15 kits de prélèvement, 15 GPS, 25 Smartphone, 15 motos et équipements de protection individuelle et de stockage (fûts) des pesticides	342	342	342
L'appui à la campagne de vaccination par i) l'organisation des rencontres régionales et locales d'information, de communication et de sensibilisation et d'évaluation/bilan de la campagne de vaccination, la dotation aux VTMS en carburant et petits équipements et appui aux directions, secteurs et postes en carburant , chaine de froid. iii) et ii) l'exécution des campagnes de vaccination contre la PPCB et la PPR dont 2/3 par les VTMS	95	95	95
Formation	17	17	

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source : PRAPS-Mali

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	1 605	150	9
Total financement intérieur	1 605	150	9
Financement extérieur :			
-Bailleur n°1 (IDA)	22 500	3 394	15
Total financement extérieur	22 500	3 394	15
Total des financements	24 105	3 544	15

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Les actions du projet sont de nature à favoriser l'augmentation du taux de fécondité, du poids vif des animaux, la diminution de la mortalité et de la morbidité du bétail et à dynamiser le commerce en générant une augmentation directe des revenus et des actifs ; et assurant par ailleurs une sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté.



Ministère de l'Elevage et de la PECHE

Direction Nationale des Productions Animales et des Industries Animales.

PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION DE LA PRODUCTION LAITIERE AU MALI (PRODEVALAIT)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2404

- 1.1. Adresse du projet :** PRODEVALAIT (Sotuba) ; Tél : 20 24 51 16
Email : prodevalaitmali@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Elevage
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du programme :** 15 776 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 2009-2017

1.9. Logique d'intervention du projet :

Il a pour objectif global l'autosuffisance du Mali en lait frais produit localement et plus spécifiquement :

- (i) Accroître significativement la production locale de lait.
- (ii) Assurer l'accessibilité de la collecte de lait local pour les industries de transformation.
- (iii) Implanter des industries de valorisation du lait local.

La stratégie consistera à

- A. Intensifier la production de lait par l'organisation de bassins laitiers autour des centres de consommation laitière.
- B. Améliorer la performance des troupeaux laitiers par insémination artificielle à travers le croisement avec des races exotiques.
- C. Assurer la collecte régulière et complète du lait des centres de collecte vers les unités de transformation.
- D. Implanter les unités de transformation laitière dans les grandes villes du pays.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de projet intégrée dans l'administration

Ministère de l'Elevage et la Pêche

Direction Nationale des Services Vétérinaires

CONVENTION D'APPUI FINANCIER POUR LA LUTTE CONTRE LE CHARBON BACTERIDIEN (PCB)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN

- 1.1. Adresse du projet :** Tél / Fax : 20 22 61 93 / 20 22 20 23
Email : camarasolo@hotmail.com
- 1.2. Zones d'intervention :** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Elevage
- 1.4. Bailleur :** UEMOA
- 1.5. Coût du programme :** 855 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet :** 5 ans (2015-2019)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
L'objectif global est d'améliorer la couverture sanitaire des bovins et de lutter contre la pauvreté. Spécifiquement, il a pour objectif de réaliser des infrastructures vétérinaires pour faciliter la vaccination des animaux et améliorer les conditionnements des produits vétérinaires. Le projet s'articule autour de trois composantes suivantes (i) acquisition de matériels et logistique pour la chaîne de froid dans le cadre de la conservation; (ii) l'acquisition des équipements techniques comme les équipements de protection individuel et autres et (iii) la réalisation des parcs de vaccination.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Non applicable.
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Projet géré directement par la structure.



II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Dates de signature :	18 Novembre 2014
	Date de mise en vigueur :	3 février 2015
	Date du 1 ^{er} décaissement :	2 septembre 2015

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016:

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Parcs de vaccination	Nbre	20	5
Véhicule TT	Nbre	6	6
Moto YBR	Nbre	20	26
Matériels techniques et consommables de vaccinos	Nbre	1	1
Matériel de diagnostic LCV	Nbre	1	0
Matériels informatiques (lot)	Nbre	5	1
Acquisition d'une Hotte de labo	Nbre	1	0
Parcs de vaccination	Nbre	20	5
Véhicule TT	Nbre	6	6
Moto YBR	Nbre	20	26

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : source DNSV

Sources de financement	Financement Acquis	Cumul Décaissements au 31/12/2016	Taux de Décaissement (en %)
Total financement intérieur			
Financement extérieur :			
-Bailleur n°1	624	371	59
Total financement extérieur			
Total des financements	624	371	59

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet contribue à améliorer la santé animale en réduisant le taux de contagion, permettant ainsi d'augmenter la productivité et les revenus des éleveurs.

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale des Productions et Industries Animales

Centre National de l'Insémination Artificielle Animale



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 3000

- | | |
|--|---|
| 1.1. Adresse du projet : | Sotuba, Email : cnia.mali@yahoo.fr
Tél/fax : |
| 1.2. Zones d'intervention: | Territoire national |
| 1.3. Secteur et Sous-secteur : | Economie rurale/ Elevage et Pêche |
| 1.4. Bailleurs : | GRM |
| 1.5. Coût du projet (CP) : | 400 millions de F CFA |
| 1.6. Nature du financement : | Budget national |
| 1.7. Modalité d'appui : | BSI National |
| 1.8. Durée du Projet: | 1 an (2017) |
| 1.9. Logique d'intervention du projet : | |

Le CNIA a été créé par Ordonnance N°2015-14014/P-RM du 02 avril 2015 ratifié par la loi N°2015-024 du 11 juin 2015 en tant qu'Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) et le décret N°2015-0283/P-RM du 17 avril 2015 fixe son organisation et ses modalités de fonctionnement.

L'insémination artificielle est une voie pour l'amélioration des aptitudes de production des races animales et aussi pour la préservation et la conservation des races locales. Aucun pays ne peut aujourd'hui développer son secteur laitier sans l'organisation des professionnels et l'adoption de la technique de l'insémination artificielle.

L'objectif du centre est d'améliorer à court et moyen termes le rendement laitier et boucher des animaux à travers le croisement avec les races exotiques performantes.

Ce faisant, le disponible en lait et viande des élevages se trouveront augmenter, la sécurité alimentaire améliorée, la réduction des importations de lait et de produits laitiers et enfin de lutter contre la pauvreté. Il est prévu des activités suivantes par le Programme national d'insémination artificielle qui sont entre autres la poursuite des inséminations y compris celle des petits ruminants, la construction du centre, l'acquisition des produits de synchronisation et de l'azote liquide et des missions de sensibilisation.

Notons que c'est avec le soutien du royaume du Maroc que le Centre a pu fonctionner à travers la dotation du centre 135 000 doses semences bovine, à la formation et l'appui au 21 inséminateurs recrutés ; Le centre se fixe comme défis de vulgariser à une large échelle la pratique d'insémination artificielle et de la rendre largement accessible à l'ensemble des producteurs et des exploitations familiales dans l'optique de booster la production de lait et de viande par l'amélioration des performances génétiques de nos races locales.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré directement par la structure

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2013 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Insémination	Nbre	21 000	11 456
Etude architectural du centre	Unité	1	0
Réhabilitation des bureaux	Unité	1	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source CNIA.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
Budget national :			
- Equipement – investissement:	400	23	6
Total financement intérieur	400	23	6
TOTAL DES FINANCEMENTS	971	23	6

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

A travers l'amélioration des rendements en lait et en viande des producteurs, le centre contribue à l'amélioration de leur revenu et ainsi réduire la pauvreté.

Ministère de l'Élevage et de la Pêche

Direction Nationale des Services Vétérinaires

CELLULE DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES TSE-TSE



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 3050

1.1. Adresse du projet :	BP 9125, Sotuba ; Email : Tél : 20 24 01 43, 20 24 19 85 ; Fax : 20 24 19 73
1.2. Zones d'intervention:	Région de Koulikoro, Sikasso (Koutiala), Ségou et District de Bamako
1.3. Secteur et Sous-secteur :	Economie rurale/Elevage
1.4. Bailleurs :	GRM
1.5. Coût Total :	50 millions de F CFA
1.6. Nature du financement :	Budget national
1.7. Modalité d'appui :	Aide projet
1.8. Durée du Projet:	1 an (2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté de façon durable et au renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'amélioration de la santé animale.

Les objectifs spécifiques :

- Libérer durablement les zones infestées reconnue prioritaire des mouches Tsé-Tsé et de la trypanosomose animale ;
- Réduire la prévalence de la trypanosomose animale d'au moins 90% ;
- Préserver l'habitat et le génotype du bétail trypanotolérant ;
- Atteindre un taux de réduction de la densité de la population des tsé-tsé d'au moins 95% ;
- Renforcer les capacités d'intervention de tous les acteurs de la lutte.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: non applicable.

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Cellule de coordination et de gestion autonome.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source CCLMT

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement PPTE :	100	50	50
TOTAL DES FINANCEMENTS	100	50	50

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

La réduction de la densité de la population de glossines permettra une augmentation du temps de travail journalier dans les champs et du temps de pâture des animaux, une diminution de la maladie, du coût des traitements et une amélioration de la santé des animaux.

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale de la Pêche

Projet d'Appui à la Filière Halieutique au Mali (PAFHa)

I. DESCRIPTION DU PROJET : RNP

- 1.1. Adresse du projet :** BP E4804 rue 25 porte 251
Tél : 20239642
Email : malado.keita@btcctb.org
- 1.2. Zones d'intervention :** Régions de Ségou, Mopti et le District de Bamako
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/Elevage/Pêche
- 1.4. Bailleurs :** Union Européenne
- 1.5. Coût du projet :** 5 248 en millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet/Programme :** 2016-2021
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

Contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali.

Son objectif spécifique est d'améliorer les revenus par un appui au développement de la filière halieutique. Les résultats attendus sont (1) la conservation, la valorisation et la commercialisation des produits halieutiques sont améliorés (ciblage des zones d'intervention, le processus de manutention, conditionnement et le transport du poisson frais et transformés, réhabilitation et construction des infrastructures communautaires privées ou mixtes, appui à la conservation du poisson frais et transformé); (2) la production halieutique, de la pêche et de la pisciculture est développée avec des pratiques durables (développement de la production piscicole, de la production issue de la pêche); (3) les capacités des services techniques gouvernementaux et des organisations professionnelles et leur interaction avec les autres acteurs de la filière sont renforcées.

La grande partie des activités du projet sera mise en œuvre à travers des subventions à tiers, à savoir des ONG et partenaires étatiques et paraétatiques (DNP, Services techniques déconcentrés, CT, centre de formation professionnelle de Molodo, centre de recherche agronomique de l'IER à Mopti, association/coopératives des acteurs de la filière.

1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international : Belgique et Union Européenne

1.11. Type d'unité de gestion de projet : unité de coordination autonome

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source : Coordination projet.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :	5 248	0	
Total financement extérieur	5 248	0	0
TOTAL DES FINANCEMENTS	5 248	0	0

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : à travers ses résultats projetés, le PAFHa contribuera à la réduction de l'insécurité Alimentaire et nutritionnelle dans sa zone d'intervention.

Ministère de l'élevage et de la Pêche

L'Agence de Gestion du Marché Central à Poisson de Bamako

CONSTRUCTION DU MARCHÉ MODERNE A POISSON



I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: 2402 // AGMCPB

- 1.1. Adresse du projet :** Faladié zone aéroportuaire RN7/ à côté de TOGUNA INDUSTRIE
Bko Tel 20 80 10 97 Email : agmcpb@agmcpb.ml
- 1.2. Zones d'intervention:** District de Bamako zone aéroportuaire à côté de TOGUNA Industrie
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Elevage et Pêche
- 1.4. Bailleurs :** Japon / JICA
- 1.5. Coût Total :** 2 232 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.8. Durée du Projet:** 8 ans (2009-2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le projet est exécuté par une agence d'exécution AGMCPB (Agence de Gestion du Marché Central à Poisson Bamako). L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté par l'accroissement des revenus des femmes et des hommes qui interviennent dans les filières poissons. Spécifiquement, l'AGMCPB vise à améliorer les techniques d'hygiène, de bonne conservation et transformation du poisson, en intervenant au niveau de la conservation, de la production de glace, de transformation et de commercialisation. Le Projet est axé sur trois composantes à savoir :

- l'amélioration des conditions de conservation et d'hygiène du poisson ;
- l'augmentation des ventes ;
- le renforcement des capacités des acteurs de la filière poisson.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de projet intégrée dans l'administration

II. II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :

Date de signature : 23 juin 2010

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016:

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Construction des hangars	Nbre	1	1
Parking	Nbre	1	1
Chambre froide négative	Nbre	1	1
Magasins	Nbre	1	1
Toilettes	Nbre	1	1
Salle de réunion	Nbre	1	1
Cantine et dallage d'une partie de la cours	Nbre	1	1
Acquisition d'un groupe électrogène 400 KVA	Nbre	1	1

2.3. Situation d'exécution financière : du démarrage du projet au 31/12/2016 (en millions de F CFA)

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	2 232	1 739	78
Total financement intérieur	2 232	1 739	78
Total des financements	1 882	1 739	78

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'amélioration des conditions de conditionnement, de transformation et de commercialisation des produits de l'aquaculture devrait générer une plus-value significative pour les opérateurs de la filière tout en rassurant les consommateurs sur la sécurité sanitaire des produits.

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale de la Pêche

PROGRAMME QUINQUENNAL D'AMENAGEMENTS AQUACOLES (PQAA)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2320

- 1.1. Adresse du projet :** S/C DNP, Tél : 20 22 76 77 / 20 22 54 58 ; Fax : 20 22 52 30
Email : dnp@datatech.net.ml
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Pêche
- 1.4. Bailleur :** GRM
- 1.5. Coût du programme :** 65 685 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 7 ans (2016-2020)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif de ce programme est de promouvoir un accroissement durable de la production piscicole et de diversifier les activités des communautés de pêche en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, à travers leur sédentarisation et leur participation au développement local.

Plus spécifiquement, le programme vise à i. aménager les mares ; ii. Construire des étangs aquacoles ; iii. Diversifier les activités pour optimiser la production alimentaire dans les zones où la maîtrise totale de l'eau est réalisée ; iv. Promouvoir l'aquaculture en cages flottantes dans les zones propices ; v. Assurer une large diffusion des actions menées dans le sous-secteur ; vi. Renforcer les capacités d'intervention des acteurs et vii. Suivre et évaluer la mise en œuvre et l'impact du programme. Le programme comprend sept composantes et travaillera à la valorisation des mares, au soutien à la production de poissons, à la réalisation de périmètres maraichers, Etangs piscicoles, mares aménagées et fermes piscicoles

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Programme géré par la Direction nationale de la Pêche

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Date de mise en vigueur : Juillet 2015
Date de démarrage : janvier 2016

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source D.N.Pêche

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
Budget national :			
- Equipement – investissement:	2 463	1 573	64
Total financement intérieur	2 463	1 573	64
TOTAL DES FINANCEMENTS	2 463	1 573	64

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'aquaculture est un moteur potentiel dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en contribuant à diversifier la production et à accroître les revenus. En outre le développement d'une production nationale doit permettre de réduire la dépendance vis-à-vis des produits d'importation.

Les revenus attendus pour les producteurs seront améliorés.



Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

Programme de Développement Intégré des Ressources Animales et Aquacoles au Mali (PDIRAAM)

I. DESCRIPTION DU PROJET: 2798

- 1.1. Adresse du projet :** Inspection MEP
- 1.2. Zones d'intervention:** Régions de Kayes, Koulikoro et Ségou cercle de Nara
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Elevage
- 1.4. Bailleurs :** BID, GRM
- 1.5. Coût Total :** 12 500 millions de F CFA signé le 15 août 2015
- 1.6. Nature du financement :** Prêt
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2017 - 2021)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** le programme vise à l'augmentation durable de la production et de la productivité du bétail, à la sécurité alimentaire et à l'amélioration du revenu des producteurs ruraux à travers (i) l'amélioration durable de l'alimentation des animaux ; (ii) l'amélioration de la santé des animaux ; (iii) l'accroissement de la production et de la productivité du bétail ; (iv) l'amélioration de la qualité de la viande et du lait ; (v) l'augmentation du revenu des acteurs ; (vi) la création d'emploi notamment des jeunes et des femmes et (vii) le renforcement des capacités des acteurs.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédures du bailleur.
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité parallèle à l'administration.
- 2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016:** source Coordination projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
Budget national :	1 250	50	4
- Equipement – investissement :			
Total financement intérieur	1 250	50	4
Financement extérieur :			
- Bailleur : BID	11 250	0	0
Total financement extérieur	11 250	0	0
TOTAL DES FINANCEMENTS	12 500	50	0.4

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le programme travaillera au relèvement du niveau de la production et de la productivité du bétail malien dans l'optique d'une amélioration de la sécurité alimentaire et du revenu des communautés rurales à travers l'amélioration durable de l'alimentation, de la santé, qualité de la viande et du lait induisant une augmentation substantielle des revenus.

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Laboratoire Central Vétérinaire

CONTRAT PLAN DU LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE / ETAT (3^{ème} CP-LCV 2015-2017)

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2200

- 1.1. Adresse du projet :** BP 2295, Km 8 Route de Koulikoro, Sotuba
Tél : 20 24 33 44/ 20 24 23 04/ 20 24 23 05
Fax : 20 24 98 09 Email : labovet@labovetmali.org
- 1.2. Zones d'intervention :** Territoire National
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Elevage
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût total :** 946 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 6 ans (2011-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

Le Laboratoire Central Vétérinaire, Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière depuis 1994, a pour missions essentielles :

- A. de service public comme la recherche appliquée en santé animale, les diagnostics de routine et de référence des maladies animales, le contrôle de l'hygiène alimentaire et environnementale (qualité microbiologique, analyse des résidus de pesticides), la surveillance épidémiologique des maladies animales et la formation aux techniques de laboratoire et recyclage des cadres de terrain.
- B. à caractère commercial : production et commercialisation des vaccins vétérinaires.

L'objectif global du 3^{ème} Contrat Plan Etat/LCV 2015-2017 vise à appuyer le LCV dans l'exécution de ses missions et plus spécifiquement à améliorer les infrastructures pour la production de vaccins, l'outil de production, les capacités de contrôle des vaccins et des aliments, la compétence des agents du LCV.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré directement par la Direction Générale

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source LCV.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	946	729	77
- Equipement – investissement:			
Total financement intérieur	946	729	77
TOTAL DES FINANCEMENTS	946	729	77

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le LCV contribue à la réduction de la pauvreté à travers l'assurance de la (i) disponibilité des vaccins ; (ii) le contrôle de la qualité des denrées alimentaires, (iii) l'amélioration de la productivité des animaux et (iv) l'amélioration de la santé animale et humaine.

PROJET DE TRANSFORMATION DES SOUS PRODUITS D'ABATTAGE

I. DESCRIPTION DU PROJET: 2488

1.1. Adresse du projet :	BP : 265 Bamako, Tél. : 20 22 20 22 ; Fax : 20 23 12 17 Email : rokiadrabo@yahoo.fr
1.2. Zones d'intervention:	Bamako
1.3. Secteur et Sous-secteur :	Economie rurale/ Elevage
1.4. Bailleurs :	BADEA, GRM
1.5. Coût Total :	2 831 millions de F CFA
1.6. Nature du financement :	Budget national
1.7. Modalité d'appui :	Aide projet
1.8. Durée du Projet:	11 ans (2007-2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global du projet est de valoriser les sous-produits d'abattage (sang, os, cornes, onglons, sabots et matières stercoraires) ainsi que l'amélioration des conditions hygiéniques et environnementales des infrastructures d'abattage existantes. L'étude de réactualisation prévoit le redimensionnement du projet initial avec la mise en place d'une seule unité de transformation de sous-produits d'abattage à Bamako, l'aménagement des aires d'abattage et la création de mini ateliers de transformation des sous-produits d'abattage dans la zone périurbaine de Bamako.

Les objectifs spécifiques du projet sont ainsi la production de farine animale pour l'alimentation du bétail, la production de bio gaz comme source d'énergie et la production d'engrais. Les composantes du projet sont :

- a. Travaux de génie rural
- B. Equipement et matériel
- C. mobilier et matériel de bureau
- d. matériel de transport
- E. Service de consultant.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable.

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité parallèle à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :

Date de premier décaissement : décembre 2007

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Atelier de transformation et annexes	Nbre	1	1
Station d'épuration	Nbre	1	1
Achat équipement de l'atelier et mise en place	Nbre	1	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source Coordination projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	2 831	2 124	75
- Equipement – investissement :			
B. Autofinancement :			
C. Autres (populations/collectivités)			
Total financement intérieur	2 831	2 124	75
TOTAL DES FINANCEMENTS	2 831	2 124	75

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet permettra la création d'emplois, la production d'aliments pour animaux et d'engrais qui contribueront au développement des productions animales, piscicoles et agricoles, dont à la création de revenus.

COMMISSARIAT A LA SECURITE
ALIMENTAIRE



LISTE DES P/P DU CSA

NOM DU PROJET	TUTELLE
PROJETS EN EXECUTION	
Programme de Lutte Contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les Cercles de Nara et Nioro (PLIAM)	CSA
Programme Intégré de Développement Rural de la Région de Kidal (PIDRK)	CSA
Programme Investissement et de Développement Rural des Région Du Nord (PIDRN)	CSA
Programme de Restructuration du Marche Céréaliier (PRMC)	CSA
Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)	CSA
PROJETS EN DEMARRAGE	
Construction siège CSA a l'OPAM	CSA

Stock National de Sécurité Alimentaire(SNS)

I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: RNP 2724 SNS

- 1.1. Adresse du programme :** Tel : 20 21 49 53 ; Tel/fax : 20 21 74 19 ;
BP : 1748 Bamako.
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/Sécurité alimentaire
- 1.4. Bailleurs :** Budget national
- 1.5. Coût du programme :** 37 355 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subventions et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du programme :** 2014 - 2017

1.9. Logique d'intervention du programme :

La tutelle du programme est assurée par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). La coordination entre les partenaires donateurs du PRMC s'effectue par le biais du « Comité de Gestion des Donateurs ». Le PRMC s'occupe de la prévention et de la gestion des crises alimentaires conjoncturelles. Il dispose d'un Stock National de Sécurité (SNS) de 35.000 tonnes de céréales et de deux outils financiers : le Fonds Commun de Contre Partie (FCC) et le Fonds de Sécurité Alimentaire (FSA). Le PRMC génère de l'information et exécute des actions de sécurité alimentaire (distributions alimentaires gratuites, ventes d'intervention, banques de céréales, petits périmètres irrigués villageois, etc.). Les structures d'exécution du PRMC sont le Secrétariat Technique, l'OPAM, le SAP et l'OMA. Le Secrétariat Technique assure la gestion courante et la coordination du dispositif. La gestion du SNS est confiée à l'OPAM. Le SAP surveille les 703 communes en matière de sécurité alimentaire et formule des recommandations d'atténuation d'insécurité alimentaire à l'endroit des décideurs. L'OMA diffuse des informations sur les prix et l'état de disponibilité des céréales.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Cogestion Etat – donateurs

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de l'accord:	01/01/2006
	Date de démarrage :	01/01/2006
	Date de premier décaissement :	07/2006

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Achat de céréales pour le stock national de sécurité alimentaire (mil, maïs, sorgho)	tonne	33 000	11 486
Distributions alimentaires gratuites	tonne	5 000	0
Ventes d'intervention	tonne	11 500	4 624
Rotations techniques	tonne	14 000	0
Banques de céréales	tonne	3 000	0
Mise en œuvre banques de céréales (transport)	Millions F CFA		

Observations : Outre les actions de sécurité alimentaire, le PRMC finance le fonctionnement annuel de ses structures (en moyenne 350 millions F CFA pour l'OPAM, 370 millions F CFA pour le SAP, 150 millions F CFA pour l'OMA et 35 millions F CFA pour le Secrétariat Technique). Les dépenses d'investissement sont également prises en charge (matériel roulant, matériel informatique et équipement de bureau).

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PRMC

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	26 216	20 888	80
Total financement intérieur	26 216	20 888	80
Total des financements	26 216	20 888	80

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Les actions de sécurité alimentaire (distributions alimentaires gratuites, banques de céréales, ventes d'intervention et rotations techniques) mises en œuvre ont permis aux populations vulnérables de préserver leur capital productif.

PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DU MARCHÉ CÉREALIER (PRMC)



I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: RNP 1369 PRMC

- 1.1. Adresse du programme :** Tel : 20 21 49 53 ; Tel/fax : 20 21 74 19 ;
BP : 1748 Bamako.
- 1.2. Zones d'intervention:** Territoire national
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/Sécurité alimentaire
- 1.4. Bailleurs :** Canada, USA, France, Union Européenne, Allemagne, Pays-Bas, PAM, UNICEF et GRM
- 1.5. Coût du programme :** 6 496 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subventions et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du programme :** 2012 - 2017
- 1.9. Logique d'intervention du programme :** La tutelle du programme est assurée par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). La coordination entre les partenaires donateurs du PRMC s'effectue par le biais du « Comité de Gestion des Donateurs ». Le PRMC s'occupe de la prévention et de la gestion des crises alimentaires conjoncturelles. Il dispose d'un Stock National de Sécurité (SNS) de 35.000 tonnes de céréales et de deux outils financiers : le Fonds Commun de Contre Partie (FCC) et le Fonds de Sécurité Alimentaire (FSA). Le PRMC génère de l'information et exécute des actions de sécurité alimentaire (distributions alimentaires gratuites, ventes d'intervention, banques de céréales, petits périmètres irrigués villageois, etc.). Les structures d'exécution du PRMC sont le Secrétariat Technique, l'OPAM, le SAP et l'OMA. Le Secrétariat Technique assure la gestion courante et la coordination du dispositif. La gestion du SNS est confiée à l'OPAM. Le SAP surveille les 703 communes en matière de sécurité alimentaire et formule des recommandations d'atténuation d'insécurité alimentaire à l'endroit des décideurs. L'OMA diffuse des informations sur les prix et l'état de disponibilité des céréales.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédures des bailleurs
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Cogestion Etat – donateurs

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de l'accord:	01/01/2006
	Date de démarrage :	01/01/2006
	Date de premier décaissement :	07/2006

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Achat de céréales pour le stock national de sécurité alimentaire (mil, maïs, sorgho)	tonne	33 000	11 486
Distributions alimentaires gratuites	tonne	5 000	0
Ventes d'intervention	tonne	11 500	4 624
Rotations techniques	tonne	14 000	0
Banques de céréales	tonne	3 000	0
Mise en œuvre banques de céréales (transport)	Millions F CFA		

Observations : Outre les actions de sécurité alimentaire, le PRMC finance le fonctionnement annuel de ses structures (en moyenne 350 millions F CFA pour l'OPAM, 370 millions F CFA pour le SAP, 150 millions F CFA pour l'OMA et 35 millions F CFA pour le Secrétariat Technique). Les dépenses d'investissement sont également prises en charge (matériel roulant, matériel informatique et équipement de bureau).

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PRMC

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	6 496	4 366	67
Total financement intérieur	6 496	4 366	67
Total des financements	6 496	4 366	67

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Les actions de sécurité alimentaire (distributions alimentaires gratuites, banques de céréales, ventes d'intervention et rotations techniques) mises en œuvre ont permis aux populations vulnérables de préserver leur capital productif.

REGION DE KAYES



Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

Agence de Développement Rural de la vallée du fleuve Sénégal

Projet de Développement Rural du Kaarta / Séfétó

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2966

1.1. Adresse du projet :	Tél/FAX : 21 57 39 68 Email : addy@cefib.com / paddyelimane@yahoo.fr
1.2. Zones d'intervention:	Région de Kayes, Cercle Kita
1.3. Secteur et Sous-secteur :	Economie rurale/ Agriculture
1.4. Bailleurs :	GRM
1.5. Coût du projet :	12 969 millions de F CFA
1.6. Nature du financement :	Budget national
1.7. Modalité d'appui :	Aide projet
1.8. Durée du Projet:	5 ans (2016-2020)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif général est de réaliser les études d'APS, APD et DAO relatives à l'aménagement hydroagricole des Bas-fonds, des PIV, des PPM.

Les objectifs spécifiques du projet sont suivants :

- Faire un diagnostic participatif de la situation actuelle et proposer au besoin des réhabilitations ou extension des systèmes d'irrigation et de drainage ;
- Identifier de façon participative les contraintes liées aux aménagements hydroagricoles (bas-fonds et plaines inondables pour la riziculture et le maraîchage) et à l'utilisation des pistes de désenclavement en toute saison ;
- Faire des études de bases nécessaires à la conception (topographie, pédologie, hydrologie, impact sur l'environnement) ;
- Proposer des investissements appropriés à ces contraintes ;
- Prendre en compte la participation des bénéficiaires en terme de HIMO et procéder à un accompagnement conséquent pour une mise en valeur durable ;
- Appuyer les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leur programme de développement ;
- Evaluer le coût des investissements et des charges récurrentes ;
- Rédiger un document de projet

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l'administration et dans la collectivité territoriale

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature :	17/08/2015
	Date de mise en vigueur :	01/01/2016
	Date de premier décaissement :	14/10/2016

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Pistes rurales	km	310	
Aménagement de bas-fonds	Ha	1 000	
Aménagement de périmètre maraîcher	Ha	66	
Ouvrages de franchissement	Nbre		
Adduction d'eau potable	Nbre	27	

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PDRKS.

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :	75	0	0
- Equipement -investissement			
Total financement intérieur	75	0	0
Total des financements	75	0	0

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet contribue à l'autosuffisance alimentaire à travers l'augmentation de la production et de la productivité, et à la réduction de la pauvreté des populations cible à travers l'amélioration subséquente de leur revenu.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat général

Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS)

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU DISTRICT DE KITA ET DE SES ENVIRONS, phase 2 (PDRIK II)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2684

1.1. Adresse du projet :	Tél : 21 57 37 88 / 66 75 12 06
1.2. Zones d'intervention :	Région de Kayes, Cercles de Kita et de Bafoulabé
1.3. Secteur et Sous-secteur :	Economie rurale/ agriculture
1.4. Bailleurs :	BID et GRM
1.5. Coût du projet :	12 000 millions de F CFA
1.6. Nature du financement :	Prêt d'ISTISNA'A et Budget national
1.7. Modalité d'appui :	Aide projet
1.8. Durée du Projet :	4 ans (2013 - 2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif principal est d'améliorer les revenus et les conditions de vie de la population malienne en général et les habitants de la zone de Kita en particulier à travers l'amélioration de la production agricole, d'infrastructures de transport et l'approvisionnement de la population en eau potable.

Les objectifs spécifiques du PDRIK II sont :

- (i) accroître, diversifier et sécuriser la production agricole à travers l'aménagement des terres ; la fourniture d'intrants et d'équipements agricoles ;
- (ii) renforcer les capacités des organisations paysannes à travers la fourniture de services de vulgarisation ;
- (iii) améliorer les revenus des agriculteurs ;
- (iv) améliorer l'accès de la population aux infrastructures sociales de base à travers la construction de points d'eau potable ; et
- (v) contribuer au désenclavement de la localité de Kita à travers la construction de routes de desserte et de ponts.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures des bailleurs.

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée à l'ADRS.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Prêt BID : Date de signature de l'Accord de Prêt : 29/08/2012
 Date de mise en vigueur : 22/01/2013
 Date du premier décaissement : 31/03/2013

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :S PDRIK II

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Aménagement en maîtrise en total au niveau périmètres G/H	Ha	680	
Aménagement de bas-fonds	Ha		
Pistes rurales	km	90	
Ouvrage (pont) sur le daroumé			
Forage équipé (pompage solaire et manuel)	Nbre	30 (10 et 20)	

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : source PDRIK II.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	1 440	866	60,11
- Equipement – investissement :			
B. Autofinancement :	0	0	0
C. Autres (populations/collectivités)	0	0	0
Total financement intérieur	1 440	866	60,11
Financement extérieur :			
- BID	10 560	1350	12,79
Total financement extérieur	10 560	1350	12,79
TOTAL DES FINANCEMENTS	12 000	2216	18,47

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

La phase II du projet contribuera à la réduction de la pauvreté et à l'atteinte de la sécurité alimentaire à travers les activités suivantes:

- la vulgarisation de techniques novatrices de la riziculture dans les bas-fonds aménagés ;
- la vulgarisation d'itinéraires techniques de production du maïs ;
- la formation en technique de riziculture irriguée ;
- la formation des femmes en techniques de production maraichères ;
- la fourniture d'eau potable à travers les forages réalisés.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

Agence de Développement Rural de la vallée du fleuve Sénégal

CONTRAT PLAN ETAT – ADRS - PRODUCTEURS



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2918

1.1. Adresse du projet :	Tél/FAX : 21 57 39 68 Email : addy@cefib.com / paddyelimane@yahoo.fr
1.2. Zones d'intervention:	Région de Kayes, Cercles Kita, Bafoulabé, Yélimané
1.3. Secteur et Sous-secteur :	Economie rurale/ Agriculture
1.4. Bailleurs :	GRM
1.5. Coût du projet :	425 millions de F CFA
1.6. Nature du financement :	Budget national
1.7. Modalité d'appui :	Aide projet
1.8. Durée du Projet:	3 ans (2015-2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Les objectifs du contrat plan sont entre autres :

- Promouvoir les aménagements hydroagricoles ;
- Intensifier et diversifier les cultures ;
- Structurer les organisations paysannes, renforcer leur capacité et de celles de l'encadrement ;
- Promouvoir et développer les activités en faveur des femmes et des jeunes ;
- Entretien et améliorer les infrastructures hydrauliques existantes ;
- Améliorer les conditions de travail du personnel de l'ADRS ;
- Améliorer le cadre environnemental de la zone d'intervention de l'ADRS ;
- Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat, des collectivités, des ONG et autres bailleurs de fonds.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures nationales

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l'administration de l'Agence

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature	:	17/08/2015
	Date de mise en vigueur	:	01/01/2016
	Date de premier décaissement	:	14/10/2016

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Réhabilitation de la cité ADRS Manantali	Nombre	1	1
Travaux de réalisation des bas-fonds de Kéniéba	ha		
Entretien du réseau hydraulique du périmètre G/H et B	ml		

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source ADRS.

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	425	11	2,6%
Total financement intérieur	425	11	2,6%
Total des financements	425	11	2,6%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'ADRS à travers l'amélioration de la production et de la productivité impacte positivement sur les conditions de vie des populations de sa zone d'intervention.

Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

Agence de Développement Rural de la vallée du fleuve Sénégal

PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE YELIMANE PHASE 2 (PADDY II)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2914

- 1.1. Adresse du projet :** Tél/FAX : 21 57 39 68
Email : addy@cefib.com / paddyelimane@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Kayes, Cercle de Yélimané
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM et partenaires
- 1.5. Coût du projet :** 6 157 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2016-2020)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global du projet est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en céréales et à la réduction de la pauvreté des populations dans le cercle de Yélimané

Les objectifs spécifiques sont:

- Augmenter la production et la productivité des céréales grâce aux aménagements hydroagricoles et aux activités de diversification
- Contribuer à la réduction de l'exode rurale et à l'immigration des jeunes ;
- Contribuer au renforcement des capacités des collectivités territoriales et des migrants ;
- Contribuer à la protection de l'environnement à travers la plantation des arbres et des techniques de restauration et de conservation des sols.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable pour le moment

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l'administration de l'ADRS

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature	:	12/05/2015
	Date de mise en vigueur	:	01/01/2016
	Date de premier décaissement	:	21/06/2016

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Aménagements hydro agricoles et pastoraux			
1- Aménagements hydro agricoles			
Aménagement de plaines en submersion contrôlées	Ha	3 810	
Aménagement de bas-fonds	Ha	2 000	
2- Aménagements pastoraux			
Aménagement et réhabilitation de mares	Nbre	10	
Aménagement de petites retenues d'eau	Nbre	0	
Protection et régénération du milieu			
1- réalisation de digues filtrantes et cordons pierreux			
Protection de berges et terres contre l'érosion hydrique	km	15	

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PADDY II.

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	75	75	100%
Total financement intérieur	75	75	0
Total des financements	6 157	75	0,012

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

La protection et la régénération participent à la restauration, au maintien et au renforcement du potentiel productif. Couplées à l'extension des superficies de production et à une bonne maîtrise des techniques innovantes de production, les producteurs cibles verront certainement leur rendement amélioré et leur revenu augmenté.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

Projet d'Appui à la Stratégie Nationale de Développement de l'Irrigation (PASNDI) 3^{ème} phase dans la région de Kayes



I. DESCRIPTION DU PROJET:

- 1.1. Adresse du projet :** Direction Nationale du Génie Rural, BP 156
Rue Mohamed V Tél : 20 22 58 50/ 11 34 Email : dngr@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention :** Région de Kayes, cercle de Kayes, Communes rurales de Tafacirga, Kolimbiné, Bangassi et de Samè Diongoma
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/agriculture
- 1.4. Bailleurs :** Coopération Espagnole
- 1.5. Coût du projet :** 1 442 millions de francs CFA pour la phase 3
- 1.6. Nature du financement :** Subvention et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet/Programme :** 3 ans (2014-2016) avec prolongation jusqu'en juin 2018
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** Le projet s'inscrit dans la continuation des phases précédentes et visent à appuyer le Gouvernement du Mali à mettre en œuvre sa Stratégie Nationale de Développement de l'Irrigation.
L'objectif général est de tester les approches du SDI de la région de Kayes et contribuer de façon durable à l'augmentation de la production vivrière et maraîchère de la zone du projet.
Les objectifs spécifiques sont d'améliorer et baliser au moyen des aménagements pilotes, le SDI de la région de Kayes ; améliorer les productions rizicoles et maraîchères des sites à aménager ; améliorer les revenus des producteurs encadrés sur les sites aménagés ; compléter la base de données sur l'irrigation dans la région grâce à l'acquisition et le traitement de nouvelles images satellitaires couvrant les cercles de Diéma et de Nioro ; enrichir les propositions du schéma directeur avec une meilleure prise en compte de ces deux cercles ; compléter les activités de renforcement des capacités de tous les acteurs concernés par rapport à l'exploitation du système d'information géographique mise en place pendant la 2^{ème} phase ; et enfin compléter les équipements nécessaires au génie rural pour assurer l'exploitation et l'actualisation du schéma directeur.
- 1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international :** Procédures nationales
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion intégrée dans l'administration

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1 Dates :

- Signature : 23 novembre 2011
- Mise en vigueur : 15 janvier 2014
- Prolongation au 30 juin 2018 :
- Premier décaissement : 02 avril 2014

2.2 Etat de passation des marchés :

Intitulé du marché	Dates de lancement du marché	Date de signature
Travaux de construction des bureaux du projet à la DRGR de Kayes	Octobre 2014	décembre 2014
Etudes d'actualisation des APD et d'élaboration des DAO pour la réalisation des travaux d'aménagement de cinq (5) bas-fonds	15 juillet 2014	avril 2015
Etudes d'APD et élaboration des DAO pour la réalisation des travaux d'aménagement de PIV à Kayes	15 juillet 2014	avril 2015
Etudes d'aménagement des bassins versants de cinq (5) bas-fonds	15 juillet 2014	Mai 2015
Les travaux d'aménagement de 4 bas-fonds (Baldinkare, Niodougou, Sinsikoura, Waiguilou) et de 3 périmètres irrigués villageois (Bangassi, Goundiamou, Sangalou) dans la région de Kayes dans le cadre du PASNDI-3 ^{ème} phase repartis en deux lots: <ul style="list-style-type: none"> • LOT 01 : quatre bas-fonds (Baldinkare, Niodougou, Sinsikoura, Waiguilou) ; • LOT 02 : trois périmètres irrigués villageois (Bangassi Gopela, Goundiamou, Sangalou) 	18 mars 2016	<ul style="list-style-type: none"> • 18 juillet 2016 pour le lot 2 : • et 20 juillet 2016 pour le lot 1
Contrôle et Surveillance des travaux d'aménagement de quatre bas-fonds (Baldinkare, Niodougou, Sinsikoura, Waiguilou) et de trois périmètres irrigués villageois (Bangassi, Goundiamou, Sangalou) dans la région de Kayes dans le cadre du PASNDI-3 ^{ème} phase	23 mars 2016	19 novembre 2016
Audit financier du PASNDI-3 ^{ème} phase sur la période de janvier 2014 à décembre 2015	6 juillet 2016	19 décembre 2016

2.3. Situation d'exécution financière : du démarrage du projet au 31/12/2016 (en millions de FCFA)

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissement au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :			
-Bailleur n°1	1 374	782	57
Total financement extérieur	1 374	782	57
Total des financements	1 374	782	57

Commentaires : les activités se déroulent correctement et l'année 2017 est prévue pour être une année charnière qui permettra de réaliser les travaux d'investissement avec une incidence significative sur le taux de décaissement et la formulation d'une nouvelle phase pour le PASNDI.

2.3 Appréciation sur la Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la Pauvreté :

Le PASNDI contribue à la réduction de la pauvreté par l'augmentation de la production rizicole et horticole à travers le renforcement des capacités institutionnelles de la DNGR et de la DRGR ; la création d'emplois permanents et temporaires (création 12 emplois permanents et près de 100 emplois non permanent).

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES DANS LA ZONE DE KAYES-SUD (PADEPA-KS)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2322

- 1.1. Adresse du projet :** Siège Kita/Antenne Bamako, Tél : 20 23 97 77
Email : padepa@afribone.net.ml
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Kayes, Cercles de Kita, Kayes, Kéniéba et Bafoulabé
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale / Elevage
- 1.4. Bailleurs :** BAD, GRM et Bénéficiaires
- 1.5. Coût total :** 17 768 millions de F CFA
- 1.6. Nature et sources de financement :** Prêt et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 8 ans (2008-2017) prorogé deux fois (2015, 2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
L'objectif du projet est de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à l'allègement de la pauvreté. L'objectif spécifique est de contribuer durablement à l'augmentation des productions animales et des revenus des agro éleveurs de la zone de Kayes Sud. Les trois composantes du projet sont : (A) l'amélioration des systèmes de productions animale, (B) les infrastructures de production et de commercialisation et (C) la gestion du projet.
La logique d'intervention du projet est le faire faire à travers des conventions de mise en œuvre avec les structures nationales comme l'IER, la DNPIA, la DNSV, la DNS, l'AEED et le LCV.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Procédures du bailleur
- 1.11. Type d'unité de gestion :** Unité de gestion parallèle à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature:	07/05/2007
	Date de mise en vigueur :	10/01/2008
	Date de premier décaissement :	31/08/2008

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 : Source PADEPA-KS

SPECIFICATION/DESIGNATION	UNITE	NIVEAU CIBLE DU PROJET	REALISATIONS CUMUL AU 31/12/2016
Acquisition d'équipements de froid	Nbre	227	227
Acquisition d'équipements vétérinaires (Trousses)	Nbre	40	40
Laboratoire Vétérinaire Régional et équipement	Lot	1	1
Acquisition d'équipements et matériels d'apiculture	Lot	1	1
Introduction de noyaux de zébus maure (1 noyau = 1 géniteur + 3 génisses)	Nbre	96	96
Introduction de géniteurs N'Dama	Nbre	200	200
Introduction de noyaux Djallonké (1 noyau = 1 bélier + 4 brébis)	Nbre	40	40
Introduction coq « Wassachè »	Nbre	291	291
Introduction d'unités de production de poussins « Wassachè » (1 Unité= 2 coq + 11 poules)	Nbre	144	63
Introduction d'unités de finition de poulets « Wassa chè » (1 Unité = 30 ou 50 poulets)	Nbre	352	160
DRPIA, DRSV, SLPIA, Secteur Vétérinaire, UAPIA, Poste Vétérinaire	Nbre	1, 1, 1,4, 4, 17, 17	1, 1, 1, 4, 4, 17, 16
Plateformes multifonctionnelle	Nbre	12	12
Axe de transhumance	Km	825	825
Mise en défens	Km ²	32	32
Parc de vaccination, Aire d'abattage, Marché à bétail, Magasin de stockage, Mini laiterie	Nbre	32, 31, 10, 14,2	32,30, 10, 14, 0
Forages, Contre puits, SHPA, Mares	Nbre	16, 16, 20, 12	16, 8, 11, 11
Pistes rurales	Km	130	117

NB : Le projet est opérationnel à travers les conventions signées avec les services techniques suivants IER, DNPIA, DNSV, DNS, AEDD et LCV.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: Source PADEPA-KS

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	6 530	4 980	76
Total financement intérieur	724	486	76
Financement extérieur :			
-Bailleur n°1 BAD	11 238	10 868	97
Total financement extérieur	11 238	10 868	97
Total des financements	1883	1066	89

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le PADEPA-KS contribue à la réduction de la pauvreté à travers des actions de sécurisation et l'intensification de la production animale ; de renforcement des capacités ; d'accroissement des revenus des populations cibles ; de diversification des sources des revenus et de création des emplois.

REGION DE KOULIKORO



Ministère de l'Agriculture

Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda

CONTRAT PLAN ETAT PRODUCTEUR OPIB 2^{ème} (Contrat-Plan)

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2856

- 1.1. Adresse du projet :** BP 06, Baguinéda
Tél/fax : 20 22 71 92 / 20 23 29 56
Email : opib@opib.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Koulikoro, cercle de Kati
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet (CP) :** 211 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2015-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

L'objectif global de ce contrat plan est :

- d'augmenter et de sécuriser la production de riz du périmètre irrigué de Baguinéda et
- de lutter contre l'exode rural saisonnier.

Les activités suivantes sont réalisées par l'Office :

- le curage des canaux d'irrigation et le faucardage des herbes ;
- le nettoyage de la cunette du bief amont et aval ;
- le terrassement et la réhabilitation des abreuvoirs ;
- l'enlèvement des plantes aquatiques ;
- l'entretien de la route fermière et
- la construction d'un bâtiment à usage de bureau.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré directement par la structure

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1. Dates :** Date de signature du contrat plan: 17/02/2012
Date du premier décaissement : 03/02/2012

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Curage du canal principal	Km	18	5
Faucardage des herbes du canal principal	Km	87	19
Nettoyage du canal principal	Km	37	22
Entretien de la digue route	Km	-	2
Faucardage du canal de Tanima	Km	15	6
Faucardage du canal de Sienkoro	Km	15	6

Entretien des drains principaux	Km	81	24
---------------------------------	----	----	----

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source OPIB.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
Budget national :			
- Equipement – investissement:	2 111	1 823	86%
Autofinancement :			
Autres (populations/collectivités)			
Total financement intérieur	2 111	1 823	86%
TOTAL DES FINANCEMENTS	2 111	1 823	86%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet a permis d'assurer la production de 31 648 tonnes de riz en période d'hivernage, 1 550 tonnes de riz en contre saison, 4 923 tonnes d'oignons et 6 109 tonnes de tomate; ce qui correspond respectivement à des accroissements de production de 44, 94, 232 et de 49 % par rapport à la campagne de 2007. De plus, les aménagements ont permis la production de 298 tonnes de maïs de contre saison et de 2 411 tonnes de gombos. En outre, les travaux d'entretiens des canaux, drains et bâtiments ont généré des emplois à des jeunes ruraux pour un montant de plus de 30 millions de F CFA. Avec ces emplois rémunérés, le projet a contribué à la lutte contre la pauvreté et a réduit sensiblement l'exode vers la ville de Bamako.

Ministère de l'Agriculture

Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda

Projet d'Amélioration du Système d'Irrigation du Périmètre de Baguinéda

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2856

- 1.1. Adresse du projet :** BP 06, Baguinéda, Tél/fax : 20 22 71 92 / 20 23 29 56,
Email : opib@opib.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Koulikoro, cercle de Kati
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet (CP) :** 100 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2015-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** l'objectif global du projet d'amélioration du système de l'irrigation du périmètre de Baguinéda a comme objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par l'accroissement de la production et de la productivité.
L'objectif spécifique est d'améliorer l'irrigation du périmètre à travers le revêtement des canaux primaire de Tanima et de Senkoro soit 7,10 Km pour Tanima et 4,9 km pour Senkoro, totalisant ainsi 12 Km.
Le détail des travaux consiste à :
- nettoyer et ré profiler les canaux existants ;
 - mettre en place du géotextile ;
 - mettre en place du film polyane et les armatures ;
 - faire le coulage du béton de radier dosé à 350 kg/m³ ;
 - faire le coulage du béton des talus dosé à 350 kg/m³ ;
 - l'arasement ou le rechargement des cavaliers conformément à la cote projet définie.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Non applicable
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Projet géré directement par la structure
- 2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :**

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Réhabilitation de canaux existants	Km	12	

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source OPIB.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
Budget national :	100	50	50
Total financement intérieur	100	50	50
TOTAL DES FINANCEMENTS	100	50	50

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté : le projet permettra d'améliorer l'irrigation de 464 ha qui représentent 15% de l'ensemble du périmètre. Il assurera l'augmentation de la production et de la productivité sur cette superficie. Ces investissements peuvent avoir un rendement additionnel pour le riz de 240 kg/ha en hivernage et 671 kg/ha en contre saison soit 911 Kg/ha et une production additionnelle de 422 704 Kg/ha sur les 464 Ha.

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale de la Pêche

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ET DE LA PISCICULTURE EN ZONE OHVN



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2323 PDPP-OHVN

- 1.1. Adresse du projet :** BP 155, S/C DNP Bamako
Tél : 20 22 76 77 ; Fax : 20 22 52 30
Email : dnp@datatech.net.ml
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Koulikoro, cercles de Kati, Koulikoro et Kangaba
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/Pêche
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 1 529 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 10 ans (2007-2016)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** l'objectif global est de développer la pêche et la pisciculture par l'aménagement des pêcheries dans la zone de l'Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN). Plus spécifiquement, ce programme vise à (i) augmenter la production piscicole ; (ii) améliorer la qualité du produit (poisson frais) sur le marché ; (iii) augmenter les revenus des acteurs de la filière pêche ; (iv) Mieux valoriser les mares du point de vue piscicole et (v) Renforcer les capacités des acteurs du sous-secteur pêche.
- Il repose sur les composantes suivantes : (A) Etablissement de la situation de référence, (B) Organisation des acteurs, (C) Aménagement des pêcheries et construction des étangs, (D) Crédits et équipements, (E) Communication, (F) Renforcement des capacités, (G) Suivi évaluation et (H) Gestion du programme.
- Les principales activités portent sur l'appui en matériel, le surcreusement des mares et la construction de marchés et de magasins.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédures nationales
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Non applicable (projet géré directement par la DNP).

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

Projet d'Appui au Développement de l'élevage du Zébu Maure dans le cercle de Nara (PRODEZEM)



I. DESCRIPTION DU PROJET: 2488

1.1. Adresse du projet :

Quartier Météo Nara

Tel : 78 94 38 40 ; 79 28 45 56 ; 76 38 03 88

Email : zebu@prodezem.org

1.2. Zones d'intervention:

Région de Koulikoro, cercle de Nara

1.3. Secteur et Sous-secteur :

Economie rurale/ Elevage

1.4. Bailleurs :

Belgique, GRM

1.5. Coût Total :

5 775 millions de F CFA

1.6. Nature du financement :

Subvention

1.7. Modalité d'appui :

Aide projet

1.8. Durée du Projet:

7 ans (2010-2016)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le projet a pour objectif général de renforcer la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans le cercle de Nara. Spécifiquement, il s'agit d'améliorer la productivité des systèmes d'élevages dans le cercle de Nara grâce à l'amélioration des conditions d'élevage et à la sélection du Zébu Maure.

Les actions porteront sur l'amélioration de l'accès aux ressources pastorales, de la gestion technique des élevages traditionnels, de la capacité des acteurs institutionnels locaux, l'organisation efficace de la commercialisation et la préservation et la sélection du Zébu Maure.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur.

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité parallèle à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de la convention :	08/09/2009
	Date de mise en vigueur :	03/02/2010
	Date de premier décaissement :	18/03/2010

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Réhabiliter les périmètres pastoraux	Nbre	5	3
Créer de nouveaux périmètres	Nbre	3	3
Plantation de panneaux de sensibilisation sur les feux de brousse	Nbre	50	30
Installer et équiper les Cabinets vétérinaires Ruraux	Nbre	3	5
Construire et équiper banques d'Aliment bétail construites	Nbre	12	11
Ravitailer les 11 banques en aliment bétail	Nbre	1000	320
Doter les ménages vulnérables en noyaux d'élevage et en charrettes	Nbre	500	500
Construire 7 parcs polyvalents	Nbre	7	7
Construire le siège de la DLCA	Nbre	1	1
Réhabiliter 3 aires d'abattage et une boucherie	Nbre	4	0
Réhabiliter une mini laiterie la construction d'une laiterie	Nbre	2	0
Construire un marché à bétail et un séchoir	Nbre	2	0


2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source Coordination projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
D. Budget national :			
- Equipement – investissement :	525	386	74
E. Autofinancement :			
F. Autres (populations/collectivité)			
Total financement intérieur	525	386	74
Financement extérieur :			
- Bailleur : Belgique	5 250	5 061	97
Total financement extérieur	5 250	5 061	97
TOTAL DES FINANCEMENTS	5 775	5 061	95

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Les actions du projet (les forages, les périmètres pastoraux, les banques d'aliment bétail, les cabinets vétérinaires Ruraux, la dotation des ménages vulnérables en noyaux d'élevage et en charrettes, la réalisation de parcs polyvalents, d'aires d'abattage, de boucherie, de marché à bétail contribuent directement à l'amélioration de la productivité des systèmes d'élevage et les conditions de vie des communautés pastorales.

Programme de Lutte Contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les Cercles de Nara et Nioro (PLIAM)

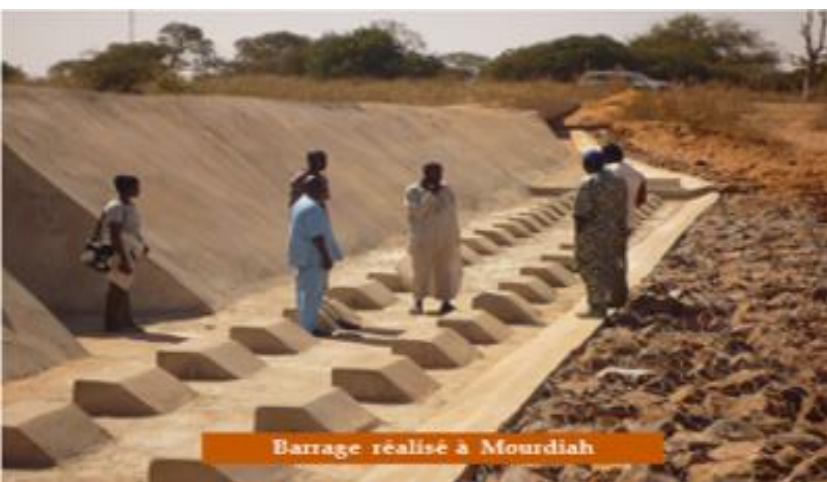

I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: RNP SN

- 1.1. Adresse du projet :** BP : 1748 Bamako, Tél : 20 21 39 53 fax : 20 21 74 19
- 1.2. Zones d'intervention :** Régions : Koulikoro (Nara) et Kayes (Nioro)
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Sécurité alimentaire et nutritionnelle
- 1.4. Bailleurs :** Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA)
- 1.5. Coût du projet :** 10 352 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet :** 5 ans (2012_ 2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** la tutelle du Programme est assurée par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) qui en assure aussi la responsabilité de la coordination avec l'appui technique de la FAO. Cinq Organisations Non Gouvernementales Belges et ses partenaires nationaux et deux agences du système des Nations Unies (UNCDF et ONU Femmes) assurent la mise en œuvre dudit Programme. Il est attendu du programme une amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables au niveau des cercles de Nara et Nioro du Sahel, en favorisant leur accès aux facteurs de production, technologies et marchés et en renforçant les capacités des acteurs locaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans le développement local.»
- Les objectifs spécifiques sont (i) Améliorer les revenus et l'accès aux marchés pour les petits producteurs et groupes vulnérables, (ii) Favoriser un accès durable à une alimentation équilibrée et saine et aux services et infrastructures de base pour les groupes vulnérables, (iii) Renforcer les capacités des acteurs pour l'analyse, la planification, la mise en œuvre et la coordination de stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au niveau national, local et du programme.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Procédures des bailleurs de fonds
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** La coordination nationale et les partenaires d'exécution

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de la convention :	Janvier 2012
	Date de mise en vigueur :	Février 2012
	Date de premier décaissement :	Janvier 2012

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016:

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Banque de céréales	Nbre		10
Aménagement hydro agricole (barrage)	Nbre		6
Parc de vaccination	Nbre		1
Réhabilitation de centres de santé	Nbre		3
Parc de vaccination	Nbre		1
Périmètre maraicher	Ha		7.5
Complexe marché à bétail	Nbre		2
Aire d'abattage	Nbre		1
Unité de production de bio pesticide	Nbre		2
Kits scolaires et leurs équipements	Nbre		10
Unités de caprins (1 male et 3 femelles)	Nbre		520
Approvisionnement des banques de céréales	Nbre		15



2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source ; Rapports PLIAM

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :	0	0	0
- Equipement -investissement			
-PSTE :			
B. Autofinancement :	2 520	2520	100
C. Autres :(Populations/Collectivités)			
Total financement intérieur	2520	2520	100%
Financement extérieur	7832	7025	89
-Bailleur n°1 : FBSA			
Total financement extérieur	7832	7025	89
Total des financements	10 352	9 545	92

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Les actions du PLIAM contribuent à améliorer les revenus des ménages, leur état sanitaire et nutritionnels et les capacités renforcées dans toutes les composantes. Un aspect de prise du genre a été abordé par toutes les composantes. Les composantes ont en ce qui les concerne menées les activités d'appui aux groupes vulnérables, aux banques alimenta bétail, aux cabinets vétérinaires de proximité, de l'identification du premier cycle des infrastructures de sécurité alimentaire. La coordination veille à l'aspect synergie, communication et autres pour une meilleure coordination du Programme sous la responsabilité du CSA.

REGION DE SIKASSO



Ministère de l'Agriculture

Secrétariat Général

PROGRAMME D'APPUI AUX FILIERES AGROPASTORALES DE SIKASSO (PAFA)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Direction du développement
et de la coopération DDC

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN

- 1.1. Adresse du projet :** Avenue du cinquantenaire, Immeuble Diaby,
Porte : 666 Médine Sikasso
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Sikasso
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / agriculture et élevage
- 1.4. Bailleurs :** Confédération suisse
- 1.5. Coût total :** 9 000 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Don
- 1.7. Modalité d'appui :** Procédures du mandataire et du Mali
- 1.8. Durée du Projet:** 4 ans (2016 - 2019)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Redynamiser l'économie régionale en accord avec la stratégie du conseil régional en appuyant l'intégralité de deux filières porteuses : le lait local et la pomme de terre. Le programme s'attache à renforcer les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés de l'Etat afin qu'ils renforcent ces filières sur leur territoire.

Les résultats attendus sont (1) les collectivités territoriales, les services techniques étatiques et les prestataires indépendants sont renforcés ; (2) les mécanismes d'investissements structurants et productifs sont établis et opérationnels ; (3) la maîtrise des marchés de produits régionaux est renforcée ; (4) la filière pomme de terre est développée et (5) la filière lait est développée

Le contexte institutionnel du PAFA est marqué par une approche multi acteurs avec dont les relations sont en constante évolution. Les entités en relation avec le PAFA, outre LuxDev et la DDC, sont le Conseil Régional (CR) et certaines autres collectivités territoriales, les services techniques déconcentrés (STD) et l'ADR (Agence de Développement Régional).

Le CR de Sikasso est un acteur direct du programme. Une partie importante des dépenses d'investissement, sont sous sa maîtrise d'ouvrage est prévue suivant la modalité de l'ABS-D, où le président du CR tient le rôle d'ordonnateur.

- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédures du bailleur et du Mali
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion autonome

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de la signature :	05/05/2016
	Date de mise en vigueur :	01/07/2016
	Date de décaissement :	04/07/2016

2.2. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PAFA Sikasso

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Montant des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :	380	380	100
Total financement extérieur	380	380	100
TOTAL DES FINANCEMENTS	380	380	100

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Initiation du développement de la production de la pomme de terre et de la structuration des maillons de la filière pomme de terre.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DANS LA REGION DE SIKASSO - PAHA



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2964

1.1. Adresse du projet :	DRGR Sikasso
1.2. Zones d'intervention:	Région de Sikasso
1.3. Secteur et Sous-secteur :	Economie rurale / Agriculture
1.4. Bailleurs :	GRM
1.5. Coût total :	10 milliard F CFA
1.6. Nature du financement :	Budget Spécial d'Investissement
1.7. Modalité d'appui :	aide projet
1.8. Durée du Projet:	4 ans (2015 - 2018)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le projet contribue à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et au développement économique de la région de Sikasso. Spécifiquement, il vise à favoriser l'augmentation, la valorisation et la commercialisation des productions agricoles. Les résultats attendus sont :

- le potentiel agricole des terres aménagées a augmenté ;
- les conditions favorables à l'émergence des producteurs sont réalisées;
- les activités génératrices de revenus à travers la production et la transformation des produits agricoles sont améliorées ;
- la capacité des bénéficiaires dans la gestion et la maintenance des infrastructures est renforcée.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures nationales

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion : DRB et DRGR

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de la signature de la convention spécifique:	03/12/2010
	Date de mise en vigueur :	01/04/2011
	Date de décaissement :	21/04/2011

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Réalisation de barrages	Nbre	59	9
Réalisation de parcs de vaccination	Nbre		13
Réalisation d'aires d'abattage	Nbre		11
Réalisation d'Etangs piscicoles	Nbre		0
Réhabilitation de périmètre rizicole	Nbre		0
Réalisation de ponts	Nbre		0
Réalisation de périmètre maraicher	Nbre		5
Réalisation de ponts-barrage	Nbre		0

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PAHA Sikasso

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
B. Budget national :	7 000	4 978	71,1
- Equipement – investissement :			
C. Autofinancement :			
D. Autres (populations/collectivités)			
Total financement intérieur	7 000	4 978	71,1
TOTAL DES FINANCEMENTS	7 000	4 978	71,1

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet contribue à l'amélioration de la production des cultures maraichères, du riz de saison et de contre saison, de l'abreuvement des animaux et de la pisciculture au niveau des retenues. Ce qui a eu un impact positif sur la réduction de la pauvreté à travers l'état nutritionnel des populations et la diversification des activités génératrices de revenus.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

IRRIGATION DE PROXIMITE-INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE PAR L'IRRIGATION ET A GESTION APPROPRIEE DES RESSOURCES (IPRO-IRRIGAR) /COMPOSANTE-SIKASSO



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN

- 1.1. Adresse du projet :** Avenue du 50^{tenaire}, Immeuble Diaby, Porte : 666 Médine Sikasso
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Sikasso
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / agriculture
- 1.4. Bailleurs :** UE et Coopération allemande
- 1.5. Coût total :** 5 071 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Procédures des bailleurs
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2014 - 2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

Le projet s'inscrit dans le cadre du Programme National d'Irrigation de Proximité (PNIP) en participant aux efforts du gouvernement dans sa stratégie de développement de l'irrigation. Il vise à renforcer la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel des populations par l'accroissement et la diversification de la production agricole et l'amélioration de l'accessibilité aux produits issus de l'irrigation de proximité.

A travers la réalisation de nouveaux aménagements et la réhabilitation des aménagements existants, le projet améliore la production et la productivité. Le projet réalise également des pistes rurales pour faciliter la mobilité, l'approvisionnement en intrants des zones de production et la mise sur le marché des produits agricoles.

En outre, les actions de diversification comme la culture de la pomme de terre, le renforcement des capacités des femmes sur la production de farines enrichies et l'étuvage du riz et la promotion de la pisciculture constituent des éléments clés de l'offre du projet en matière d'amélioration de l'état nutritionnel des populations.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur (cogestion)

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion autonome

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de la signature :	06/05/2014
	Date de mise en vigueur :	06/05/2014
	Date de décaissement :	09/10/2014

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Aménagement Hydro-agricole	Nbre	25	25
Réhabilitation d'Aménagement Hydro-agricole	Nbre	5	4
Réalisation de pistes rurales	Km	25	19
Empoisonnement des retenues	Nbre	10	13
Achat d'alevins	Nbre	40 000	51 400
Introduction de four de fumage du poisson	Nbre	10	10

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source IPRO-IRRIGAR Sikasso

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :	5 071	3 805	75
Total financement extérieur	5 071	3 805	75
TOTAL DES FINANCEMENTS	5 071	3 805	75

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet a contribué à la réduction de la pauvreté par l'amélioration des productions et de la productivité. L'état nutritionnel des populations a été amélioré par la pisciculture, la culture des pommes de terre et le renforcement des capacités des femmes sur la production de farines enrichies et l'étuvage du riz.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale de l'Agriculture

Projet de Commercialisation et de Transformation de l'anacarde dans la Région de Sikasso (PCTARS)



I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: SN RNP

- 1.1. Adresse du projet :** S/C DNA BP : 1098 Bamako Tél : 20 22 28 77/ 20 22 40 36
Email : kongobaba57@yahoo.fr /
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Sikasso (Bougouni, Yanfolila et Kolondiéba)
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / agriculture
- 1.4. Bailleurs :** Coopération Espagnole, GRM
- 1.5. Coût Total :** 4 763 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2010-2014)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global du projet est la création de richesse en milieu rural et la souveraineté alimentaire dans la région de Sikasso. Les objectifs spécifiques sont : (i) améliorer les revenus de producteurs d'anacardes à travers l'organisation du circuit de commercialisation de la noix brute de cajou, (ii) créer la richesse locale et la souveraineté alimentaire à travers l'amélioration de la capacité de transformation de la région pour la vente locale et national.

Le projet veut promouvoir l'organisation du circuit commercial de l'anacarde dans la région de Sikasso et la professionnalisation des acteurs associés dans des groupements de producteurs et de commerçants. Par ailleurs, le projet veut stimuler la transformation des produits de l'anacarde à travers le renforcement des groupements (surtout des femmes transformatrices), de l'équipement en technologie locale de transformation et de l'accompagnement en termes de gestion et de recherche de marchés.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de coordination du projet intégrée à l'Administration

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de l'accord de don :	16/07/2010
	Date de mise en vigueur :	25/07/2010
	Date de premier décaissement :	26/07/2010

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Centres de collecte de noix d'anacarde	Nbre	21	NC
Construction de magasins	Nbre	21	7
Equipements de magasins	Nbre	21	14
Création de centres communaux de transformations des sous-produits	Nbre	21	25
Etude de marchés	Nbre	2	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source Unité de Gestion du Projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	0	0	0
A. Autres (populations/collectivités)	6	6	100
Total financement intérieur	6	6	100
Financement extérieur :			
- Bailleur : Gouvernement du Japon	4 386	4 386	100
Total financement extérieur	4 386	4 386	100
TOTAL DES FINANCEMENTS	4 386	4 386	100

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet CTARS contribue à la réduction de la pauvreté à travers les actions suivantes :

- la mise en valeur de l'anacarde et de la noix de cajou ;
- la construction des centres de collecte de noix de cajou ;
- la construction de magasins de stockage ;
- l'appui à la transformation,
- l'appui à la commercialisation (études de marchés).

Ministère de l'Agriculture

Institut d'Economie Rurale

PROJET AMELIORATION DURABLE DE LA PRODUCTIVITE DE LA COMPETITIVITE DU RIZ PLUVIAL ET DE BAS-FONDS DANS LA REGION DE SIKASSO AU MALI



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN

- 1.1. Adresse du projet :** CRRRA Sikasso, BP 16
1.2. Zones d'intervention: Région de Sikasso
1.3. Secteur et Sous-secteur : Economie rurale / agriculture
1.4. Bailleurs : GRM et AGRA
1.5. Coût total : 448 millions de F CFA
1.6. Nature du financement : Subvention
1.7. Modalité d'appui : Procédures du bailleur
1.8. Durée du Projet: 3 ans (2014 - 2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Augmenter la production du riz et le revenu des 3 000 petits exploitants dans la région de Sikasso. Le projet facilite l'accès des producteurs en équipements agricoles (faucheuses, batteuses, bâches, échelle de poids lourds). Il réalise également des aires de séchage du riz dans différents cercles de la région en vue d'améliorer la qualité du produit. Il diffuse la technologie de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) et des variétés améliorées de riz.

Un des axes majeurs de son intervention porte en outre sur le renforcement de capacités des OP à travers de nombreuses formations (étuvage, leadership, etc.).

- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédures du bailleur
1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de la signature :	13/06/2014
	Date de mise en vigueur :	31/07/2014
	Date de décaissement :	25/07/2014

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Construction aires de séchage du riz	Nbre	4	4
Achat équipements de transformation du riz (batteuse, échelle de poids lourd, faucheuse, etc.)	Nbre	5	5

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source IPRO-IRRIGAR Sikasso

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	5	5	100
- Equipement – investissement :			
B. Autofinancement :			
C. Autres (populations/collectivités)			
Total financement intérieur	5	5	100
Financement extérieur :	443	358	80,8
Total financement extérieur	443	358	80,8
TOTAL DES FINANCEMENTS	448	363	81

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet contribue à l'augmentation de la production du riz dans la région de Sikasso car les rendements sont passés de 1,5 tonne à 3,5 tonnes à l'hectare avec la pratique (GIFS). Il contribue également à l'amélioration des revenus grâce à l'amélioration de la marge brute à l'hectare.

Ministère de l'Agriculture

Office de Développement Rural de Sélingué

OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE SELINGUE-CONTRAT PLAN (ODRS-CP)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2687

- 1.1. Adresse du projet :** Siège Selingué, Tel : 21 65 02 57 Email : odrs1996@yahoo.fr
Antenne de Bamako : 47, rue Mohamed V, BP 03,
Tél. : 20 65 02 16/ 20 22 54 03. Fax : 20 22 83 08
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Sikasso, cercles de Yanfolila et de Bougouni.
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet (CP) :** 2 050 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** aide programme
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2014-2016)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
Le Contrat Plan permet de financer les activités d'encadrement rural de l'ODRS. La mise à disposition des terres aménagées permet l'augmentation et la sécurisation des productions agricoles des populations de la zone du projet.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Non applicable.
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion du projet intégrée dans l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Date de démarrage : 21/07/2014

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Réseaux d'irrigation entretenus (Primaire et secondaire)	m	102684	166622
Réseaux de drainage entretenu (Primaire et secondaire)	m	57224	104318
Réseaux de circulation entretenus (Primaire et secondaire)	m	14000	7433
Réseaux tertiaires d'irrigation entretenus	m	724544	552639
Réseaux tertiaires de drainage entretenus	m	574861	504702
Production de riz (tous types confondus) paddy	Tonne	81235,5	63013,19
Céréales sèches (maïs, mil, sorgho)	Tonne	146916	96374,86

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement PPTE :	1 650	1 257	76,3
<i>Total financement intérieur</i>	1 650	1 257	76,3
TOTAL DU FINANCEMENT	1 650	1 257	76,3

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le projet a largement contribué à la réduction de la pauvreté eu égard aux différentes réalisations effectuées ayant contribué à l'épanouissement des producteurs de la zone ODRS.

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

Programme de Développement Intégré pour la Réduction de la Pauvreté en Zone ONDY (PDIRP-ONDY)

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1885

- 1.1. Adresse du projet :** S/C DNPIA, Tél : 20 22 20 22 ; Fax : 20 23 12 17
Email : dnpia@dnpia.org / madinadiassa@yahoo.com
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Sikasso, cercle de Yanfolila
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ élevage
- 1.4. Bailleur :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 1 482 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 14 ans (2003-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** l'objectif sectoriel du PRIA-MALI, s'inscrit dans les objectifs prioritaires du Gouvernement malien et vise à renforcer la résilience des agriculteurs, pasteurs, pêcheurs face au changement climatique afin de contribuer à la réduction significative de la pauvreté en réalisant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones arides et semi arides du Mali.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Non applicable
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion du projet intégrée dans l'Administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1. Date :**
- | | |
|--------------------------------|------------|
| Date d'inscription au BSI : | 01/01/2002 |
| Date de démarrage du projet : | 01/01 2003 |
| Date du premier décaissement : | 01/01 2003 |

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Retenue d'eau d'abreuvement et maraîchage	Nombre	8	8
Petits périmètres maraîchers équipés	Nbre	16	16
Plates-formes multifonctionnelles	Nbre	8	8
Marchés à bétail avec forage agropastoral	Nbre	1	1
Bergeries améliorées en banco stabilisé	Nbre	4	4
Batteuses, égreneuses	Nbre	4	4
Presses manuelles à Karité	Nbre	100	100
Charrettes asines	Nbre	100	100
Panneaux d'éclairage solaire	Nbre	60	56

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : source Unité de gestion de projet

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	umul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement	1 482	1 265	85
Total financement intérieur	1 482	1 265	85
TOTAL DES FINANCEMENTS	1 482	1 265	85

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le programme ONDY contribue à la réduction de la pauvreté par la réalisation de mini-barrages qui permettent l'abreuvement d'un plus grand nombre d'animaux (transhumants et sédentaires) et l'amélioration du niveau de la nappe phréatique dans la zone. Les caisses d'épargne et de crédit de proximité facilitent l'accès au crédit pour les activités génératrices de revenus (1 030 bénéficiaires, Organisations Paysannes Féminines (OPF), et Organisation Paysanne des Jeunes Ruraux (OPJR)) et la mobilisation de l'épargne pour l'entretien des infrastructures et équipements. Les 16 périmètres maraichers génèrent des revenus d'une moyenne de 1,4 million de F CFA par an et par périmètre au profit de 1 010 bénéficiaires par la vente de spéculations rentables (échalote, gombo, tomate, riz hivernal).

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale de la Pêche

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AQUACOLE DANS LA REGION DE SIKASSO (PRODEFA- SIKASSO)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2643

1.1. Adresse du projet :	DRP de Sikasso
1.2. Zones d'intervention:	Région de Sikasso
1.3. Secteur et Sous-secteur :	Economie rurale / pêche
1.4. Bailleurs :	Coopération Belge et GRM
1.5. Coût total :	5 528 millions de F CFA
1.6. Nature du financement :	Subvention et budget national
1.7. Modalité d'appui :	Aide projet
1.8. Durée du Projet:	8 ans (2011 - 2018)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le projet contribue à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et au développement économique de la région de Sikasso. Spécifiquement, il vise à favoriser l'augmentation, la valorisation et la commercialisation des productions aquacoles. Les résultats attendus sont :

- le potentiel aquacole des mares et plans d'eau est d'avantage valorisé pour la pisciculture extensive ;
- les conditions optimales pour l'émergence d'une filière professionnelle sont mises en place, y compris en pisciculture intensive ;
- la filière est renforcée en terme de structuration, de capacités des institutions de soutien de la filière et d'articulation entre les acteurs ;
- la gestion des connaissances de la filière est renforcée, capitalisée et diffusée.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures du bailleur (cogestion et régie).

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans la direction régionale de la Pêche.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de la signature de la convention spécifique:	03/12/2010
	Date de mise en vigueur :	01/04/2011
	Date de décaissement :	21/04/2011

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalizations cumulées
Aménagement aquacole	Nbre	15	15
Empoisonnements de plans d'eau	Nbre	230	195
Construction de marché à poisson	Nbre	2	1
Construction de locaux	Nbre	2	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PRODEFA Sikasso

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
E. Budget national :	904	628	66
- Equipement – investissement :			
Total financement intérieur	904	628	66
Financement extérieur :	4 624	3 925	89
Total financement extérieur	4 624	3 925	89
TOTAL DES FINANCEMENTS	5 528	4 524	82

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le PRODEFA Sikasso contribue à la réduction de la pauvreté par :

- (i) la fourniture d'alevins de qualité ;
- (ii) l'empoisonnement des plans d'eau ;
- (iii) l'amélioration du niveau des revenus des bénéficiaires par la vente du poisson issu des plans d'eau.
- (iv) Les villages impliqués dans le projet ont généré une recette de 77 629 755 F CFA à travers la pisciculture communautaire. Ces recettes ont contribué à réaliser des investissements d'intérêts communs (écoles, entretien de marres piscicoles, centre de santé etc.).

REGION DE SEGOU



Ministère de l'Agriculture

Office du Moyen Bani

OFFICE DU MOYEN BANI



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 3008

- 1.1. Adresse du projet :** San Tél/fax : 44 23 53 33 Email : parfaitdako@yahoo.f
- 1.2. Zones d'intervention:** Régions de Ségou, Mopti/ cercles de San, Bla, Djenné, Ségou (33 Communes au total)
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet (CP) :** 350 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 1 an (2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global de l'OMB est d'améliorer les conditions de vie des populations de la zone de l'OMB par l'augmentation de la productivité et les revenus à travers :

- la mise en valeur des aménagements hydro agricoles
- la consolidation des infrastructures et aménagements hydroagricoles
- la réalisation d'appui conseil adapté.
- la valorisation des productions agro-sylvo-pastorale et halieutique

L'Office du Moyen Bani a été créé par Ordonnance N°2016-006 P-RM du 25 février 2016. Pour sa mise en œuvre courant 2017, une feuille de route a été élaborée sur la période janvier à juin. La mise en place du personnel de l'Office est en cours. Pour le moment, l'office ne dispose pas de ressources propres et le budget de l'office pour 2016, 2017 et 2018 sont pris en charge par le budget national. A l'avenir, l'office est appelé à élaborer un contrat plan avec l'Etat et les producteurs.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet intégré à l'administration de l'Office

Ministère de l'Agriculture

Office du Niger

Réhabilitation du Barrage de Markala



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2946

- 1.1. Adresse du projet :** Office du Niger ; Tel : 21 32 02 92
Email : on@on-mali.org , bkone@on-mali.org
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou / Cercle de Ségou / Commune de Markala
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 1 000 millions de F CFA (juillet 2015)
- 1.6. Nature du financement :** Budget National
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 2 ans (2016-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** assurer la durabilité du Barrage de Markala
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Non Applicable
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion intégrée dans l'Administration de l'ON
- 2.2. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 :** Source ON

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National	1 000	1 000	100
Total financement intérieur	1 000	1 000	100
Total des financements	1 000	1 000	100

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le Barrage de Markala est l'ouvrage stratégique qui permet d'irriguer aujourd'hui plus de 130 000 ha dans la zone de l'Office du Niger. Son maintien en bon état de fonctionnement, objet du projet, contribuera spécifiquement à sécuriser et à garantir la production agricole à l'Office du Niger et augmentera implicitement les revenus des Exploitants Agricoles et les offres d'emplois dans la localité.

Ministère de l'Agriculture

Office du Niger

PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE DU CASIER DE MOLODO NORD-PHASE I

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2602

- 1.1. Adresse du projet :** Office du Niger ; BP : 106, Ségou,
Tel : 21 32 01 43 / 66 78 98 68
Email : office@office-du-niger.org.ml / pionkeita@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou, cercle de Niono
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** BOAD et GRM
- 1.5. Coût du projet :** 20 112 millions de F CFA dont 17 500 millions BOAD et 2 612 millions du GRM
- 1.6. Nature du financement :** Prêt et budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 9 ans (2010-2018)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
L'objectif du projet est d'accroître de manière durable la production vivrière tout en améliorant les conditions et le niveau de vie des populations de la zone d'intervention du projet.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Procédure du bailleur.
- 1.11. Type d'unité de gestion du projet :** Unité de gestion intégrée dans l'Administration de l'ON

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1 Dates:**
- | | |
|---|-------------|
| Date de signature de l'Accord de prêt : | 19/02/ 2010 |
| Date de mise en vigueur : | 15/09/2010 |
| Date de premier décaissement : | 21/10/2010 |
| Date limite de mobilisation : | 31/12/2017 |

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 : source ON

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Travaux d'aménagement	Ha	1 500	1500
Construction de 5 magasins villageois	Nbre	5	5
Pistes d'accès village-périmètres	Km	8	8
Construction d'écoles	Nbre	2	2
Réalisation de points d'eau équipés	Nbre	10	10
Construction de 4 villages	Nbre	4	2
Construction de CSCOM	Nbre	1	1
Réalisation de couloirs de passage d'animaux	Km	22	22
Plantation d'arbre	Ha	120	0
Réalisation de l'inventaire forestier	Nbre	1	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : Source ON

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	2 612	1 779	68,1
Total financement intérieur	2 612	1779	68,1
Financement extérieur :			
-Bailleur n°1 : BOAD	17 500	15 160	86,6
Total financement extérieur	17 500	15 160	84,2

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

L'aménagement de 1 500 Ha contribuera à la création d'emplois à travers l'exécution des travaux de mise en valeur des superficies agricoles, à l'accroissement des productions vivrières avec une production additionnelle de 6 000 Tonnes de riz paddy et de 500 Tonnes de produits maraichers par an. Le projet permettra aussi d'améliorer les conditions de vie et le niveau de revenus de 1 000 familles par la réalisation d'infrastructures socio-économiques et la promotion d'activités génératrices de revenus.

Ministère de l'Agriculture

Office du Niger

Programme d'Appui au Contrat Plan de l'Office du Niger (PACOP)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP

- 1.1. Adresse du projet :** Office du Niger ; BP : 106, Ségou,
Tel : 21 32 02 92/ 76 44 36 77 Fax : 21 32 01 43
Email : office@office-du-niger.org.ml / smounkoro@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou/ cercles de Ségou, Niono, Macina/communes de Kokry, Seribala, Diabaly, Kala – Siguida, Markala
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** Pays-Bas
- 1.5. Coût du projet :** 3,159 milliards FCFA
- 1.6. Nature du financement :** Don
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du projet:** (2009-2016)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
L'objectif général est de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire par l'amélioration de la gestion de l'eau et la réhabilitation du casier de Niono. L'objectif spécifique est d'accompagner l'Office du Niger dans la mise en oeuvre des actions prioritaires visant l'atteinte des résultats attendus du Contrat Plan. Les objectifs spécifiques sont de (i) Soutenir la MOD de l'ON pour l'exécution des études et travaux prioritaires de réhabilitation et d'extension dans le respect du planning d'exécution du Contrat Plan ; (ii) Intensifier l'effort d'amélioration de la maîtrise technique et financière de l'entretien des réseaux ; (iii) Rationaliser l'utilisation des ressources hydriques en responsabilisant les usagers de l'eau au niveau tertiaire ; (iv) Poursuivre l'effort d'intensification rizicole, de diversification et de mise en performance des exploitants agricoles ; (v) Favoriser la mise en performance du service informatique et poursuivre l'effort d'informatisation dans le domaine de la gestion.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Non applicable
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Appui budgétaire gestion interne à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de l'accord :	30 novembre 2009
	Date de mise en vigueur :	1 ^{er} décembre 2009
	Date de premier décaissement :	05 décembre 2009

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalizations cumulées
études prioritaires de réhabilitation du réseau et des superficies agricoles	ha	14 090	14 090
étude sur la possibilité de recalibrage du distributeur de Séribala	Km	13	13
Etudes de réhabilitation du réseau primaire de Molodo KIO et BounouBoua	Km	55	55
travaux de réhabilitation et d'extension des aménagements	ha	810	810

Commentaires et observations: les études prioritaires de réhabilitation du réseau et des superficies agricoles sont exécutées ; Les travaux de réhabilitation et d'extension prioritaires sont réalisés de même que les travaux d'urgence sur le réseau primaire sont exécutés. Les compétences des OERT sont renforcées de même que pour les producteurs en GIPD.

Par ailleurs les compétences des exploitants agricoles et des agents de l'ON sont renforcées ; le réseau informatique de l'ON a été normé et un schéma directeur informatique mis en œuvre. Actuellement l'informatisation de la gestion des projets de l'ON est opérationnelle pour au moins 1 projet.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016:

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :	3 159	3 130	99
Total financement extérieur	3 159	3 130	99
TOTAL DES FINANCEMENTS	3 159	3 130	99

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

La réhabilitation d'anciens périmètres (850 hectares) et la disponibilité de nouvelles superficies aménagées ont permis l'amélioration des rendements et une augmentation de la production de riz et du maraîchage. Sur le plan agricole le projet PACOP a permis annuellement une production supplémentaire de plus de 3500 tonnes de riz paddy et des milliers de tonnes de produits maraîchers et de cultures de diversification.

Ministère de l'Agriculture

Office du Niger

Programme d'Appui à la Mise en Œuvre du Contrat Plan de l'Office du Niger (PAMOCP-ON)

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP

- 1.1. Adresse du projet :** Office du Niger ; BP : 106, Ségou,
Tel : 21 32 02 92/ 76 44 36 77 Fax : 21 32 01 43
Email : office@office-du-niger.org.ml / smoukoro@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Office du Niger
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** 10^{ème} FED (Union Européenne)
- 1.5. Coût du projet :** 19, 679 milliards FCFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du projet:** 6 ans (2010-2016)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

Ce projet est financé dans le cadre du 10^e FED. Il comprend un Appui Budgétaire à l'ON, une Assistance Technique, l'aménagement de 2 500 ha dans le casier de M'Béwani (Lot 1), et le prolongement du drain collecteur du Kala Supérieur sur 42 km (Lot 2). La maîtrise d'ouvrage est assurée par le Ministère des Affaires Etrangères.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle à l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1. Dates :** Date de signature de l'accord : 17/12/2009
Date de mise en vigueur : 16/04/2010
Date de premier décaissement : 18/09/2010

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Travaux d'aménagement de 2 500ha	Ha	2 500	2 500
Travaux de réalisation de 42 km de drain	Ha	42	42
Reboisement	Ha	1 000	1 000

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: -

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :			
-Bailleur : UE	19 678	19 678	100%
Total financement extérieur	19 678	19 678	100%
Total des financements	19 678	19 678	100%

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet a contribué, à l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone du projet par l'augmentation de leur revenu, facilité le drainage dans la zone de niono et M'Bewani.

Ministère de l'Agriculture

Office du Niger

Programme d'Appui au Développement de la Zone de l'Office du Niger Phase 2 (PADON 2)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN

- 1.1. Adresse du projet :** Office du Niger ; Tel : 21 32 02 92 / 03 02 Fax : 21 32 01 43
Email : office@office-du-niger.org.ml / Chambre Régionale d'Agriculture de Ségou ; Secrétariat Technique du SDDZON; Tel : 20 74 44 03
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleur :** Agence Française de Développement (AFD)
- 1.5. Coût du programme :** 15 millions d'euro (soit 9,889 milliards FCFA)
- 1.6. Nature du financement :** Prêt (10.5 M euro) et Subvention (4,5M d'euro)
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Programme:** 8 ans (2011-18) après prorogation
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
Le Programme d'Appui au Développement de l'Office du Niger – Phase 2 (PADON 2) a pour objectif global d'accroître la production agricole de la zone, à partir de la réalisation d'infrastructures hydrauliques publiques et leur mise à disposition à des exploitations agricoles économiquement viables (3 à 5 has). Il est organisé autour de trois objectifs spécifiques définis sous forme de composante. Il s'agit (i) de consolider 1900 hectares d'aménagements hydro-agricoles et l'amélioration de la gestion de l'eau en zone ON dans le respect des engagements du Schéma Directeur de Développement de la Zone Office du Niger - SDDZON ; (ii) soutenir la dynamique d'organisation et de professionnalisation des acteurs agricoles de la région de Ségou à travers la consolidation des missions statutaires de la Chambre Régionale d'Agriculture de Ségou (CRA), définies dans son plan d'affaires 2011-2014 ; (iii) appuyer la maîtrise d'ouvrage du Ministère de l'Agriculture (MA) dans le pilotage du Schéma Directeur de Développement de la Zone Office du Niger et en particulier dans l'organisation des réflexions stratégiques autour des grands enjeux déterminants que sont la relecture du décret de gérance des terres, l'élaboration du Schéma d'aménagement hydro-agricole de la zone et l'introduction de modèles juridiques et financiers pouvant permettre aux exploitations familiales d'accéder à 3-5 Ha minimum de terres juridiquement sécurisées et pouvant servir de garantie à des prêts d'investissement long terme.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international :** Procédures du bailleur.
- 1.11. Type d'unité de gestion de programme :** Unité de gestion intégrée dans l'Administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME :

2.1 Dates:	Date de signature de l'Accord de subvention :	16 mars 2011
	Date de mise en vigueur :	16 mars 2011
	Date de 1 ^{er} décaissement :	Janvier 201

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
casier Rétail IV réhabilité	Ha	900	Non réalisé
casier Rétail IV bis aménagé	Ha	1000	Non réalisé
Distributeur Rétail réhabilité (revêtement)	m	400	Non réalisé
Plan de gestion environnementale ; sociale de l'opération pilote Rétail IV assuré			
Gestion de l'eau et entretien du tertiaire améliorés			
Etudes EIES/APD/DCE de mise en œuvre de l'opération pilote PADON 2			réalisée
Achat de quatre véhicules station Wagon(03) Pick up (01)	unité		réalisé
Réhabilitation des locaux de la CRA	unité		réalisée
Acquisition d'ordinateurs portables/animateurs	lot		réalisée
Acquisition de matériels de bureau/animateurs par la CRA	lot		réalisée
Acquisition de motos/animateurs par la CRA	nombre		réalisée
Construction de 2 magasins de stockage de semences de riz de 150m2/FFSO	unité		réalisé
Appui au MA dans son rôle de maître d'ouvrage du PADON2 et du SDDZON			réalisé
Etude stratégique PAHA, EES et OPR			réalisé

2.2. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : Source Cabinet MDR, ON, CRA Ségo

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Montant des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :	9 889	989	10
Total financement extérieur	9 889	989	10
TOTAL DES FINANCEMENTS	9 889	989	10

Commentaires et observation : ce décaissement n'inclut la composante au niveau du CRA

2.3. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Tout comme le Contrat Plan de l'ON, le PADON 2 contribue à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire par la fourniture de l'eau, l'entretien du réseau d'irrigation et des infrastructures primaires et l'appui aux organisations de producteurs. La production totale atteinte dans le cadre du 7^{ième} Contrat Plan est de 737 000 Tonnes de riz paddy contre 1 000 163 Tonnes attendues à l'horizon 2013.

Ministère de l'Agriculture

Office du Niger

Projet d'Appui à l'Office du Niger (PAON)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN

- 1.1. Adresse du projet :** Office du Niger ; Tel : 21 34 22 65
Email : office@office-du-niger.org.ml
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou, cercle de Niono
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / agriculture
- 1.4. Bailleurs :** Canada, Coopération Canadienne (ACDI)
- 1.5. Coût du projet :** 8 073 millions de F CFA signé le 25 mars 2011
- 1.6. Nature du financement :** Don
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 4 ans (2011-2015)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

L'objectif ultime est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire par l'augmentation de la production agricole. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) contribuer à l'accroissement des capacités de productions agricoles issues de l'irrigation dans la zone ON ; (ii) améliorer la gouvernance de la zone Office du Niger en contribuant au renforcement des capacités techniques et institutionnelles de l'ON.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures du bailleur.

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l'Administration de l'ON

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Etudes prioritaires de réhabilitation du réseau et des superficies agricoles	Ha	-	NC

Etudes sur la possibilité de recalibrage du distributeur de	Km	-	NC
Travaux de réhabilitation et d'extension des aménagements	Ha	-	NC

NB : Pas de réalisations physiques à cause de la suspension de la coopération Canadienne avec le Mali suite aux évènements de Mars 2012.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2013 : Source ON 31/12/2016

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :	8 073	239	3
Total financement extérieur	8 073	239	3
TOTAL DES FINANCEMENTS	8 073	239	3

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Tout comme le Contrat Plan de l'ON, le PAON contribue à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire par la fourniture de l'eau, l'entretien du réseau d'irrigation et des infrastructures primaires et l'appui aux organisations de producteurs. La production totale atteinte dans le cadre du 7^{ième} Contrat Plan est de 737 000 Tonnes de riz paddy contre 1 000 163 Tonnes attendues à l'horizon 2013.

Ministère de l'Agriculture

Office du Niger

Contrat Plan Etat-Office du Niger-Exploitants Agricoles Entretien/ Aménagement / Infrastructures/Vulgarisation



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1706

- 1.1. Adresse du projet :** Office du Niger ; Tel : 21 32 02 92 / 03 02 Fax : 21 32 01 43
Email : office@office-du-niger.org.ml
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / Agriculture
- 1.4. Bailleur :** GRM
- 1.5. Coût du programme :** 34 702 millions FCFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Programme:** 5 ans (2014-18) après prorogation

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global du Contrat Plan est de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue.

Les objectifs spécifiques sont : (1) augmenter les superficies aménagées et poursuivre les travaux de réhabilitation ; (2) améliorer la maîtrise technique et financière de l'entretien des réseaux ; (3) améliorer la gestion de l'eau ; (4) poursuivre l'intensification rizicole, promouvoir des cultures maraîchères et améliorer la valorisation des produits agricoles ; (5) améliorer la gestion du foncier ; (6) améliorer la gouvernance de la zone Office du Niger.

Il est attendu de ce contrat plan 25 599 ha réhabilités, 65 550 ha de nouvelles superficies aménagées, l'immatriculation foncière de 1 324 000 ha, la production à l'horizon 2018/19 de 1 122 350 tonnes de riz paddy pour un rendement de 6,5 tonnes /ha de même que la production de 26 450 tonnes de maïs.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Non applicable.

1.11. Type d'unité de gestion de programme : intégrée dans l'Administration Générale.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME :

2.1 Dates: Date de signature de l'Accord de subvention : 2014

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Production de riz (saison et contre saison)	Tonne	1 122 350	914 979
Rendement moyen du riz	Ha	6,5	6,262
Nouvelles superficies aménagées	Ha	65 550	
superficies réhabilités	Ha	25 599	
Immatriculation foncière immatriculée	Ha	1 324 000	

2.2. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : Source ON

Sources de financement	Financement acquis Million de F CFA	Cumul décaissements Million de F CFA au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	34 702	9 071	26
Total financement intérieur	34 702	9 071	26
Total des financements	34 702	9 071	26

Commentaires et observation : les écarts par rapport aux prévisions sont de l'ordre de 59%.

2.3. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le Contrat Plan de l'ON contribue à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire par la fourniture de l'eau, l'entretien du réseau d'irrigation et des infrastructures primaires et l'appui aux organisations de producteurs et partant l'amélioration de la production et de productivité comme indiqué dans ces objectifs. Ceci impactera positivement le revenu des exploitants agricoles.

Ministère de l'Agriculture

Office Riz Ségou

Office Riz Ségou/ 8ème Contrat Plan (ETAT/ ORS/ Producteurs)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1007

- 1.1. Adresse du projet :** ORS, BP : 94 Ségou
Tél : 21 32 03 26, FAX : 2132 04 57
Email : officeriz@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou/Cercles de Ségou, Macina et Barouéli / 44 Communes Rurales (dont 01 Commune urbaine).
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleur :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 1 925 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2015-2017)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

La mission essentielle de l'Office Riz Ségou est d'exécuter tous les programmes et projets concourant à la promotion de la filière riz à travers des actions visant le développement intégré de sa zone d'intervention. L'objectif spécifique du 8^{ème} Contrat Plan est d'améliorer le service de l'eau dans les périmètres hydro agricoles. Les ressources du 8^{ème} Contrat Plan sont utilisées pour l'entretien courant du réseau d'irrigation, la réalisation d'ouvrages hydrauliques, la construction d'infrastructures sociales et le fonctionnement de l'Office riz Ségou.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicables

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré directement par la structure

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates:

- De signature du 8^{ème} Contrat Plan : 16 sept 2015
- De mise en vigueur : 16 sept 2015
- De 1^{er} décaissement : 2015

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016

Désignations	Unités	Niveau cible du projet	Cumul au 31/12/2016
Aménagement agricole			
Inventaire des sites d'aménagement de bas-fonds dans les nouvelles zones (nombre)	Nbre	15	5
Aménagement des bas-fonds (nombre)	Nbre	10	0
Entretien du réseau hydraulique et travaux de construction d'infrastructures hydrauliques			
Curage des canaux (km)	Km	75	27,275
Entretien des digues (km)	Km	150	29,295
Entretien des ouvrages d'art (u)	Nbre	44	66

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 (en millions FCFA): source ORS

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissement au 31/12/2016	taux décaissement %
Financement intérieur			
A. Budget national :			
- Equipement – Investissement		923	48
- PPTTE	1 925		
B. Autofinancement			
C. Autres (Populations /Collectivités)			
Total financement intérieur	1 925	923	48
Total des Financements	1 925	923	48

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Au cours des deux dernières campagnes agricoles, l'ORS a réalisé une production de 152 909 tonnes en 2016/2017 contre 153 045 tonnes en 2015/2016, toutes céréales confondues tout en réalisant un excédent céréalier de 42 241 tonnes en 2016/2017 contre 43 852 tonnes en 2015/2016.

Ces résultats satisfaisants ont contribué à garantir l'autosuffisance alimentaire dans la zone d'intervention et à réduire la pauvreté à travers le relèvement du niveau des revenus des producteurs.

Les emplois créés dans la réalisation des nouveaux projets se chiffrent à 9 280 permanents en 2016/2017 contre 8 732 en 2015/2016.

Ministère de l'Agriculture

Office Riz Ségou

Projet d'Appui au Développement Rural de Soké 1 (PADER-S1)

I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 3001

- 1.1. Adresse du projet :** ORS, BP : 94 Ségou
Tél : 21 32 03 26, FAX : 21 32 04 57
Email : officeriz@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou, cercle de Ségou
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleur :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 15 759 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI
- 1.8. Durée du Projet:** 3 ans (2016-2018)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le PADER-S1 a pour objectif global de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté dans la région de Ségou en particulier et au Mali en général.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicables

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet géré directement par la structure

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

- 2.1 Dates:** Date de signature du PADER S1 : 04/10/2016
Date de 1^{er} décaissement: 2016

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

N.B : Les travaux n'ont pas encore démarré.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 : source ORS

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	15 759	7 880	50
Total financement intérieur	15 759	7 880	50
TOTAL DES FINANCEMENTS	15 759	7 880	50

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Augmentation du rendement de riz en maîtrise totale de 2 T/ha à 6T et en submersion contrôlée 2T/ha à 2,5T/ha. L'augmentation de la production et la diversification agricole permettront une amélioration du revenu des producteurs et contribueront à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Ministère de l'Agriculture

Office Riz Ségou

Projet d'Appui au Développement Rural de Tien-Konou et Tamani (PADER-TKT)



I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: RNP 2484

- 1.1. Adresse du projet :** ORS, BP : 94 Ségou
Tél : 21 32 03 26, FAX : 2132 04 57
Email : officeriz@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou, Cercles de Ségou et Barouéli
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** BID, GRM
- 1.5. Coût Total :** 14 985 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Prêt
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide projet
- 1.8. Durée du Projet:** 8 ans : (2009-2017) : Phase initiale de 5 ans (2009 -2013) ,1ère Prorogation : janvier 2014 – juin 2016 (30 mois), 2ème Prorogation : juillet 2016-avril 2017 (10 mois).
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**
Le projet a pour objectif global de contribuer à la sécurité alimentaire du pays et à l'augmentation des revenus des populations rurales concernées dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles et avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes. Plus spécifiquement, il vise à augmenter et à diversifier la production agricole ainsi qu'à développer des activités génératrices de revenus et favoriser la participation effective des bénéficiaires au développement de leurs communautés.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédure du bailleur
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** intégré à l'ORS

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de l'accord de prêt:	03/06/2009
	Date de mise en vigueur :	01/12/2009
	Date de premier décaissement :	29/10/2010

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Reconversion du casier de Tien Konou en maîtrise totale de l'eau	Ha	1 271+76	1271
Recalibrage du canal principal de Dioro	Km	21	21
Réhabilitation du système hydraulique de Tamani	Ha	2 200	1210
Réalisation de forages d'eau potable	Nbre	20	21
Réhabilitation et équipement de centres de santé communautaires	Nbre	5	5

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source ORS

Sources de financement	Financement acquis Million de F CFA	Cumul décaissements Million de F CFA au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	3 955	3 504	88,59
Total financement intérieur	3 955	3 504	88,59
Financement extérieur :			
-Bailleur n°1 : B.I.D.			
-Bailleur n°2	11 030	10 789	97,82
-Bailleur n°3			
Total financement extérieur	11 030	10 789	97,82
Total des financements	14 985	14 293	95,38

Commentaires et observations : le taux de décaissement global du projet est de 95,38% (au taux d'échange du Dollar au montage du projet : 1 US\$ = 450 F CFA) dont 97,82% pour la BID et 88,59% pour le Mali. Ce taux aurait dû être plus n'eut été le retard dans l'exécution des travaux de Tamani et dans l'approbation de l'avenant n°2 au lot 2.

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le PADER-TKT en appuyant le 7^{ième} Contrat Plan a permis à l'ORS d'augmenter le rendement pour la première campagne de 2,5 à 4,20 T/ha sur les 1271 ha aménagés. Le projet a aussi participé à l'augmentation des revenus de la population par la diversification de la production (sésame, miel, aviculture, la pomme de terre), la protection de l'environnement (plantation d'arbres, la subvention des foyers métalliques) le développement des activités génératrices de revenus (la dotation de 2175 femmes de fonds pour l'élevage de petits ruminants et le petit commerce).

Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Direction Nationale de la Pêche

Rénovation et Réhabilitation du Centre Piscicole de Molodo



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2119

- 1.1. Adresse du projet :** Centre Piscicole de Molodo
Tél : 66 76 71 56 S/C Direction Nationale de la Pêche
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Ségou, cercle de Niono
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale / pêche
- 1.4. Bailleur :** GRM
- 1.5. Coût du projet :** 1 915 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Projet:** 9 ans (2006-2016)

1.9. Logique d'intervention du projet :

La logique d'intervention du centre consiste à former, recycler et suivre les jeunes pisciculteurs et rizi pisciculteurs.

L'Objectif global du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et à améliorer les conditions des paysans pisciculteurs. Les objectifs spécifiques sont :

- (i) réhabiliter et équiper le centre de formation ;
- (ii) former et encadrer les jeunes pisciculteurs ;
- (iii) fournir des alevins de qualité.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Non applicable.

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Projet intégré à l'Administration

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1 Dates :	Date d'inscription BSI:	01/01/2006
	Date de démarrage :	01/01/2006
	Date de clôture :	31/12/2015

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Blocs de trois classes	Nbre	3	3
Laboratoire	Nbre	1	1
Réfectoire et bâtiments	Nbre	1	1
Bloc de quatre dortoirs	Nbre	1	1
Equipement de classes	Nbre	1	1
Aménagement d'étangs	Nbre	10	3

Commentaires et observations : Les activités du projet ont concerné la rénovation / construction de salles de classes, de laboratoire, de logements et la réhabilitation des étangs. Les actions visent à rendre le centre à nouveau opérationnel en matière de production d'alevins mais également de formation et d'encadrement des paysans/ pisciculteurs.

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	umul décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :			
- Equipement – investissement :	1 915	1 507	79
Total financement intérieur	1 915	1 507	79
TOTAL DES FINANCEMENTS	1 915	1 507	79

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté

Le centre de formation de Molodo contribue à la réduction de la pauvreté par :

- (i) l'amélioration des connaissances des pisciculteurs ;
 - (ii) la production d'alevins de qualité ;
- la mise à disposition des alevins à des coûts raisonnables.

REGION DE MOPTI



Ministère de l'Agriculture

Office Riz Mopti

OFFICE RIZ MOPTI 7^{ième} CONTRAT PLAN (ORM-CP)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 307

- 1.1. Adresse du projet :** BP 161 Mopti ; Tél : 21 42 00 55 / Fax : 21 42 01 89
Cell : 74 6796 41 Email : officerizmopti2@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Mopti, cercles de Djenné, Mopti et Ténenkou
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût du Contrat Plan :** 1 736 741 de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** BSI National
- 1.8. Durée du Contrat Plan:** 3 ans (2016-2018)

1.9. Logique d'intervention du Contrat Plan :

L'objectif global du Contrat Plan est de promouvoir le développement agricole par la sécurisation de la production, la diversification des cultures en vue d'augmenter la production et la productivité.

Les objectifs spécifiques visent :

- L'amélioration du réseau hydraulique et de la gestion de l'eau.
- L'intensification de la production agricole.
- L'amélioration des conditions d'octroi de crédits.
- La protection de l'environnement.
- La création d'un fonds de soutien aux sinistrés.
- L'adaptation des structures d'encadrement au contexte de la décentralisation.

Les résultats attendus du Contrat Plan 2013-2015 sont :

- R1 : Le réseau hydraulique et la gestion de l'eau sont améliorés.
- R2 : La production agricole est intensifiée.
- R3 : Les conditions d'octroi de crédit sont améliorées.
- R4 : L'environnement des périmètres irrigués est protégé.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion du Contrat Plan : Intégré à l'administration de l'ORM

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature du CP:	04/04/2015
	Date de démarrage du CP:	01/01/2016
	Date de premier décaissement :	02/03/2013

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 : source ORM

Spécification/désignation	Unité	Niveau cible du projet	cumul au 31/12/2016
Curage des canaux (ml)	ml	11100	11100
Réhabilitation des digues	ml	35500	35500
Centre d'alphabétisation	nbre	2	2
Latrine	nbre	2	2
Construction d'1 parc exposition			

Commentaires et observations :

L'état d'avancement de l'Office Riz Mopti de l'an I du 7^{ème} contrat plan Etat / ORM / Exploitants agricoles est moyennement satisfaisant, comme tenue de la faiblesse du budget notifié au cours de 2016

2.3. Situation d'exécution financière : du démarrage du projet au 31/12/2016 (en millions de F CFA)

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	1 735	270	16
Total financement intérieur	1 737	270	16
Total des financements	1 737	270	16

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la Pauvreté :

Le 7^{ème} Contrat Plan Etat / ORM / Producteurs a participé directement à hauteur de 13% à la couverture des besoins en riz de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la Région et par conséquent contribue à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des ménages des exploitants des PIV/PM.

Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

Irrigation de Proximité : Projet Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR/MOPTI) Composante Pays Dogon



I. DESCRIPTION DU PROGRAMME: SN

- 1.1. Adresse du projet :** BP : 11 Bandiagara ; Tel/Fax : 2144 20 15.
Email : iprodb.bandagara@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Mopti cercles Bandiagara, Koro et Bankass.
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie rurale/ agriculture
- 1.4. Bailleurs :** MAECD Canada/ KFW
- 1.5. Coût Total :** **3 490 millions** de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Subvention
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2015-2019)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :**

Le projet IPRO-DB contribue à la mise en œuvre du Programme National d'Irrigation de Proximité (PNIP). Il vise une meilleure utilisation du potentiel agricole par l'irrigation de proximité pour accroître les revenus des producteurs et des productrices sur le plateau Dogon afin d'améliorer les conditions de vie des populations cibles.

- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international:** Procédures des bailleurs
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Cogestion Mali et PTF.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Date de signature de la convention de Financement : 03/04/ 2015
 Date de mise en vigueur : 22 Juin 2015
 Date du Premier décaissement : 22 Juin 2015

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Micro-barrages	Nbre	19	4
Seuils	Nbre	4	2
Superficies aménagées	ha	150	80
Réhabilitation de micro barrages	Nbre	20	7
Superficies réhabilitées	ha	80	34,5
Pistes rurales	Km	35	20,6
Magasin de stockage	Nbre	3	3

Commentaires et observations: Tous les chantiers programmés au titre de 2016 sont terminés

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016:

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	0	0	0
- Equipement – investissement PPTE :			
B. Autofinancement :	-	-	-
C. Autres (populations/collectivités)	17	5	26
Total financement intérieur	17	5	26
Financement extérieur :			
Fonds d'investissements MAECD /Canada	3 490	1 150	33
Total financement extérieur	3 490	1 150	33
TOTAL DES FINANCEMENTS	3 508	1 155	33

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le projet irrigation de proximité dans le pays Dogon contribue à la mise en œuvre du Programme National d'Irrigation de Proximité qui ambitionne d'aménager 126 000 ha en 10 ans et de valoriser à travers l'approche chaîne de valeur des produits issus du maraîchage. Chaque hectare aménagé, est exploité en deux ou trois cycles de cultures maraîchères avec un rendement amélioré à travers l'appui conseil du Projet. L'augmentation des superficies aménagées, de la production maraîchère, céréalière contribue à: (i) la réduction de la période de soudure, (ii) la réduction de l'exode rural, (iii) la promotion de l'emploi et du secteur privé, (iv) l'amélioration de la nutrition des groupes cibles, (v) l'abreuvement des animaux.

Ministère de l'élevage et de la Pêche

Direction Nationale de la Pêche

OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'ACQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER

III. DESCRIPTION DU PROGRAMME: 2402 // AGMCPB

1.1. Adresse du projet :	Camp Digue Ex-bureaux PADEPECHE
1.2. Zones d'intervention:	Région de Mopti
1.3. Secteur et Sous-secteur :	Economie rurale/ Elevage et Pêche
1.4. Bailleurs :	GRM
1.5. Coût Total :	2 232 millions de F CFA
1.6. Nature du financement :	Budget national
1.8. Durée du Projet:	1 an (2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Etablissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'ODEPADIN a pour mission la promotion de la production halieutique et aquacole et l'amélioration du niveau de vie des pêcheurs et aquaculteurs dans sa zone d'intervention.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- Contribuer à l'amélioration de la production halieutique ;
- Promouvoir le développement de l'aquaculture ;
- Assurer l'aménagement et l'empoisonnement des plans d'eau ;
- Améliorer les conditions de transformation, de transport et de conservation des produits de la pêche et d'aquaculture ;
- Assurer le conditionnement des produits halieutiques et aquacoles ;
- Assurer la formation des pêcheurs et aquaculteurs aux techniques de développement des productions halieutiques et aquacoles et la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles ;
- Assurer l'organisation et la gestion des centres de collecte du poisson, des infrastructures de traitement et de commercialisation des produits halieutiques ;
- Mettre en œuvre les actions suscitant la structuration des organisations de producteurs et d'opérateur e la filière poisson.

L'ODEPADIN a hérité de l'ensemble des biens, meubles et immeubles de l'Opération pêche et des infrastructures et équipement de la PADEPECHE.

Les ressources de l'Office comprennent les subventions de l'Etat, les financements extérieurs, les emprunts, dons et legs, les fonds de concours de personnes morales et physiques, les recettes provenant de la cession de biens et de services, les produits d'aliénation des biens meubles et immeubles, les revenus du patrimoine, les recettes issues du conditionnement du poisson séché et fumé et les recettes diverses.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de projet intégrée dans l'administration

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'amélioration des conditions de conditionnement, de transformation et de commercialisation des produits de l'aquaculture devrait générer une plus-value significative pour les opérateurs de la filière tout en rassurant les consommateurs sur la sécurité sanitaire des produits.



REGION DE TOMBOUCTOU



Ministère de l'Agriculture

Direction Nationale du Génie Rural

PROJET TRAVAUX D'EXTENSION 200HA DE LA PLAINE DE SAOUNE



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2910

- 1.1. Adresse du projet :** Commune de Diré
Tél : 66 67 81 80 / 76 30 86 22
Email : dallonet_2000@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Tombouctou, cercle de Diré
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/Agriculture
- 1.4. Bailleurs :** GRM
- 1.5. Coût total:** 3 900 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** appui projet
- 1.8. Durée du Projet:** 5 ans (2016 - 2020)

1.9. Logique d'intervention du projet : l'objectif global du projet consiste à la réduction de la pauvreté à travers le développement agroalimentaire et l'amélioration de la sécurité alimentaire et la Contribution à l'autosuffisance alimentaire en produits agricoles et animaux des populations cibles.

Les objectifs spécifiques du projet d'extension sont de permettre le (i) le développement et l'intensification des cultures irriguées sur 200 ha pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire; (ii) de contribuer à la diminution de l'exode rural par la création d'emploi; (iii) d'augmenter le niveau de vie de la population par l'accroissement des revenus; (iv) de contribuer au maintien de l'équilibre de l'écosystème par la plantation d'arbres; et (v) de responsabiliser les bénéficiaires dans la gestion des aménagements et de leur production.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: Procédures nationales

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion administrative

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :

Date de mise en vigueur : Janvier 2016
Date de premier décaissement : 2016

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Travaux de Consolidation de la digue de protection pour l'irrigation de 400 ha en maîtrise totale	Nbre	1	1
Entretien de la station de pompage équipée de 4 vis d'Archimède	Nbre	1	1
Réhabilitation du Canal Principal	Nbre	1	1
Drain Principal	Nbre	1	1
Canal d'amenée	Nbre	1	1

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source Projet Saouéné.

Sources de financement	Financements acquis millions F CFA	Cumul des décaissements millions F CFA	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget national :	250	100	40
- Equipement – investissement PPTE :			
B. Autofinancement :			
C. Autres (populations/collectivités)			
Total financement intérieur	250	100	40
TOTAL DES FINANCEMENTS	250	100	40

Commentaires et observations: Une partie des fonds issus des redevances est placée en compte bloqué pour l'amortissement de la station de pompage (groupes et vis d'Archimède).

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'insécurité alimentaire ainsi que la destruction du couvert végétal, liées à la sécheresse des années 1980-1990 avaient entraîné une situation de précarité pour les populations de la commune de Diré, conduisant notamment à un exode rural important des populations jeunes vers les centres urbains. Le Projet Travaux d'extension 200HA de la Plaine de Saouéné contribue à la réduction de la pauvreté au niveau de la Commune par l'autoconsommation d'une partie de la production issue de l'aménagement des 400 ha en maîtrise totale et par la vente des surplus.

Ministère de l'Agriculture

Office pour la Mise en Valeur du système Faguibine

OFFICE POUR LA MISE EN VALEUR DU SYSTEME FAGUIBINE (OMVF)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 559

1.1. Adresse du projet :

E-mail : omvf.mali@gmail.com,

Site web: www.omvf.gouv.ml

Tél. : (+223) 20 29 08 87, 44 39 25 65,

1.2. Zones d'intervention:

Région de Tombouctou, cercles de Goundam, Diré et Tombouctou

1.3. Secteur et Sous-secteur :

Economie Rurale/ Agriculture

1.4. Bailleur :

GRM

1.5. Coût total du projet :

5 956 millions de FCFA

1.6. Nature du financement :

Budget national

1.7. Modalité d'appui :

BSI National

1.8. Durée du Projet:

12 ans (2006-2017)

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global est d'assurer la sécurité alimentaire des populations de la zone.

L'objectif spécifique est : (i) aménager les lacs Télé, Faguibine, Takara, Gouber et Kamango ; (ii) réaliser les infrastructures rurales.

Créé par la loi N°06-011 du 27/01/06, l'Office a pour mission le développement et la protection du système Faguibine. A cet effet, il est chargé d'assurer les travaux de maintenance des canaux et des ouvrages hydrauliques, promouvoir le développement des cultures vivrières et industrielles et des productions animales, mener toute action devant permettre l'accroissement de la production et de la productivité et des revenus des paysans de la zone, apporter un appui conseil aux producteurs, promouvoir l'émergence d'organisations paysannes, de coopératives, d'unions et de fédérations à travers l'alphabétisation fonctionnelle et la formation, assurer la promotion de l'intégration de l'agriculture et de l'élevage et de mener des actions de protection de l'environnement.

1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date d'inscription au BSI National:	Mars 2006
	Date de mise en vigueur :	Mars 2006
	Date de premier décaissement :	Mars 2006

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Surcreusement des chenaux d'alimentation en eau	m ³	1 033 904	763 679
Plantation d'arbres sur les berges des chenaux	Ha	374	266,51
Fixation de dunes	Ha	71	21
Production céréalière	Tonne	562 669	107 591
Assainissement lac Télé (enlèvement carcasses d'animaux)	Nbre	-	10 547

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source OMVF

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	5 956	5 570	94,00
-PPTE :			
B. Autofinancement			
C. Autres :(Populations/Collectivités)			
Total financement intérieur	5 956	5 570	94,00
Total des financements	5 956	5 570	94,00

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

L'OMVF contribue à la réduction de la pauvreté par : (i) la mise en eau des chenaux, (ii) la création d'emplois à travers la Haute Intensité de Mains d'Œuvre (HIMO) pour réaliser les travaux d'aménagement, (iii) l'intensification de la production de riz conduisant à la stabilisation des prix des céréales; (vi) la création d'activités génératrices de revenus.

Ministère de l'Agriculture

Office pour la Mise en Valeur du système Faguibine

PROJET D'APPUI A LA RESTAURATION DU SYSTEME FAGUIBINE (PARF)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP SN

- 1.1. Adresse du projet :** E-mail : omvf.mali@gmail.com, Site web: www.omvf.gouv.ml
Tél. : (+223) 20 29 08 87, 44 39 25 65,
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Tombouctou, cercles de Goundam, Diré et Tombouctou
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/ Agriculture
- 1.4. Bailleur :** Royaume de la Norvège
- 1.5. Coût total du projet :** 3 433 millions de FCFA
- 1.6. Nature du financement :** Don
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Projet:** 05 ans (2011-2015)

1.9. Logique d'intervention du projet :

Le Projet d'Appui à la Restauration du système Faguibine vise à contribuer à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des populations dans le septentrion malien.

Pour atteindre cet objet de développement le projet se fixe les objectifs spécifiques ci-après :

- Assurer durablement et de façon optimale l'alimentation en eau des lacs en régularisant le système hydraulique du Faguibine ;
- Augmenter la production, la productivité, et des revenus des producteurs ;
- Améliorer la sécurité alimentaire et le niveau de vie des populations bénéficiaires ;

Les composantes du PARF sont le renforcement des capacités ; les investissements ; la production et compétitivité des filières ; la recherche et développement ; et la gestion du programme et mesures d'accompagnement.

1.10. Type de procédures utilisées pour le financement international: Non applicable

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion intégrée dans l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature :	17 décembre 2010
	Date d'entrée en vigueur :	1 ^{er} janvier 2011
	Date de premier décaissement :	juin 2011

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Surcreusement des chenaux d'alimentation en eau	m ³	404 000	431 360
Plantation d'arbres sur les berges des chenaux	ha	200	97
Utilisation de semences de variétés adaptées performantes			
- Semence de riz	Tonnes		5
- Semence maraîchère	kg		820
- Semence de pomme de terre	Tonnes		126,025
- Semence de bourgou	kg		3 000
Mise en place d'un parc d'équipements fonctionnels	Millions de FCFA	965	408,208
Assainissement des lacs télé et Takara	carcasses		500
Appui en Riz	Tonnes		5
Appui en Sucre	Tonnes		3

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source OMVF

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2015	Taux de décaissement (en %)
Financement extérieur :			
-Bailleur n°1 (Norvège)	3 973	3 725	94,2
-Bailleur n°2	-	-	-
-Bailleur n°3	-	-	-
Total financement extérieur	3 973	3 725	94,2
Total des financements	3 973	3 725	94,2

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Les travaux à haute intensité de main d'œuvre (HIMO) contribuent à procurer des revenus aux populations (des centaines de jeunes déployés sur les sites de surcreusement). Les appuis en intrant de maraîchage (petits équipements et semences) permettent d'améliorer les revenus des femmes. Les appuis en vivre aident les populations à renforcer leur résilience.

PROGRAMME INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES REGION DU NORD (PIDRN)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2102 PIDRN

- 1.1. Adresse du projet :** BP 04, route de Kabara, Tombouctou
Tél. : 21 92 18 11, Email : pidrn@pidrn-mali.org
- 1.2. Zones d'intervention :** Région de Tombouctou, cercles de Niafunké, gourma rharous, Goundam et diré, région de Gao, cercle de Bourem
- 1.3. Secteur et sous-secteur :** Economie rurale/agriculture
- 1.4. Bailleurs :** FIDA, FBS, BOAD et GRM
- 1.5. Coût du projet :** 1 9 585 millions de F Cfa
- 1.6. Nature du financement:** Subvention, Prêt et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du projet :** 11 ans (2006 - 2016)
- 1.9. Logique d'intervention du programme :**
L'objectif global de ce programme est de contribuer à réduire la vulnérabilité et à restaurer le tissu économique et social des régions Nord du mali.
Les objectifs spécifiques sont: renforcer les capacités des organisations locales et des collectivités ; valoriser le potentiel productif agropastoral ; Favoriser l'accès aux services sociaux de base. Les activités principales portent sur les aménagements agropastoraux, la santé, l'eau, l'assainissement et le renforcement des capacités.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement international : Procédures des bailleurs**
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion parallèle**

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates : Date de signature de l'accord FIDA : 24/05/2005, 10/04/2006, 20/10/2006 et 08/12/2006
 Date de signature de l'accord de don FSB : 29/09/2005, 10/04/2006 et 20/10/2006
 Date de signature de l'accord de prêt BOAD : 16/12/2005 et 18/09/2006

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

SPECIFICATION/DESIGNATION	UNITE	NIVEAU CIBLE DU PROJET	Réalisation cumulée au 31/12/2015
Réalisation des PIV, PPM	Ha	1400, 24	0, 24
Etangs piscicoles, Aménagements de bourgoutières	U	2, 1000	2, 1628
Entretiens des mares	ha	1	1
Réalisation des ouvrages de submersion	Nbre	0	11
Acquisition de matériels de congélation, conservation	Nbre	6 et 6	6 et 6
Construction des CSCOM et équipement de CSCOM	Nbre	8	8
Extension de l'adduction d'eau de Bamba	Nbre	1	1
Acquisition de kit solaire et châteaux d'eau	Nbre	16	16
Réhabilitation des points d'eau	Nbre	0	19
Réalisation des forages villageois, puits villageois	Nbre	23, 58	5, 20
Réalisation des puits pastoraux, d'adduction d'eau	Nbre	43, 2	17, 2
Réalisation des travaux de la piste Gossi-Rharous	Km	155	0
Réalisation des marchés à bétail, parcs de vaccinations	Nbre	3, 6	2, 6
Matérialisation des couloirs de passage	Nbre	13	13
Réalisation d'aire d'abattage et de boucherie	Nbre	2	2
Réalisation des magasins polyvalents	Nbre	70	17
Magasins de stockage, Aire de séchage, Batteuses	Nbre	10, 10, 10	10, 10, 10
Production de semences de base de riz	Tonnes	12	15
Production de semences certifiées de R1 et R2	tonnes	1200	503

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PIDRK

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	3 942	1 738	41
Total financement intérieur	3 942	1 738	41
Financement extérieur	15 643	13 655	87
-Bailleurs : FIDA, BOAD, FSB			
Total financement extérieur	15 643	13 655	87
Total des financements	19 585	15 393	79

Commentaires et observations : à la date du 31/12/2015 car le projet est en suspension à cause de l'insécurité

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le Programme a contribué à la résilience des populations à travers sa contribution au maintien et la performance du mode de production et la restauration des moyens de subsistance des populations depuis le début de la crise par les prêts animaux aux ménages vulnérables, l'appui en semences, en matériels aratoires, en motopompes et moyens de clôture aux maraichers, la campagne de vaccination du cheptel ; l'appui à la mise en œuvre du Paquet Minimum d'Activités dans certains CSCOM de la région (2012 -2014) et l'appui à la relance du système éducatif de la région (2013-2014).

REGION DE GAO



Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Secrétariat Général

Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

Projet de Développement de l'Elevage dans la Région du Liptako-Gourma (PDELG)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 1984 PDELG

- 1.1. Adresse du projet :** Gao, 8^{ème} quartier Boulgoundié Rue 17 à Gao Tél : 21 82 14 57
Antenne Korofina Nord R 105 P 395 Bko, tel 20 24 14 28
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Mopti, cercles de Douentza et Koro
Région de Tombouctou, cercles de Tombouctou et Gourma
Rahrous et Région de Gao
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/Elevage
- 1.4. Bailleurs :** BID, BIDC et GRM
- 1.5. Coût du projet :** 11 506 F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Prêt et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aides projet
- 1.8. Durée du Projet:** 12 ans (2005-2016)
- 1.9. Logique d'intervention du projet :** le PDELG a pour objectif global de contribuer au développement de l'élevage et à la sécurité alimentaire par l'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations pastorales et agropastorales de sa zone d'intervention. Ses objectifs spécifiques sont : (i) contribuer à la formation des éleveurs et agro éleveurs ; (ii) contribuer au désenclavement de la région par la réalisation d'infrastructures routières ; (iii) réaliser des infrastructures de santé et de productions animales ; (iv) mettre en œuvre des programmes de gestion des aménagements pastoraux ; (v) contribuer au développement et à la gestion des ressources naturelles et (vi) améliorer le revenu des éleveurs et contribuer à l'autosuffisance alimentaire à travers une meilleure valorisation des productions animales.
- 1.10. Procédures utilisées pour le financement national/ international:** Procédures du bailleur
- 1.11. Type d'unité de gestion de projet :** Unité de gestion intégrée dans l'administration.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :

- de signature de l'accord de prêt BID et BIDC : 08 mai 2004 et 06 mars 2009
- de mise en vigueur : 03 février 2005 et 28 janv. 2010
- du 1^{er} décaissement: 19 Mai 2006 et 15 sept. 2011

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016:

Nature	Unité	Niveau cible	Réalisations cumulées
Construction de laboratoire de diagnostic	Nbre	1	1
Construction de Parcs de vaccination		1	1
Acquisition de matériel de froid		13	14
Puits citernes	Nbre	12	1
Puits à grand diamètre	Nbre	7	6
Système d'adduction d'eau	Nbre	2	2
Surcreusement de mare	Nbre	9	2
Restauration de pâturages dégradés	Ha	2 000	1 624
Cultures de bourgou	Ha	500	302
Matérialisation de piste pastorale	Km	240	240
Construction de magasin de SPAI	Nbre	10	2
Construction de marchés à bétail	Nbre	4	8
Construction d'aires d'abattage	Nbre	4	8
Extension de l'aire d'abattage de Koro	Nbre	1	1
Réhabilitation de piste rurale	km	132	80

Commentaires et observations: Avec la clôture du financement BID le 31 décembre 2012 quand bien même que les travaux étaient en cours, une révision de la liste des biens et services est sollicitée de la BIDC pour l'achèvement desdits travaux (construction de puits citernes et à grand diamètre, surcreusement de mares, réalisation de barrages/seuils, réhabilitation de tronçons de piste rurale et système d'adduction d'eau).

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016 :source PDELG.

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :	4 619	3 460	74,9%
Total financement intérieur	4619	3460	74,9%
Financement extérieur :			
BID, BIDC	1 301	179	14%
Total financement extérieur	1301	179	13,8%
Total des financements	5920	3639	61,5%

Commentaires et observations: la participation du budget national au financement du PDELG a été revue à la hausse compte tenu du coût de réalisation de certaines infrastructures : construction du laboratoire, du siège du projet et des marchés à bétail et aussi les années de prorogation au profit du Projet.

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le Projet doit nécessairement contribuer à l'amélioration des productions animales dans sa zone d'intervention.

REGION DE KIDAL



PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION DE KIDAL (PIDRK)



I. DESCRIPTION DU PROJET: RNP 2369 PIDRK

- 1.1. Adresse du projet :** Tél : 21850456 ; Fax : 21850457
E mail : pidrk.pidrk@yahoo.fr / waletmariama@yahoo.fr
- 1.2. Zones d'intervention:** Région de Kidal, cercles de Kidal, Tessalit, Abeïbara et Tinassako
- 1.3. Secteur et Sous-secteur :** Economie Rurale/Elevage
- 1.4. Bailleurs :** FIDA, BOAD, FSB et GRM
- 1.5. Coût du projet :** 11 643 millions de F CFA
- 1.6. Nature du financement :** Prêt, Subvention et Budget national
- 1.7. Modalité d'appui :** Aide programme
- 1.8. Durée du Projet:** 11 ans (2007-2017) ;

1.9. Logique d'intervention du projet :

L'objectif global du programme est de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire des populations de la région de Kidal. Les objectifs spécifiques sont : (i) augmenter et diversifier les revenus des populations de la zone à travers la sécurisation des systèmes d'élevage nomade et le développement des activités agropastorales sur une base durable et (ii) améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des femmes, en facilitant leur accès aux services et infrastructures sociocommunautaires de base.

La logique d'intervention du programme repose sur les 5 composantes suivantes :

A. appui à la valorisation du potentiel pastoral avec 3 sous composantes :

- Amélioration de l'accès aux ressources pastorales,
- Amélioration de la couverture sanitaire du cheptel et
- Appui à la commercialisation

B. amélioration et diversification des revenus des groupes vulnérables,

C. amélioration de l'accès aux infrastructures et aux services sociaux de base avec 2 sous composantes :

- Santé/Nutrition/VIH-SIDA et
- Education/Formation

D. renforcement des capacités des acteurs et

E. gestion et suivi évaluation.

1.10. Procédures utilisées pour le financement international: procédures des bailleurs

1.11. Type d'unité de gestion de projet : Unité de gestion de programme parallèle.

II. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET :

2.1. Dates :	Date de signature de l'accord de prêt GRM-FIDA:	16/02/2007
	Date de signature de l'accord de don (FSB) :	05/07/2007
	Date de démarrage :	07/03/2008

2.2. Situation d'exécution des principales réalisations physiques au 31/12/2016 :

Spécification / désignations	Unité	Niveau cible du projet	Cumul au 31/12/16
Puits pastoraux réhabilités	puits	130%	39
Parcours pastoraux réhabilités	hectare	100%	125
Centrale d'achat d'aliment bétail de 200 tonnes (adiel hoc)	unité	-	1
Animaux traités (campagnes de vaccination et de traitement)	tête d'animal	-	69 645
Puits maraichers réalisés ; et réhabilités	puits	110% et 130	33 et 26
Vitro plants de palmiers dattiers mis à la disposition des maraichers ;	plant	107,14%	3750
Plants d'arbres fruitiers mis à la disposition des maraichers ;	plant	64,09%	5127
Semences certifiées	kg	-	12769,5
Motopompes et accessoires	unité	100%	26
Reconstitution du cheptel (1 noyau de 20 chèvres par ménage extrêmement vulnérables)	noyau de 20 chèvres	37%	280
Unité de transformation de produits agropastoraux	unité	20%	15
Protection de berges d'oued réalise ;	unité	-	1
Barrage de retenue d'eau réhabilité ;	unité	-	1
Cscom construits et équipés ; et réhabilités et équipés	unité	100%	04 et 03
Locaux techniques de radios construits ;	unité	100%	03
Marches à bétail et aires d'abattage construits ;	unité	100%	05 et 04
Parcs de vaccination mixtes (camelins et bovins) construits;	unité	90%	9
Centre de développement de la petite enfance (CDPE) ;	unité	100%	04
Centre d'alphabétisation et CED ;	unité	100%	04 et 03

2.3. Situation d'exécution financière au 31/12/2016: source PIDRK

Sources de financement	Financement acquis	Cumul décaissements au 31/12/2016	Taux de décaissement (en %)
Financement intérieur :			
A. Budget National :			
- Equipement -investissement	839	601	72
Total financement intérieur	839	601	72
Financement extérieur	10 294	5 335	52
-Bailleur n°1 : FIDA, BOAD, FSB			
Total financement extérieur	10 294	5 335	52
Total des financements	11 133	5 936	53

Commentaires et observations : le faible taux de décaissement se justifie par les problèmes de sécurité.

2.4. Contribution directe du Projet/Programme à la réduction de la pauvreté :

Le Programme a contribué à la résilience des populations à travers sa contribution au maintien et la performance du mode de production et la restauration des moyens de subsistance des populations depuis le début de la crise par les prêts animaux aux ménages vulnérables, l'appui en semences, en matériels aratoires, en motopompes et moyens de clôture aux maraichers, la campagne de vaccination du cheptel ; l'appui à la mise en œuvre du Paquet Minimum d'Activités dans certains CSCOM de la région (2012-2014) et l'appui à la relance du système éducatif de la région (2013-2014).

E. ANNEXES

NOM DU PROJET	TUTELLE
PROJETS EN EXECUTION	
<i>Ministère de l'Agriculture</i>	
Initiative Eau et Sécurité Alimentaire (IESA)	MA
Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali (GCP/MLI/033/LDF)	MA
3ème Contrat plan Etat-ODRS	MA
4ème Contrat plan Etat-ODRS	MA
Adaptation de l'Agriculture et l'Elevage aux changements climatiques au Mali	MA
Amélioration durable de la productivité et de la compétitivité du riz pluvial et de bas-fonds dans la région de Sikasso (CRRA), au Mali	MA
Améliorer la Capacité d'Adaptation et la Résilience face aux Changements Climatiques dans le Secteur Agricole du Mali (GCP/MLI 033/LDF)	MA
Appui à la CPS/SDR	MA
Appui à l'Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)	MA
Appui au programme de Lutte contre le Criquet Pèlerin (APLCP)	MA
Construction/Equipement Inspection de l'Agriculture	MA
Contrat Plan Etat/Office/Producteurs (CP-OHVN)	MA
Contrat Plan Etat-ADRS-Producteurs	MA
Contrat-Plan Etat OPIB	MA
Création de richesse et souveraineté alimentaire dans la région de Sikasso à travers le développement des marchés locaux pour la transformation locale de l'anacarde (CTARS)	MA
Emploi Jeune en milieu rural	MA
Entretien, aménagement infrastructures et vulgarisation ON (Contrat Plan)	MA
Initiative pour le Renforcement de la Résilience par l'Irrigation et la gestion des ressources (IRRIGAR) Koulikoro	MA
Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-IRRIGAR) Composante Sikasso.	MA
Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Composante Koulikoro.	MA
Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Composante Pays Dogon.	MA
Office Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)	MA
Office Riz Mopti (7e Contrat-Plan Etat-ORM)	MA
Office Riz-Ségou (8ème Contrat plan)	MA
Progr national des petits barrages et bas-fonds (PNPBBF)	MA
Programme Compétitivité/Diversification Agricole (PCDA)/ Unité Intérimaire de Consolidation des Acquis	MA
Programme d'Appui à la croissance économique et promotion de l'emploi par le secteur privé (PACEPEP)	MA
Programme d'Appui à la Mise en Oeuvre du Contrat Plan office du Niger (PAMOCP-ON)	MA
Programme d'Appui au Contrat Plan Office du Niger (PACOP)	MA
Programme d'Appui aux Filières Agro-Pastorales de la Région de Sikasso (PAFA)	MA
Programme de Développement de l'Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS)	MA
Programme de développement des filieres porteuses	MA
Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) ou (WAAPP Phase II)	MA
Programme de Recensement Général Agricole (RGA)	MA
Programme de transformation Intégrée des zones greniers du Mali/zone Grenier pilote de Sikasso (PIGM/PZPS)	MA
Programme Microfinance Rurale (PMR)	MA

Projet d'Appui à l'Office du Niger (PAON)	MA
Projet Aménagement Hydro Agricole Région de Sikasso (Direction Régionale du Budget)	MA
Projet d'aménagement hydro-agricole du casier de Molodo Nord Phase I (y compris Extension)	MA
Projet d'Appui au Développement de l'Office du Niger (PADON II)	MA
Projet d'Appui au Développement Rural de Tien- Konou-Tamani (PADER-TKT)	MA
Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole des petits Exploitants pour l'Afrique subsaharienne (SAPEP)	MA
Projet d'Appui à la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)	MA
Projet d'Appui à la Restauration du Système Faguibine (PARF)	MA
Projet d'Appui à la Stratégie Nationale de Développement de l'Irrigation (PASNDI) Phase III	MA
Projet d'appui à l'irrigation de proximité dans le delta intérieur du Niger (IPRODI) / Programme Mali-Nord	MA
Projet d'Appui au Développement Durable de Yélimané (PADDY II)	MA
Projet d'Appui au Développement Rural de Soké 1 (PADER-S1)	MA
Projet d'Appui au Sous-Secteur de l'Irrigation de Proximité (PASSIP)	MA
Projet d'Appui aux Organisations Paysannes du Plateau Dogon pour une meilleure valorisation de leurs productions maraîchères	MA
Projet de Développement de la Ferme rizicole de SABE	MA
Projet de Développement Rural Intégré du District de Kita et de ses environs, phase 2 (PDRIK II)	MA
Projet de Renforcement de la Résilience contre l'Insécurité Alimentaire au Mali (PRIA-Mali)	MA
Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de la Région de Koulikoro (PRESAN-KL)	MA
Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des Cultures Irriguées (PRESA-DCI)	MA
Projet de renforcement de résilience au sahel (P2RS)	MA
Projet Renforcement de la gouvernance de la filière Coton dans le cadre de la réforme institutionnelle et d'amélioration de la productivité de la durabilité et d'exploitation en zone cotonnière (PASE II)	MA
Projet Renforcement moyen protection végétaux/ denrées stockées dans la région du Liptako Gourma (PRMPV-LG)	MA
Réhabilitation bureaux CPS/SDR	MA
Réhabilitation du Barrage de Markala	MA
Réhabilitation Equipements Bureaux DAF/MA	MA
Travaux d'Extension de 200 ha de la plaine de Saouné	MA
<i>Ministère de l'Élevage et de la Pêche</i>	
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-Mali)	MEP
Projet Intégré de Développement des Ressources Animales au Mali (PDIRAM)	MEP
Construction marché central poisson Bamako	MEP
Contrat Plan Etat - LCV	MEP
Convention d'Appui Financier pour la Lutte contre le Charbon Bactérien (PCB)	MEP
Programme de développement de la Pêche et de la Pisciculture zone OHVN (PDPP-OHVN)	MEP
Programme Développement Intégré Réduction Pauvreté Zone ONDY (PDIRP)/CCMD/BRE de Madina DIASSA	MEP
Programme Panafricain contrôle épizooties (PACE) / CNASA	MEP
Programme quinquennal Aménagements Pastoraux (PQAP)	MEP
Programme Quinquennal d'Aménagements Aquacoles (PQAA)	MEP
Projet Appui au Développement Elevage Zone Kayes Sud (PADEPA-KS)	MEP
Projet d'Appui au Développement de l'Élevage du Zébu Maure dans le cercle de Nara (PRODEZEM)	MEP
Projet d'Appui au Développement de la Filière Aquacole dans la région de Sikasso (PRODEFA)	MEP
Projet d'Appui institutionnel au SEP (PAI SEP)	MEP
Projet développement Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG)	MEP
Projet développement et valorisation production laitière au Mali (PRODEVALAIT)	MEP
Projet Gestion Durable Bétail Ruminant Endémique (PROGEBE)	MEP

Réhabilitation Centre Piscicole Molodo	MEP
Transformation des Sous-Produits d'Abattage (PTSPA)	MEP
<i>Commissariat à la sécurité Alimentaire</i>	
Contrat plan Programme Restructuration du Marché Céréalière (PRMC)	CSA
Programme de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les cercles de Nara et Nioro du Sahel (PLIAM)	CSA
Programme d'Investissement et de Développement Rural des Régions Nord Mali (PIDRN)	CSA
Programme Intégré de Développement Rural de la Région de Kidal (PIDRK)	CSA
Stock National de Sécurité Alimentaire	CSA
PROJETS EN DEMARRAGE	
<i>Ministère de l'Agriculture</i>	
Projet de développement rural du Kaarta/Sefeto (PDRK/S)	MA
Construction Voie d'accès Centre Sino malienne	MA
Office du Moyen Bani	MA
Projet d'amélioration du système d'irrigation du périmètre irrigué de Baguineda	MA
<i>Ministère de l'Élevage et de la Pêche</i>	
Cellule de coordination de la lutte contre les mouches Tse-Tse	MEP
Centre national d'insémination artificielle animale	MEP
Etude de Faisabilité de la Valorisation des Sous-Produits d'Abattage à l'échelle nationale	MEP
Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger (ODPADIN)	MEP
Programme quinquennal d'aménagements aquacoles	MEP
projet d'Appui à la Filière Halieutique au Mali (PAFHa)	MEP
<i>Commissariat à la sécurité Alimentaire</i>	
Construction siège CSA a l'OPAM	CSA



*Cellule de Planification et de Statistique
du Secteur du Développement Rural*

BP 2357, Bamako Tél : 20 21 44 99 / 20 21 72 20 ; Fax : 20 21 59 20
